



COORDINATION DU PROJET PROVIR

Projet Des Villes Inclusives et Résilientes



RAPPORT ANNUEL

Janvier 2026

E-mail : contact@provir-rca.com

Site du projet : www.provir-rca.com

Lien Kobo toolbox du Suivi en ligne :

<https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/aovPhvYWSrKRCgKmgFTDns/data/map>

TABLE DES MATIERES

LISTE DES TABLEAUX	
LISTES DES FIGURES	II
SIGLES ET ABREVIATIONS	V
RESUME EXECUTIF	VII
INTRODUCTION	12
I. INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET	13
1.1. Objectif du projet	13
1.2. Indicateurs de l'ODP	13
1.3. Financement du projet	13
1.4. Composantes du Projet	15
1.5. Les zones d'intervention du projet	17
1.6. Rappel des principales activités des travaux du projet	18
1.7. Partenaires de mise œuvre du projet	18
1.8. Bénéficiaires du projet	19
II. LES REALISATIONS SYNOPTIQUES DU PTBA AU 31 DECEMBRE 2025	20
2.1. Bilan des engagements du PTBA du projet	20
2.2. Situation des réunions de coordination tenues par le projet	22
2.3. Tenue des sessions du comité d'orientation stratégiques	23
III. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PPM AU 31 DECEMBRE 2025	26
3.1. Situation de la mise en œuvre de passation des marchés	26
3.2. Réalisations des activités de Sauvegardes et des autres Experts	28
IV. SITUATION D'EXECUTION FINANCIERES ET BUDGETAIRE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2025	64
4.1. Rappel des dépenses réalisés sur le PPA en 2023-2024	65
4.2. Situation d'exécution budgétaire	69
4.3. Réalisation de l'audit interne	72
4.4. Synthèse d'évaluation des principales réalisations du projet au 31 décembre 2025	73
V. CADRE DE RESULTAT PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS FIXES DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2025	87
VI. DIFFICULTES RENCONTREES ET LES MESURES CORRECTIVES	93
VII. PERSPECTIVES	95
VIII. CONCLUSION	96
IX . ANNEXES	XCVII

LISTE DES TABLEAUX

1	Mise en œuvre des activités
2	Synthèse de Suivi des activités du PTBA au 31 décembre 2025
3	Récapitulatif des réunions tenues au 31 décembre 2025
4	Tenue des sessions du CPN
5	Tenue des sessions du CTL
6	Etat de réalisation des recommandations du CPN et du CTL de 2024
7	Synthèse des activités prévisionnelle globales planifiées du STEP
8	Synthèse des activités du PPM
9	Répartition des marchés selon le type et méthode de sélection
10	Activités engagées par type des marchés
11	Principaux résultats des personnes inscrites pour les THIMO
12	% des manœuvres retenus pour les travaux de proximités à Berberati
13	Bilan de la main d'œuvre THIMO par entreprise à Berberati
14	Utilisation du revenu THIMO
15	AGR les plus répandues
16	Etat de réalisation des travaux de construction et de réhabilitation des ouvrages de proximités
17	Synthèse du taux de réalisation financier des travaux de construction des ouvrages de proximité
18	Etat de réalisation des travaux de réhabilitation des chemins piétons et voies des ouvrages de proximités
19	Synthèse du taux de réalisation financier des travaux de drainage, chemins piétons et voies de proximité
20	Gestion des plaintes du projet en 2025
21	Documents cadres et spécifiques des sauvegardes
22	Dépenses effectuées sur le PPA du Projet de 2023 à 2024
23	Situation d'exécution budgétaire du projet au 31 décembre 2025
24	Synthèse des principales réalisations financière du projet en 2025
25	Principaux résultats d'évaluation des activités du projet atteint au 31 décembre 2025
26	Situation du Cadre de Résultat des indicateurs du projet en 2025
27	Résultat provisoire de l'étude des solutions fondées sur la nature pour Bangui
28	Résultat provisoire de la ville de Berberati visant à réduire les risques de propagation de ces ravins et la dégradation des routes nationales
29	Détaille des activités prévisionnelles planifiées dans le STEP
30	Activités engagées
31	Marchés en cours
32	Activités non engagées
33	Details des principaux résultats des personnes inscrites par catégories des THIMO à Berberati

34	Etat d'avancement des travaux de construction/réhabilitation des ouvrages
35	Etat d'avancement des travaux de réhabilitation des chemins piétons et voies des ouvrages de proximités
36	Financier des travaux de construction des ouvrages de proximité
37	Financier des travaux de réhabilitation des chemins piétons et voies des ouvrages de proximités
38	Plan d'action prioritaire suivi du chronogramme détaillé du projet en 2025
39	Evaluation détaillé des activités du PTBA au 31 décembre 2025
40	Synoptique du suivi des contrats par composante du projet au 31 décembre 2025
41	Synoptique du suivi financier du projet au 31 décembre 2025

LISTE DES FIGURES

1	Situation d'engagement du PTBA
2	Réunions de l'UGP-PROVIR
3	Situation d'engagement des marchés en 2025
4	Personnes inscrites par catégories à Berberati
5	Répartition de la main d'œuvre THIMO par quartier à Berberati
6	Situation des manœuvres THIMO à Berberati
7	Main-d'œuvre THIMO à Berberati
8	Taux de participation
9	Sources de revenus des travailleurs communautaires avant THIMO
10	Impact de THIMO sur la situation économique des travailleurs
11	Renforcement du sentiment de dignité par le THIMO
12	Acquisition de compétence
13	Amélioration de l'employabilité
14	Sentiment de traitement avec équité
15	Situation sur le harcèlement
16	Disponibilité et utilisation des équipements de protection individuelle
17	Capacité des participants à supporter les travaux
18	Accompagnement psychosocial
19	Souhait de participer à d'autres cycles de THIMO
20	Etat de réalisation des travaux de construction des ouvrages
21	Situation financière des travaux de construction des ouvrages de proximité
22	Etat de réalisation des travaux de drainage, chemins pétiens et voies
23	Situation financière des travaux de drainage, chemins pétiens et voies de proximité
24	Cas de gestion des plaintes du projet
25	Documents cadres et spécifiques élaborés et validés du projet
26	Taux de décaissement et d'engagement du projet
27	Evolution du taux d'exécution financière du projet par trimestre
28	Situation d'exécution budgétaire du projet
29	Situation budgétaire du projet par composante

SIGLES ET ABBREVIATIONS

AOI	Appel d’Offre International
AI	Audit Interne
AOIR	Appel d’Offre International Restreint
AON	Appel d’Offre National
ASPM	Avis Spécifique de Passation de Marchés
AGPM	Avis Généraux de Passation des Marches
APS	Avant-Projet Sommaire
APD	Avant-Projet Détaillé
BM	Banque mondiale
AU	Architecte Urbanisme
CGES	Cadre de Gestion Environnemental et Social
CLGP	Comité Local de Gestion des Plaintes
CPR	Cadre de Politique de Réinstallation
CPN	Comité de Pilotage National
CN	Coordonnateur National
CA	Coordonnateur Adjoint
CR	Coordonnateur Régional
CTI	Comité Technique d’Indemnisation
DS	Documents de Sollicitation
DC	Demande de Cotation
DTPM	Dossiers Types de Passation de Marchés
ED	Entente Directe
EIES	Etude d’Impact Environnemental et Social
ESE	Expert en Sauvegarde Environnemental
FA	Fonds Additionnel
FPI	Financement des Projets d’Investissement
FEM	Fonds Mondial de l’Environnement
FCFA	Francs de la Communauté de l’Afrique Centrale
FJWSL	Fondation Joseph Worher de la structure Lazarienne
HIMO	Haute Intensité de Main d’œuvre
IDA	Association Internationale de Développement
IIP	Indicateur Intermédiaire du Projet
IODP	Indicateur d’Objectif de Développement du Projet
CGC	Clause Générale de Contrat
CPC	Clause Particulière de Contrat
KPI	Indicateur de Performance du Projet
MPA	Manuel de Procédure Administrative
MEP	Manuel d’Exécution du Projet
MEPCI	Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale
METP	Ministère de l’Équipement des Travaux Publics
MEFCP	Ministère des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche
MEDD	Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

MOUS	Maitrise d’Œuvre Urbain et Sociale
MOP	Manuel d’Opération du Projet
MGP	Mécanisme de Gestion des Plaintes
MURFVH	Ministère de l’Urbanisme, de la Réforme foncière, de la Ville et de l’Habitat
NES	Normes Environnementales et Sociales
NPF	Nouveau Cadre des Marchés Publics
ODR	Optimisation des Ressources
ODP	Objectif de Développement du Projet
PAD	Document d’Evaluation du Projet
PAR	Plan d’Action pour la Réinstallation
PF	Points Focaux
PGES	Plan de Gestion Environnemental et Social
PMPP	Plan de Mobilisation des Parties Prenantes
PPM	Plan de Passation de Marché
PTBA	Plan du Travail et Budget Annuel
PEES	Plan Engagement Environnemental et Social
POS	Plan Opérationnel Standard
PROVIR	Projet des Villes Inclusives et Résilientes
PPSD	Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour Promouvoir le Développement
RSF	Rapport de Suivi Financier
RGPH4	Recensement Général de la Population et de l’Habitat n°4
GRM	Mécanisme de Gestion des Plaintes
SAP	Système d’Alerte Précoce
SBQC	Sélection Basée sur la Qualité et le coût
SGF	Spécialiste en Gestion Financière et Administrative
SIG	Système d’Information Géographique
SIGI	Studio Galli Ingénierie Afrique
SPM	Spécialiste en Passation des Marchés
ESE	Expert en Sauvegardes Environnementales
ES	Expert en Suivi et Evaluation
ESS	Expert en Sauvegardes Sociales
EGRS	Expert en Gestion des Risques de Sécurité
ESVBG	Expert en Sauvegardes des Violences Basées sur le Genre
ECOM	Expert en Communication
USD	Dollar Américain
UGP	Unité de Gestion de Projet
PIU	Unité de mise en œuvre du projet
THIMO	Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre
TS	Travaux Structurant
TP	Travaux de Proximité

RESUME EXECUTIF

Le Projet des Villes Inclusives et Résilientes (PROVIR), financé par un don de l'Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque mondiale d'un montant de **70 millions USD**, est mis en œuvre par le Gouvernement de la République Centrafricaine à travers le Ministère de l'Urbanisme, de la Réforme Foncière, de la Ville et de l'Habitat.

Le projet vise à **améliorer l'accès aux infrastructures résilientes aux risques climatiques et aux services de base dans les villes de Bangui et de Berberati**, tout en renforçant les capacités institutionnelles en matière de planification urbaine, de gestion des risques et de gouvernance locale.

L'année 2025 constitue une étape déterminante dans la mise en œuvre du projet, marquée par la consolidation des dispositifs institutionnels et opérationnels, l'avancement des études techniques et environnementales, le lancement progressif et la réalisation des travaux d'infrastructures ainsi que le renforcement de l'engagement communautaire dans les zones d'intervention.

Avancement global de la mise en œuvre

Au cours de la période sous revue, la mise en œuvre du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) a permis d'engager un nombre important d'activités préparatoires et opérationnelles. Sur un total de **211 activités programmées**, **81 ont été réalisées**, soit un taux global d'exécution d'environ **38,39 %**, tandis que **58 activités sont en cours de réalisation**.

La performance varie selon les composantes du projet :

- **Composante 1 : Investissements dans la réduction des risques d'inondation et d'érosion** – progression modérée liée à la phase d'études et de préparation technique des travaux structurants ;
- **Composante 2 : Infrastructures et services de base dans les quartiers** – démarrage progressif des travaux, notamment dans la ville de Berberati ;
- **Composante 3 : Gestion du projet** – niveau d'exécution satisfaisant, avec un taux d'engagement supérieur à **50 %**, reflétant les efforts réalisés pour assurer la mise en place des dispositifs de gestion, de suivi et de coordination.

Au plan financier, le projet a enregistré un **taux de décaissement d'environ 9,4 %** du budget global. Ce niveau relativement modéré s'explique principalement par la nature des activités réalisées durant l'année, largement consacrées aux études préparatoires, aux procédures de passation de marchés et à la mobilisation des équipes techniques.

Principales réalisations

Plusieurs avancées significatives ont été enregistrées au cours de l'année 2025 à savoir :

Mise en place des instruments techniques et de sauvegardes

Le projet a finalisé l'élaboration de plusieurs **documents cadres environnementaux et sociaux**, notamment le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), le Cadre de

la Politique de Réinstallation (CPR) , le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) ainsi que différents Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Ces instruments constituent des outils essentiels pour garantir la conformité des activités du projet aux normes environnementales et sociales.

Par ailleurs, les études techniques relatives aux **travaux structurants de réduction des risques d'inondation et d'érosion** à Bangui et Berberati ont été lancées, avec la mobilisation des cabinets spécialisés chargés de la maîtrise d'œuvre.

Démarrage des investissements dans les quartiers

Dans le cadre de la composante dédiée aux infrastructures de proximité, les premiers **travaux d'aménagement et de réhabilitation d'infrastructures communautaires** ont été engagés dans plusieurs quartiers de la ville de Berberati. Ces interventions concernent notamment :

- la réhabilitation d'écoles et d'infrastructures éducatives ;
- l'amélioration d'espaces publics et de marchés de proximité ;
- l'aménagement de centres communautaires et d'infrastructures sanitaires ;
- la création d'espaces destinés aux activités économiques locales.

Ces travaux contribuent directement à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la dynamisation de l'économie locale.

Mobilisation communautaire et inclusion sociale

Le projet a également accordé une attention particulière à la **participation communautaire et à l'inclusion sociale**, notamment à travers la mise en œuvre des activités à Haute Intensité de Main-d'Œuvre (THIMO).

Dans ce cadre, **3 627 personnes ont été enregistrées comme candidates aux travaux**, dont **45 % de femmes**, avec une forte proportion de personnes vulnérables, incluant des femmes chefs de ménage, des personnes déplacées internes, des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap.

Ces initiatives contribuent non seulement à la réalisation des travaux de proximité, mais également à la **création d'opportunités économiques temporaires pour les populations locales**.

Renforcement des capacités institutionnelles

L'année 2025 a également été marquée par l'organisation de nombreuses **réunions de coordination et de concertation** entre l'Unité de Gestion du Projet, les autorités locales, les ministères sectoriels et les partenaires techniques.

Ces échanges ont permis de renforcer la gouvernance du projet, d'assurer le suivi régulier des activités et de faciliter la coordination entre les différentes parties prenantes.

Par ailleurs, plusieurs **sessions de formation et de sensibilisation** ont été organisées sur les thématiques liées aux sauvegardes environnementales et sociales, à la prévention des

violences basées sur le genre, ainsi qu'à la gestion des risques sécuritaires dans les zones d'intervention.

Contraintes et défis rencontrés

Malgré les progrès enregistrés, la mise en œuvre du projet a été confrontée à certaines contraintes, notamment :

- des retards dans le démarrage effectif de certains travaux en raison des procédures liées à la **libération des emprises et à l'indemnisation des personnes affectées par le projet** ;
- des ajustements techniques nécessaires dans les plans d'aménagement afin de tenir compte des résultats des consultations communautaires ;
- un rythme de décaissement encore limité, lié au caractère préparatoire de plusieurs activités.

Ces défis ont toutefois été progressivement pris en compte grâce au renforcement du suivi opérationnel et à la coordination entre les parties prenantes.

Perspectives

Pour la prochaine phase de mise en œuvre, le projet prévoit :

- l'accélération du **lancement des travaux structurants de drainage et de voirie** dans les villes cibles ;
- la poursuite et l'extension des **travaux de proximité dans les quartiers prioritaires** ;
- le renforcement de l'engagement communautaire et de la participation des populations bénéficiaires ;
- l'amélioration du **taux d'exécution financière et des décaissements**, en lien avec l'intensification des activités d'investissement.

Conclusion

Malgré un contexte opérationnel exigeant et les contraintes inhérentes à la phase initiale de mise en œuvre, le PROVIR a enregistré au cours de l'année 2025 **des progrès significatifs dans la mise en place des fondations techniques, institutionnelles et sociales nécessaires à la réussite du projet.**

Les réalisations enregistrées témoignent d'une dynamique positive qui devrait permettre, dans les prochaines années, d'accélérer les investissements urbains et de contribuer durablement à l'amélioration de la résilience climatique et des conditions de vie des populations dans les villes de Bangui et de Berberati.



INTRODUCTION

Ce rapport annuel est préparé par l'Unité de Gestion du PROVIR, conformément aux dispositions de l'accord de crédit signé le 17 septembre 2024 entre le Gouvernement de la République Centrafricaine et la Banque Mondiale relatives au suivi des rapports et l'évaluation du Projet.

La présente édition constitue le rapport annuel du Projet depuis sa mise en vigueur. Il couvre la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025.

Il présente les éléments substantiels qui ont concouru à la réussite du Projet des Villes Inclusives et Résilientes (PROVIR) en termes d'activités annuelles.

Les points sur l'état de réalisation des activités physique et financière du PROVIR sont énumérés de la manière suivante :

- Informations générales sur le projet ;
- Réalisations du PTBA au 31 décembre 2025 ;
- État de mise en œuvre du PPM au 31 décembre 2025 ;
- Situation d'exécution budgétaire du projet au 31 décembre 2025 ;
- Situation du cadre de résultat par rapport aux objectifs fixés en 2025 ;
- Difficultés rencontrées et les propositions des mesures correctives ;
- Perspectives ;
- Conclusion.

I. INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET

Cette partie présente succinctement les informations sur l'accord de Don entre le Gouvernement Centrafricain et la Banque mondiale.

1.1. Objectif du projet

L'objectif de développement du projet des villes inclusives et résilientes est d'améliorer l'accès aux infrastructures de résilience climatique et aux services de base dans les villes sélectionnées.

1.2. Indicateurs au niveau de l'ODP

Les indicateurs d'effet de l'ODP sont les suivants :

- a. Personnes protégées contre les risques d'inondation ou d'érosion (ventilées par sexe) ;
- b. Personnes bénéficiant de meilleures conditions de vie en milieu urbain (ventilées par sexe).

1.3. Financement du projet

Les principales données de l'accord du Don sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Données générales du projet	
Intitulé exact du projet	Projet des Villes Inclusives et Résilientes en RCA (PROVIR)
Ministère de tutelle	Ministère de l'Urbanisme, de la Réforme Foncière, de la Ville et de l'Habitat
Bailleur	IDA/BANQUE MONDIALE
Numéro du projet	P178774
Numéro du don	IDA-E3700 CF PROVIR
Etape du projet	
Demande du Gouvernement Centrafricain	27/09/2022
Date d'Approbation par le Conseil d'Administration de la Banque Mondiale	10/09/2024
Date de signature de l'Accord	17/09/2024
Entrée en vigueur	07/10/2024
Date de signature du Fonds Additionnel du FEM	06/10/2025
Montant du Fonds Additionnel-FEM	9 175 000 USD
Date de clôture	30/08/2029
Montant de l'Accord du Don initial	USD 70 000 000
Montant total de financement du projet	79 175 000 USD

Objectif global du Projet	Améliorer l'accès aux infrastructures résiliente au climat, au service de base et aux opportunités socio-économique, et renforcer la capacité institutionnelle pour la prestation de services locaux au niveau national et international dans certains villes.
Information sur le Comité Stratégique du PROVIR	
Références Arrêtés Portant Création du Comité de Pilotage National	Arrêté n°69/24/MURFVH/DIRCAB portant création, attribution, composition et fonctionnement du Comité de Pilotage National (CPN).
Référence Arrêté portant Création des Comités Techniques Locaux du Projet des Villes Inclusives et Résilientes (PROVIR) pour les villes de Bangui et Berberati	Arrêté n°68/24/MURFVH/DIRCAB portant création d'un Comité Technique Locaux du PROVIR (CTL). Arrêté n°77/24/MURFVH/DIRCAB portant création des Comités de Coordination Communautaire du PROVIR (CCC). Arrêté n°15/25/MURFVH/DIRCAB portant création du Comité de Gestion des Contrats de l'UGP-PROVIR (CGC).
Nombre des membres du Comité de Pilotage National	4 Comités
Nom du Président du Comité de Pilotage National	Pr Richard FILAKOTA , Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale (MEPCI).
Nom du Président des Comités Techniques Locaux	Madame Nicol KOUE
Fonction du Président des Comités Techniques Locaux	Ministre de l'Urbanisme, de la Réforme Foncière, de la Ville et de l'Habitat (MURFVH).
Principaux bénéficiaires	Composante 1 : cibles directes des investissements en infrastructures estimées à 800 000 bénéficiaires ; Composante 2 : cibles directes des investissements dans les quartiers estimés à 177 400 bénéficiaires dont 135 400 à Bangui et 42 000 à Berberati.

Source : UGP-PROVIR, 2025.

1.4. Composantes du projet

Les activités du projet sont regroupées en 4 composantes suivantes :

A. Composante 1 : Investissements dans la réduction des risques d'inondation et d'érosion (45 millions USD)

Sous-composante 1.1 : Infrastructures pour la réduction des risques d'inondation et d'érosion (40 millions USD)

Elle vise à financer les infrastructures physiques pour la réduction des risques d'événements climatiques (par exemple, les inondations et l'érosion) et les évaluations techniques connexes, y compris les études de faisabilité, les conceptions techniques détaillées et les évaluations de sauvegarde, ainsi que les contrats avec des sociétés internationales de supervision d'ingénierie. L'enveloppe budgétaire proposée tient d'abord compte de la taille de la population de la ville et de son poids économique. Elle prend également en compte l'ampleur des besoins en infrastructures de base et enfin la capacité à mettre en œuvre le projet, en particulier les investissements lourds. Pour rappel, Bangui est une ville principale de la RCA avec 1,4 M d'habitants, qui a accueilli une grande partie des personnes déplacées lors du dernier conflit. Berberati est une ville secondaire avec une population de 103 541 habitants et une capacité de mise en œuvre du projet modérée.

Sous-composante 1.2 : Appui institutionnel à la planification intégrée des risques climatiques et à la gestion urbaine (5 millions USD)

Capacités de planification urbaine et de gestion urbaine tenant compte des risques climatiques, les principales activités comprendront (a) des plans urbains intégrés combinant trois dimensions - planification urbaine, drainage et gestion des risques d'inondation et d'érosion ; et (b) une assistance technique connexe. Le plan intégré vise à aider à déterminer où et comment le développement - y compris l'étalement urbain et le déplacement forcé vers la ville - se produit dans les dynamiques actuelles et projetées du climat et de la croissance urbaine. Ces plans seront complétés par la préparation d'un système d'alerte précoce aux inondations centré sur la population (c'est-à-dire l'achat d'un nombre limité de stations synoptiques et hydrologiques pour surveiller la vulnérabilité aux inondations et à l'érosion), ainsi que par le renforcement des capacités des parties prenantes essentielles du système d'alerte précoce (par exemple, le ministère de l'action humanitaire, les services météorologiques, la protection civile et la Croix-Rouge, entre autres).

Renforcement des capacités de l'État et des municipalités en matière de planification urbaine et de gestion des risques de catastrophe.

Les activités dans les villes cibles comprendront une formation de renforcement des capacités proportionnelle à la capacité existante et aux perspectives de chaque ville en termes de rôles et d'objectifs qui peuvent être atteints pendant la durée du projet. En outre, on s'attend à ce que les activités du projet au titre des composantes 1 et 2 offrent également des possibilités de renforcement des capacités, étant donné que les municipalités joueront un rôle de premier plan dans leur conception et leur mise en œuvre. Ainsi, les activités de renforcement des capacités seront étroitement liées aux investissements réalisés dans le cadre de ces composantes.

B. Composante 2. Infrastructures et services de base dans les quartiers (20 millions USD)

Cette composante soutiendra les investissements dans les infrastructures communautaires, les études de pré faisabilité ont impliqué un large processus de consultations locales dans 13 quartiers prioritaires (9 à Bangui et 4 à Berberati). Le processus a été principalement mené par le Ministère de l'Urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat (MURFVH) et les municipalités de Bangui et Berberati, renforçant ainsi leurs capacités et contribuant à une plus grande confiance dans les institutions. La composante financera également des contrats avec des sociétés de supervision d'ingénierie.

Dans chaque ville, les investissements ont été regroupés en deux catégories principales, (i) routes et drainage ; (ii) réhabilitation de bâtiments et espaces publics - ont été séquencés et attribués en tenant compte du budget et du regroupement géographique afin de minimiser le nombre de contrats et de permettre aux petites et moyennes entreprises locales d'être compétitives. En outre, tous les investissements ont été conçus en tenant compte des aspects opérationnels et de mise en œuvre, notamment des critères d'accessibilité et de la disponibilité des matériaux et des machines. La ventilation du budget est basée sur le ratio des zones prioritaires entre les deux villes.

C. Composante 3 : Gestion du projet (5 millions USD)

Ce volet soutiendra des activités telles que : (i) la planification, la mise en œuvre et la supervision technique des activités du programme, (ii) la gestion efficace des risques sociaux et environnementaux, et (iii) la gestion financière et la passation des marchés. Cela comprendra le fonctionnement quotidien de l'unité de mise en œuvre du projet (PIU). Les agences gouvernementales concernées aux niveaux national, régional et local seront impliquées dans le processus de mise en œuvre avec un soutien adéquat en matière de renforcement des capacités. Les activités comprendront (i) des campagnes de communication et de sensibilisation des communautés, notamment sur les risques de catastrophes, la déforestation, la gestion des eaux de pluie et le ruissellement, la gestion des déchets solides et l'habitat informel, et (ii) des dispositions en matière de suivi et d'évaluation. Des mécanismes de mise en œuvre innovants tels que des outils numériques de suivi/supervision, y compris la télédétection et le suivi et la supervision géo habilitants (GEMS) seront utilisés dans les mécanismes de suivi et d'évaluation du projet.

Le projet soutiendra le renforcement des capacités de l'UGP et du MURFVH de manière plus générale, sur la base d'une évaluation de leurs compétences techniques dans les domaines de la gestion financière, des achats, de la gestion des ressources humaines, de la planification des projets, du suivi et de l'évaluation (S&E), des méthodes d'engagement communautaire et des garanties. Le projet veillera à ce que les fonctionnaires travaillent en étroite collaboration avec les consultants techniques recrutés par l'unité de mise en œuvre du projet afin de faciliter l'apprentissage en cours d'emploi. Le MURFVH sera soutenu pour diriger l'évaluation des performances des municipalités et la supervision de la mise en œuvre des sous-projets.

D. Composante 4 : Intervention d'urgence (0 million de dollars)

Une composante d'intervention d'urgence (CERC), initialement sans allocation budgétaire, permettra la réaffectation rapide des fonds du projet en cas de crise naturelle ou causée par l'homme et d'épidémies majeures d'importance pour la santé publique pendant la mise en œuvre du projet, conformément à la politique de financement des projets d'investissement (IPF) de la Banque mondiale, paragraphes 12 (Projets dans des situations de besoin urgent d'assistance ou de contraintes de capacité). L'activation du CERC est déclenchée par (a) une déclaration d'état d'urgence par le gouvernement et (b) une demande du gouvernement à la Banque mondiale pour l'activation du CERC. Les modalités de mise en œuvre et les activités éligibles à financer dans le cadre du CERC seront décrites dans le manuel des opérations du projet (MOP).

1.5. Les zones d'intervention du projet

Les zones d'intervention dudit projet sont énumérées de la manière suivante :

Bangui : Les quartiers bénéficiaires sont regroupés en 9 zones et sont énumérés de la manière suivante :

- Zone 1 (Quartiers Ramandji, Boulata, Cité Boeing et Cité Dameca) ;
- Zone 2 (Lipia 2, Lipia 4, Sangbanda, Dedengue 4 et 5),
- Zone 3 (Lando 2) ;
- Zone 4 (Banga 2, Ngouciment 1 et Ben-zvi centre) ;
- Zone 5 (Mpoko Bac 2, Gbanikola 1 et 2) ;
- Zone 6 (Ngaragba Gbotoro, Ngatoua, Toaka, Gbangouma 4 et Saint Paul1) ;
- Zone 7 (Galabadja sinistrés, Galabadja 1, 2, 3 et 4) ;
- Zone 8 (Gbakassa 1, Ngou catere 1 et 2 et Kokoro canal) ; et,
- Zone 9 (Cité Sato, Poto-poto 1 et 2).

Les activités comprendront :

- Réfection des routes secondaires (surfaçage) : 4,6 km
- Drainage tertiaire : 20,4 km
- Drainage vert : 3,4 km
- Construction de passerelles : 17
- Drainage vert : 3, 8 km
- Réhabilitation de sentiers piétons : 34, 8 km
- Réhabilitation de carrefour : 1
- Réhabilitation de bâtiment de centre de santé : 1
- Réhabilitation de bâtiments scolaire : 09
- Réhabilitation de petit marché (clôture, entrepôt) : 8
- Réfection d'espaces publics : 11.

Berberati : Les quartiers bénéficiaires sont regroupés en 4 zones présenté comme suit :

- Zone 1 (Poto-poto, Ngou Ciment 2, Djambala 1,2 et 8)
- Zone 2 (Sambanda 1 et 3)
- Zone 3 (Ndao, Baba Salao et Kasai 1)
- Zone 4 (Centre-ville).

Les Activités comprendront :

- Réfection des routes secondaires : 4, 4 km
- Réfection de carrefour (y compris le drainage) : 2
- Construction d'infrastructure de drainage : 2.3 km
- Construction de drainage vert : 9.7 km
- Réhabilitation de sentiers piétonniers : 16,6 km
- Bâtiments scolaires et réhabilitation de cours (écoles existantes) : 4
- Petites réhabilitations de marchés (par exemple, entrepôt, clôture, etc.) : 5
- Réhabilitations d'espaces ouverts (par exemple, espaces verts, espaces récréatifs et éducatifs, espace public pour les taxis-motos, etc.) : 8.

1.6. Rappel des principales activités des travaux du projet

Pour rappel dans le cadre du projet des villes inclusives et résilients les activités du projet sont divisées en deux (2) grands travaux.

Il s'agit des : (i) travaux structurants au niveau de la composante 1 du projet ; et, (ii) travaux de proximités au niveau de la composante 2 du projet dont les détails des activités sont présentés comme suit :

- (i) **Les travaux structurants renferment les activités suivantes** : Réfection des routes secondaires (surfaçage), drainage tertiaire, drainage vert, construction de passerelles, drainage vert, réfection de carrefour (y compris le drainage) et construction d'infrastructure de drainage) ; et,
- (ii) **Les travaux de proximité concernent quant à elle les activités ci-après** : Construction et réhabilitation des bâtiments administratifs et Scolaires et réhabilitation de cours (écoles existantes), Petites réhabilitations de marchés (par exemple, entrepôt, clôture, etc.), réhabilitations d'espaces ouverts (par exemple, espaces verts, espaces récréatifs et éducatifs, espace public pour les taxis-motos, etc.), celle des fournitures et le renforcement des capacités des départements ministériels concernés par le projet tant à Bangui qu'à Berberati, sans oublier les activités des contractuelles de mises en œuvre (entreprises ou consultants) y compris les partenaires d'exécution, tout en ajoutant le cadre des résultats (indicateurs) du projet.

1.7. Partenaires de mise œuvre du projet

Le projet est placé sous la tutelle du Ministère de l'Urbanisme, de la Réforme Foncière, de la Ville et de l'Habitat et sous la supervision et le contrôle d'un Comité de Pilotage National (CPN) assisté des Comités Techniques Locaux (CTL) et des Comités de Coordination Communautaires (CCC) constitués des ONG locales, des Maires, de Délégué Spécial de la Ville de Berberati, des Sociétés Civiles et des associations féminines.

L'Unité de Gestion du Projet (UGP) est chargée de la mise en œuvre des composantes et de la supervision générale des activités du projet.

Les autres Ministères sectoriels, impliqué dans la mise en œuvre du projet tels que le : (i) Ministère de l'Urbanisme, de la Réforme Foncière, de la Ville et de l'Habitat ; (ii) les Mairies de la Ville de Bangui et de Berberati ; (iii) le Ministère de l'Equipement des Travaux Publics ; (iv) le Ministère des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche ; (v) le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ; et enfin, (vi) le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale.

1.8. Bénéficiaires du projet

Les bénéficiaires comprendront les populations touchées par les risques d'inondation et d'érosion et les groupes vulnérables, notamment les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les rapatriés, les femmes et les jeunes.

Dans le cadre de la composante 1 du projet, les bénéficiaires directs des investissements en infrastructures sont estimés à 800 000 bénéficiaires, tandis qu'au niveau de la composante 2, les bénéficiaires directs des investissements dans les quartiers sont à 177 400, avec des répartitions suivantes : 135 400 à Bangui (soit 10% de la population), et 42 000 à Berberati (soit 50% de la population).

II. LES REALISATION SYNOPTIQUES DU PTBA DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2025

2.1. Bilan des engagements du PTBA au 31 décembre 2025

a. Etat de mise en œuvre des activités par composante


Tableau n° 1 : Mise en œuvre des activités

Composante	Activités prévus	Activités engagées	Activités en cours	Activités non engagées	Taux d'engagement
Composante 1	41	17	8	16	41,46%
Composante 2	42	9	8	25	21,43
Composante 3	126	95	2	20	75,40%
Composante 4	0	0	0	0	0
Total	209	121	18	61	57,89%

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Ce tableau présente la situation d'exécution globale des activités ainsi que la justification des écarts. De manière générale, sur les **deux-cent-neuf (209)** activités programmées, **cent-vingt-une (121)** sont déjà réalisées, **dix-huit (18)** sont en cours et **soixante-une (61)** qui n'ont pas été réalisées.

Figure 1 : Situation d'engagements du PTBA

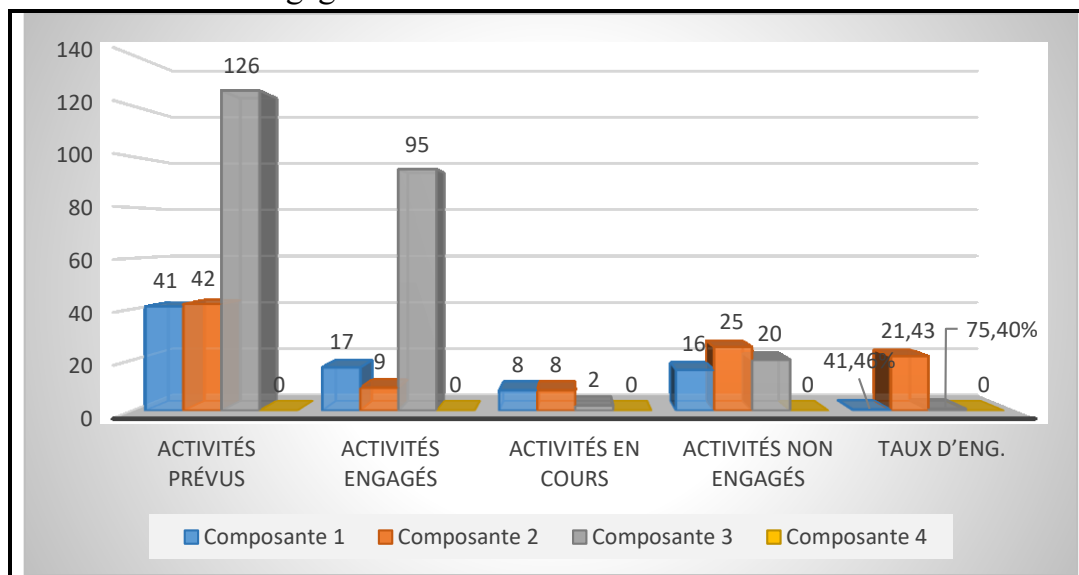

Cette figure présente des taux de réalisation des activités au 31 décembre 2025 par composante ci-après :

- (i) Composante 1 : 41,46% ;
- (ii) Composante 2 : 21,43 ;
- (iii) Composante 3 : 75,40% ;
- (iv) Composante 4 : 0%.

Sur les 209 activités prévues, plus de 121 activités ont été réalisées soit un taux de réalisation global de 57,89% au 31 décembre 2025.

Tableau n° 2 : Synthèse de Suivi des activités du PTBA au 31 décembre 2025

Activités	Activités prévus	Activités engagés	Taux d'eng.	Activités en cours	Activités non engagés
Composante 1 : Investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base					
1.1 : Infrastructure pour la réduction des Risque d'Inondation et d'Erosion	30	13	43,33	8	9
1.2 : Appui Institutionnel à la Planification Intégrée des risques Climatiques et à la Gestion Urbaine	11	4	36,36	0	7
Sous total de la composante 1	41	17	41,46	8	16
Composante 2 : Infrastructure de quartier et services de base					
Infrastructure de quartier et services de base	42	9	21,43	8	25
Composante 3: Gestion de projet					
Diverses Etudes et travaux, mobiliers et materiels de bureaux et Staff du PROVIR	29	29	100,00	0	0
Mise en œuvre des instruments de gestion environnementale, sociale et VBG	41	27	65,85%	0	5
Mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales	10	4	40%	0	4
Mise en œuvre des mesures de Prévention et d'atténuation des risques de Violence Basée sur le Genre (VBG)	15	6	40%	0	9
Stratégie de la Sécurité	31	29	93,55	2	2
Sous total de la composante 3	126	95	75,40%	2	20
Total	209	121	57,89%	18	61

Source : UGP-PROVIR, 2025. (Cf les détails du PTBA 2025.

2.2. Situation des réunions de Coordinations du projet


Le tableau ci-dessous présente le nombre des réunions tenues par l'Unité de Gestion du PROVIR :

Tableau n° 3 : Récapitulatif des réunions tenues au 31 décembre 2025

N°	Libellés	Nombres des réunions	%
1	Réunions de Coordination de l'UGP-PROVIR	21	32%
2	Réunions bimensuelles UGP PROVIR-Banque mondiale	29	44%
3	Réunions du Comité de Pilotage National	2	2%
4	Comité Technique Local (CTL) (2) et autres réunions (5)	7	11%
5	Comité de Coordination Communautaire (CCC)	4	6%
6	Réunion technique pour la présentation des observations sur le rapport de PAR de Berberati avec SERF Burkina	4	6%
7	Réunion technique de présentation, validation des études APS, APD	7	9%
8	Réunion technique de présentation des études APS avec LUSTRE	1	1%
9	Réunion technique de présentation des études APS avec la SGI	4	5%
Total des réunions tenues		78	

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Figure 2 : Réunions de l'UGP-PROVIR

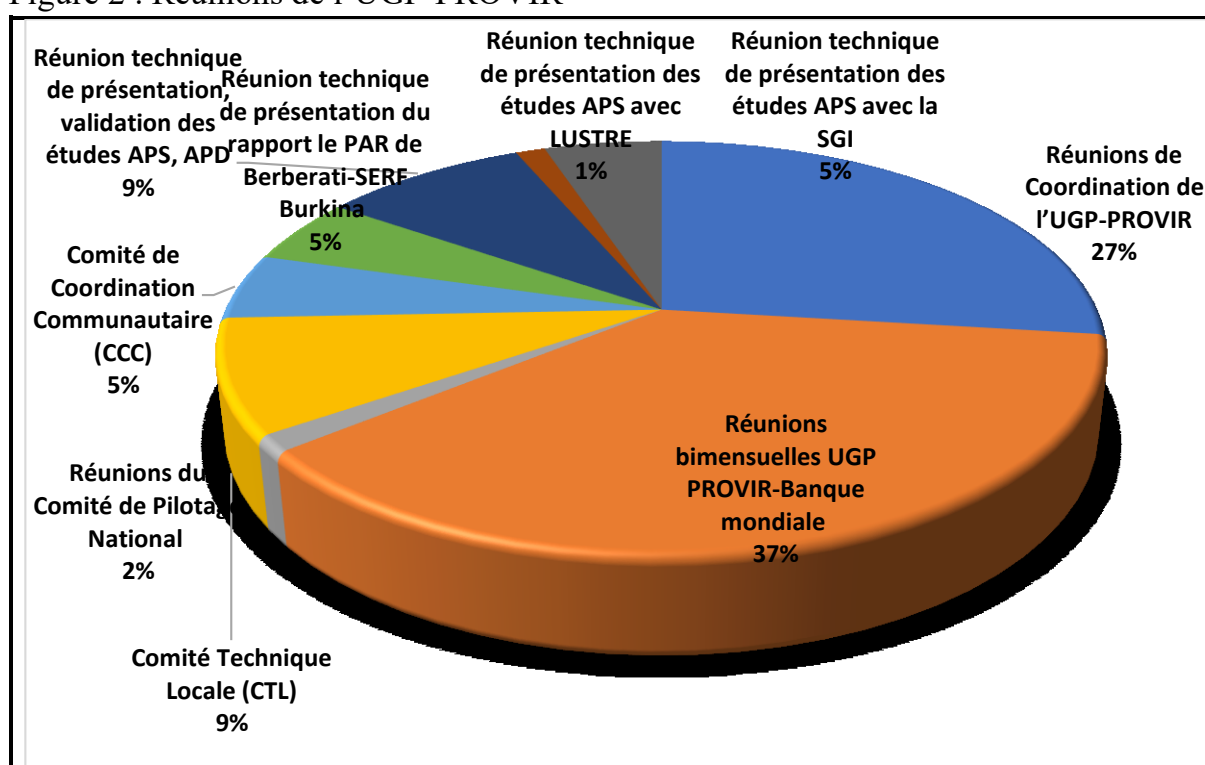

Commentaire :

Comme l'indique le tableau, au total 78 réunions ont été tenues à différents niveaux par l'UGP-PROVIR et ces réunions sont réparties comme suit :

- i) Réunions de Coordination de l'UGP-PROVIR : 21 soit 32% ;
- ii) Réunions bimensuelles UGP PROVIR-Banque mondiale : 29 soit 44% ;
- iii) Réunions du Comité de Pilotage National : 2 soit 1% ;
- iv) Comité Technique Local (CTL) : 7 soit 11% ;
- v) Comité de Coordination Communautaire (CCC) : 4 soit 6% ;
- vi) Réunion technique pour la présentation des observations sur le rapport de PAR de Berberati avec SERF Burkina : 4 soit 6% ;
- vii) Réunion technique de présentation, validation des études APS, APD : 7/9% ;
- viii) Réunion technique de présentation des études APS avec LUSTRE 1 soit 1% ;
- ix) Réunion technique de présentation des études APS avec la SGI 4 soit 5%.

2.3. Tenue des Sessions du Comité d'Orientation Stratégique

Tableau n° 4 : Tenue des sessions du Comité de Pilotage National (CPN)

Intitulé	Nombre	Observations
Nombre de sessions ordinaires tenues dans l'année 2025.	2	Date : 15/11/2024 Ordre du Jour : ✚ Présentation du PROVIR ; ✚ Présentation du PPM ; ✚ Présentation du Draft du PTBA 2025. Date : 21/11/2025 Ordre du Jour : ✚ Présentation de l'état d'avancement du projet ; ✚ Présentation de l'état du plan de passation de marchés du projet ; ✚ Présentation de la situation financière du projet ; ✚ Présentation et validation du PTBA 2026 ; ✚ Recommandations.
Nombre de sessions extraordinaires tenues dans l'année 2025.	0	Aucune session extraordinaire n'a été tenue par projet en 2025 en ce qui concerne le CPN.

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 5 : Tenue des sessions du Comité Technique Local (CTL)

Intitulé	Nombre	Observations
Nombre de sessions ordinaires tenues dans l'année 2025	2	Date : 07 au 08/11/2024 Ordre du Jour : ✚ Le PTBA du projet est adopté pour validation par le Comité de Pilotage ;

		 Les coûts de la 1 ^{ère} année de mise en œuvre du projet sont arrêtés. Date : 07 au 08/11/2025 Ordre du Jour :  Evaluer le Plan de Travail et Budget Annuel 2025 (PTBA 2025) en cours d'exécution ;  Adopter le PTBA 2026 avant de le soumettre pour validation au Comité de Pilotage de PROVIR.
Nombre de sessions extraordinaires tenues dans l'année 2025.	0	Aucune session extraordinaire n'a été tenue par projet en 2025.

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 6 : Etat de réalisation des recommandations du CPN et du CTL de 2024

Difficultés/Problèmes identifiés	Recommandations	Responsable de mise en œuvre	Etat d'exécution
Suivi des recommandations formulées par le CPN en 2024			
Aucune difficulté ou problème n'a été identifié.	Prioriser la préférence nationale dans le recrutement des entreprises ou cabinet/consultant.	Coordonnateur National et le SPM	Exécuter à 100%
Aucun problème n'a été identifié.	Ressortir la contrepartie nationale à travers le montant des exonérations et autres services publics budgétisés dans le cadre du projet (Ex : Certification de conformité délivré par le Ministère de l'Environnement).	CN, SPM et SGF	Exécuter à 100%
Aucun problème n'a été identifié, juste le Bureau de Contrôle qui fait le suivi de réalisation des travaux à Berberati en attendant les démarrages des activités à Bangui.	Mettre en place le bureau de contrôle pour le suivi des travaux d'infrastructures	CN, CA et SPM	Exécuter à 100% (Cf. le Bureau de Contrôle TechniPlan en cours d'exécution à Berberati).

Aucune difficulté n'a été identifiée jusqu'alors.	Eviter toutes attributions de marchés en dehors de la validation du PTBA.	SPM	Respecter à 100%.
Recommandations formulées par le CPN pour mise en œuvre dans le PTBA 2026			
Les recommandations formulées par le CPN lors de la validation du PTBA 2026 et qui seront évaluées dans le rapport annuel 2026, sont présentées de la manière suivante : ✚ Démarrer simultanément les travaux structurants à Bangui et à Berberati ; ✚ Accélérer la programmation et le lancement des travaux structurants ; ✚ Mettre à disposition du MEPCI un (1) véhicule de supervision sur le terrain.			
Recommandations formulées par les CTL en 2024			
Constat de la dégradation du couvert végétal de la colline de BAS OUBANGUI dans le PTBA 2025.	Prendre en compte dans le PTBA 2025, la réhabilitation/rénovation du couvert végétal en dégradation de la colline de BAS OUBANGUI	CN, CA et SGF	Exécuter à 100% de la prise de l'activité dans le PTBA 2025.
	Insérer dans le PTBA 2025 une ligne pour la sensibilisation sur la protection du couvert végétal		Reporter en 2026.
Manque de programmation de renforcement des capacités pour les membres du CTL.	Faire une extension de renforcement de capacités aux membres du Comité Technique Local	CN, CA et le SPM	Non exécuté car les besoins n'ont pas été exprimés par les membres du CTL au travers des TdRs.
Le fonctionnement des CTL est limité.	Augmenter le budget du Comité Technique Local à hauteur de 10 millions tout en incluant les volets communication et monitoring	CN, CA, CR, SPM, SGF	Budget augmenté à 10 millions.
Recommandations formulées par les CTL pour mise en œuvre dans le PTBA 2026			
Les recommandations formulées par le CTL pour la validation du PTBA 2026, qui seront évaluées dans le rapport annuel 2026 sont présentées de la manière suivante : ✚ Proposer à l'Unité de Gestion du Projet un calendrier de rencontres du Comité Technique Local de la ville de Bangui pour l'année 2026 ; ✚ Chaque participant est tenu de présenter le Projet PROVIR aux autorités sectorielles pour une meilleure appropriation des objectifs du projet.			

Source : UGP-PROVIR, 2025.

III. SITUATION DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2025

3.1. Situation de mise en œuvre du plan de passation des marchés

Le suivi des activités au niveau de la passation des marchés du PROVIR en date du 31 décembre 2025, sont présentés comme suit :

Tableau n° 7 : Synthèse des activités prévisionnelles globales planifiées dans STEP

Les prévisions globales insérées dans le STEP	
Composante 1 : Nombre d'activités programmées	17
Composante 2 : Nombre d'activités programmées	9
Composante 3 : Nombre d'activités programmées	33
Composante 4 : Nombre d'activités programmées	0
Total des activités planifiées dans STEP	59

Source : UGP-PROVIR, 2025. (Cf. les détails en annexe)

Tableau n° 9 : Répartition des marchés selon le type et méthode de sélection

Type de marché	AOI	AON	DC	ED	SBQC	Total général
Marchés des fournitures		3	3			6
Marchés des services des consultants	39			4	1	44
Marchés des travaux y compris le service des consultants		8	1			9
Total général	39	11	4	4	1	59

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 10 : Activités engagées par type des marchés

Libellés	Marchés prévus	Marchés engagés	Marchés en cours	Marchés non engagés	Taux d'eng.
Marché des travaux	9	9	0	0	100
Service des consultants	43	28	3	12	65,12
Autres services de consultants	1	1	0	0	100
Marché des fournitures	6	6	0	0	100
Total général	59	44	3	12	74,58


Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 11 : Activités engagées par composante

Composante	Marchés prévue	Marchés engagés	Marchés en cours	Marchés non engagés	Taux d'eng.
Composante 1	7	3	2	0	42,86
Composante 2	9	9	0	0	100
Composante 3	43	32	1	12	74,42
Composante 4	0	0	0	0	0
Total général	59	44	3	12	74,58

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Figure 3 : Situation d'engagement des marchés en 2025

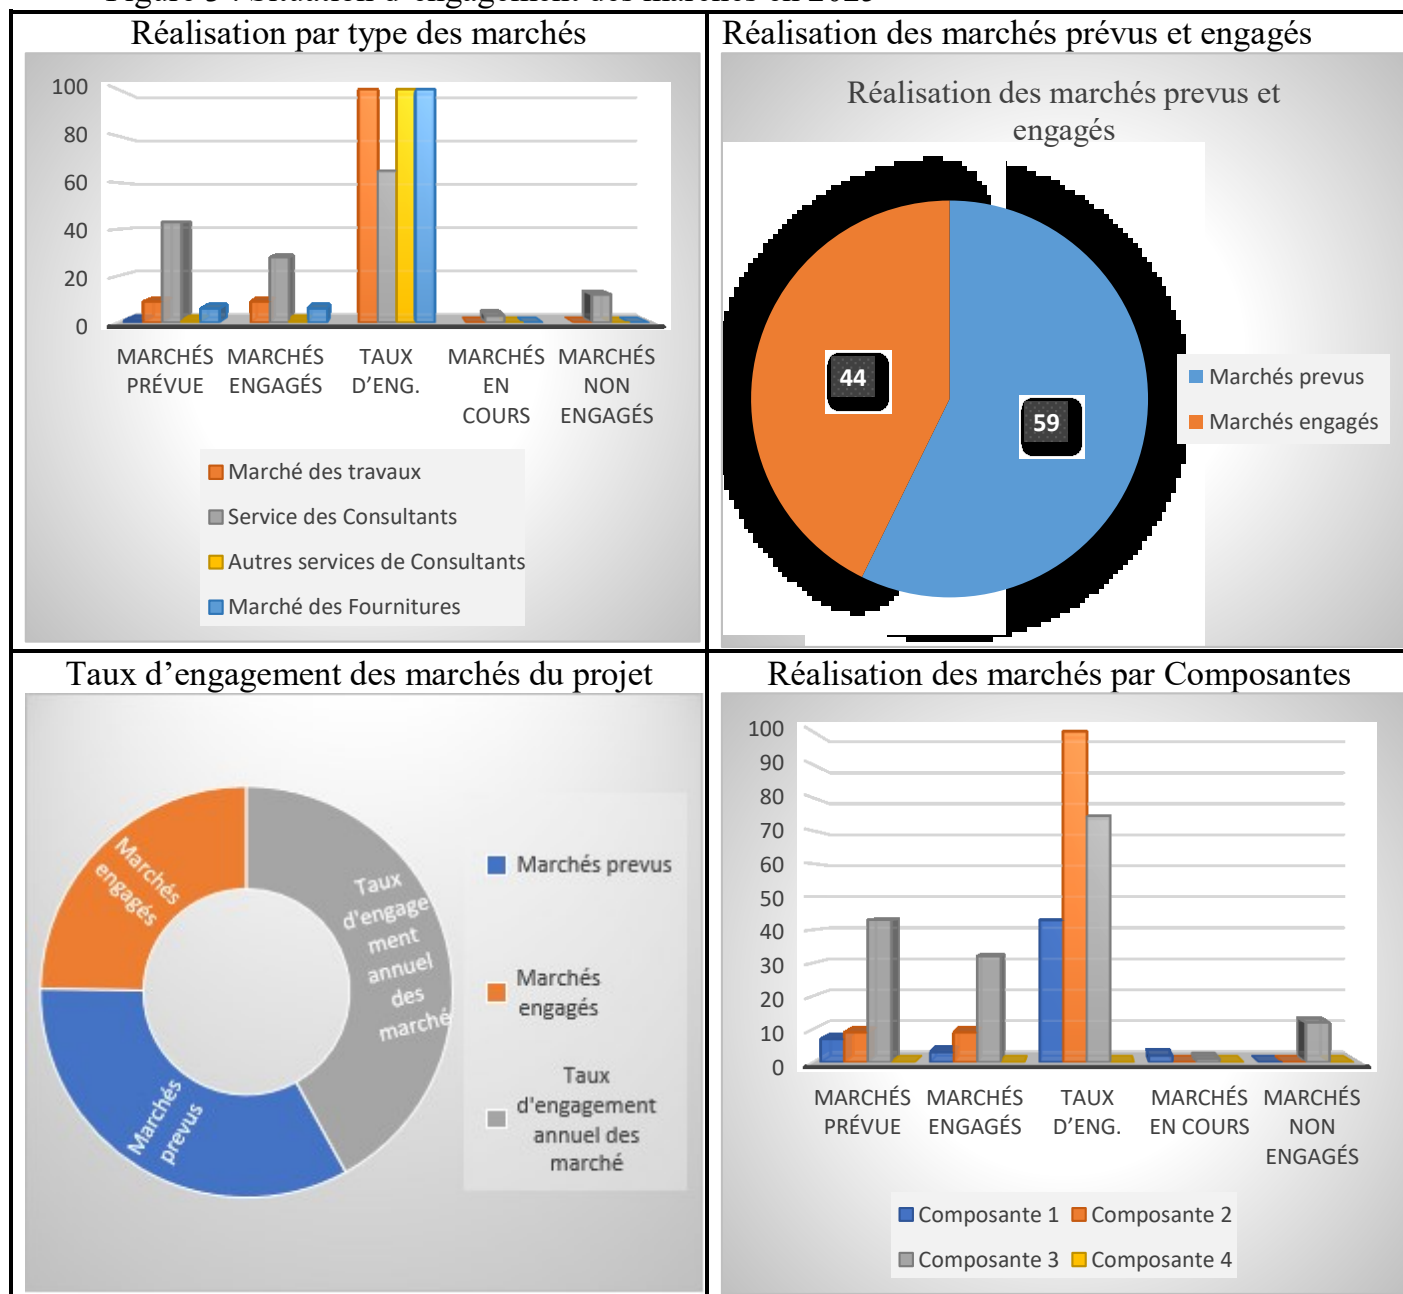

Source : UGP-PROVIR, 2025. (Cf. les détails de tableau n° en annexe)

La situation d'engagement des marchés du projet en 2025 est présentée comme suivante :

Au niveau des types des marchés :

- Marché des travaux en légende orange : 100% ;
- Service des Consultants en légende grise : 65,12% ;
- Autres services de Consultants en légende jaune : 100% ;
- Marché des Fournitures en légende bleu ciel : 100%.

Au niveau d'engagement des marchés par composante

- Composante 1 en couleur de la légende bleue : 42,86% ;
- Composante 2 en couleur de la légende orange : 100% ;
- Composante 3 en couleur de la légende grise : 74,42% ;
- Composante 4 en couleur de la légende jaune : 0%.

NB : sur cinquante-neuf (59) marchés prévus dans le plan de passation des marchés, quarante-quatre (44) marchés sont exécutés, soit un taux d'engagement annuel de soixante-quatorze virgule cinquante-huit (74,58%) en 2025.

3.2. Les réalisations des activités du projet par composante au 31 décembre 2025

Les activités mises en œuvre pour l'ensemble des composantes sont celles qui sont définies dans le Plan de Travail et du Budget Annuel (PTBA) validé par le Comité de Pilotage puis approuvé par la Banque. Les réalisations concernent les composantes suivantes :

A. Composante 1 : Investissements dans la réduction des risques d'inondation et d'érosion

Au niveau de la composante 1 en lien avec les deux (2) sous composante, le projet a signé quatre (4) contrats pour service de consultance dont certains sont déjà exécuté et d'autres en cours d'exécution et sont présentés à différents niveaux comme suivants :

► Sous composante 1.1 : Infrastructure pour la réduction des Risque d'Inondation et d'Erosion

N°	Contrats signés	Montants du contrat
1	Contrat PROVIR-05/SC/QC/23 avec SERF BURKINA, pour l'élaboration des documents et spécifiques des activités de sauvegardes du projet	136 948 920
2	Contrat MIN/INFRAS-433434-CS-INDV avec la Fondation Joseph Worker/structure Lazarienne, pour la Maitrise d'œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) à Bangui et à Berberati	143 694 400
3	Contrat N° 2 et 3 avec le Groupement Studio Galli Ingénierie Afrique (SGI) – SUARL, pour la maîtrise d'œuvre complète des travaux structurants	967 753 876
Total des engagements		1 248 397 196

Source : UGP-PROVIR, 2025.

► Sous composante 1.2 : Appui Institutionnel à la Planification Intégrée des risques Climatiques et à la Gestion Urbaine

N°	Contrats signés	Montants du contrat
4	Contrat N°355/25/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR avec NAMS SERVICE pour la création de site Web du Ministère de l'Urbanisme.	5 500 000

5	Etude et mission de contrôle de réhabilitation du bâtiment de l'UGP-PROVIR	99 164 800
Total des engagements		104 664 800

Source : UGP-PROVIR, 2025.

1.1.1. Les réalisations de la sous composante 1.1

1.1.1.1. Contrat de SERF BURKINA

L'activité du contrat de SERF BURKINA est subdivisée en deux (2) phases et sont énumérées comme suit :

- La première phase, concerne l'élaboration des documents cadres des composantes 1 et 2 du projet.

Les documents cadres ci-dessous ont été élaborées :

- Cadre de gestion environnemental et social (CGES) ;
- Cadre de la politique de réinstallation (CPR) ;
- Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) y compris le manuel de gestion des plaintes (MGP).

1.1.1.2. Réalisation de l'étude de la maîtrise d'œuvre complète des travaux (Bangui et Berberati) par le cabinet SGI

Le contrat est signé avec le Groupement Studio Galli Ingénierie Afrique (SGI) relatif à la mission de la maîtrise d'œuvre complète des travaux de réduction des risques d'inondation et d'érosion à Bangui et Berberati pour une durée de 3 ans et 8 mois. L'ordre de service de démarrage a été délivré et les études sont en cours de réalisation.

Bangui et Berberati :

- Le rapport de démarrage a été livré ;
- Les rapports d'études APS sont disponible mais encours d'observations et échanges afin de préparer l'atelier de validation.

1.2.1. Les réalisations de la sous composante 1.2

1.2.1.1. Le contrat de NAMS SERVICE a pour objet la création du site Web du MURFVH avec 1 an d'abonnement

► Travaux réalisés

- Conception de l'interface utilisateur ;
- Développement du back-office ;
- Développement du front-end ;
- Mise en ligne et hébergement web : <https://www.minurbanisme-rca.org/>
- Intégration des contenus.

► Résultats obtenus

Le site web du Ministère de l'Urbanisme constitue désormais une plateforme institutionnelle complète et fonctionnelle.

Il permet de :

- Assurer une diffusion rapide et transparente de l'information publique ;
- Renforcer la visibilité des programmes et projets du Ministère ;
- Faciliter la communication entre l'administration et les usagers ;
- Offrir un espace de référence pour les partenaires techniques et financiers intéressés par les politiques urbaines et foncières.

Ce site symbolise la volonté du Ministère de s'inscrire dans la modernité et de contribuer activement à la transformation numérique de l'État centrafricain.

► **Travaux restant à effectuer :**

- Suivi de l'abonnement ;
- Maintenance du site.

B. Composante 2 : Infrastructures et services de base dans les quartiers

Au niveau de la composante 2, nous avons onze (11) contrats en cours d'exécution :

➤ **Deux (2) contrats de service**

N°	Contrats signés	Montants du contrat
1	Contrat Cabinet SERF BURKINA-PROVIR-05/SC/QC/23	348 703 820
2	Contrat TECHNIPLAN-PROVIR-01/SC/SFQC/23)	579 454 047
Total général		928 157 867

Source : UGP-PROVIR, 2025.

➤ **Neuf (09) contrats des travaux**

N°	Contrats signés	Montants du contrat
1	Contrat MTC entreprise au Réf. : CF-PIU-PROVIR 477775-CW-RFB	165 050 525
2	Contrat PROMO Construction au Réf. : CF-PIU-PROVIR 477772-CW-RFB	288 548 635
3	ZAM-ZAM entreprise au Réf. : 1CF-PIU-PROVIR 477777-CW-RFB	100 322 479
4	Contrat WADEYA service au Réf. : F-PIU-PROVIR 477763-CW-RFB)	773 216 375
5	Contrat JAZZ JUNIOR au Réf : N°08/MURFVH/DIRCAB/T/UG-PROVIR/2025	987 000 000
6	Contrat GSM Construction au Réf : N°10/MURFVH/DIRCAB/T/UG-PROVIR/2025	113 828 925
7	Contrat CACS-SARL au Réf : N°07/MURFVH/DIRCAB/T/UG-PROVIR/2025	391 450 500
8	Contrat SELECT Corporation au Réf : N°07/MURFVH/DIRCAB/T/UG-PROVIR/2025	88 877 250
9	Contrat ETS Espoir au Réf : CF-06/25/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR	11 035 800
Total général		2 919 330 489

Source : UGP-PROVIR, 2025.

2.1. CONTRAT DE SERVICE :

2.1.1. Cabinet SERF BURKINA

Dans le cadre de la composante 2, les documents spécifiques suivant ont été élaborés :

- Plan de gestion de la main d'œuvre (PGMO) ;
- Plan de gestion Environnementale et sociale (PGES) des sites fixes et linéaires ;
- Plan d'action pour la réinstallation (PAR).

2.1.2. TECHNIPLAN

Le bureau d'étude/contrôle TECHNIPLAN avait commencé ces activités avec l'étude des travaux d'équipements socio-collectifs et d'aménagement des quartiers dans les zones prioritaires de Berberati.

Ce cabinet a mené ces études dans les deux (2) villes suivantes :

❖ Bangui :

- Les études APS de Bangui sont déjà disponibles ;
- Les études APD pour les travaux des infrastructures des quartiers sont en cours d'élaboration.

❖ Berberati :

- Etudes APS ; Etudes APD ; DAO ; et, Contrôle et surveillance en cours.

2.1.3. Fondation Joseph Worker de la Structure Lazarienne (FJWSL)

Ce contrat a pour mission l'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre des documents spécifiques sociaux (PGMO, PMPP, PA-VBG, MGP...) dans les villes de Bangui et Berberati.

Le Consultant a démarré ses activités dans la ville de Berberati portant sur :


- Mobilisation communautaire ;
- Sélection et engagement de la main d'œuvre THIMO ;
- Appui à la mise en œuvre des clauses sociales et environnementales ;
- Suivi et gestion des cas de VBG, EAS et HS.

Tableau n° 12 : Principaux résultats des personnes inscrites pour les THIMO

Hommes	1 989	54,80%
Femmes	1 638	45,20%
Vulnérabilité	2 770	76,40%
Femmes chefs de ménage	438	12,00%
Personnes handicapées	160	4,40%
Réfugiés/Personnes Déplacées Internes (PDI)	158	4,30%
Personnes âgées (+60 ans)	101	2,80%
Total général	3 627	

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Figure 4 : Personnes inscrites par catégories à Berberati

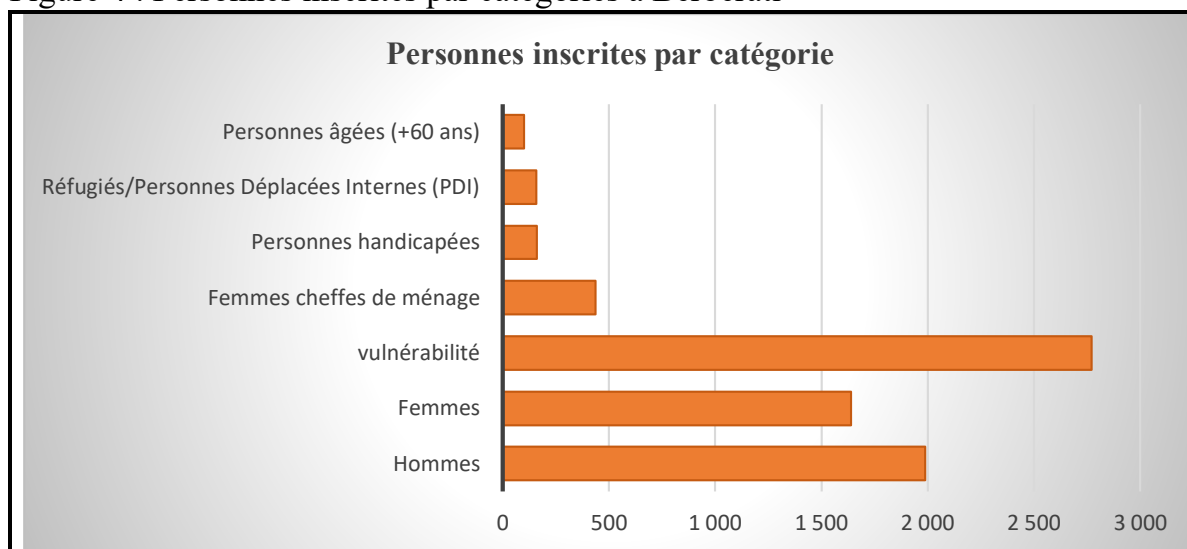


Commentaire :

Situation des principaux résultats des personnes inscrites par catégorie à Berberati présente les données ci-après :

- Personnes inscrites : 3627, dont 1989 hommes soit 54,80% et 1638 femmes soit 45,20%.
- Personnes Vulnérables : 2 770 soit 76,40% ;
- Femmes chefs de ménage : 438 soit 12,00% ;
- Personnes handicapées : 160 soit 4,40% ;
- Réfugiés/Personnes Déplacées Internes (PDI) : 158 soit 4,30% ;
- Personnes âgées (+60 ans) : 101 soit 2,80%.

Figure 5 : Répartition de la main d'œuvre THIMO par quartier à Berberati

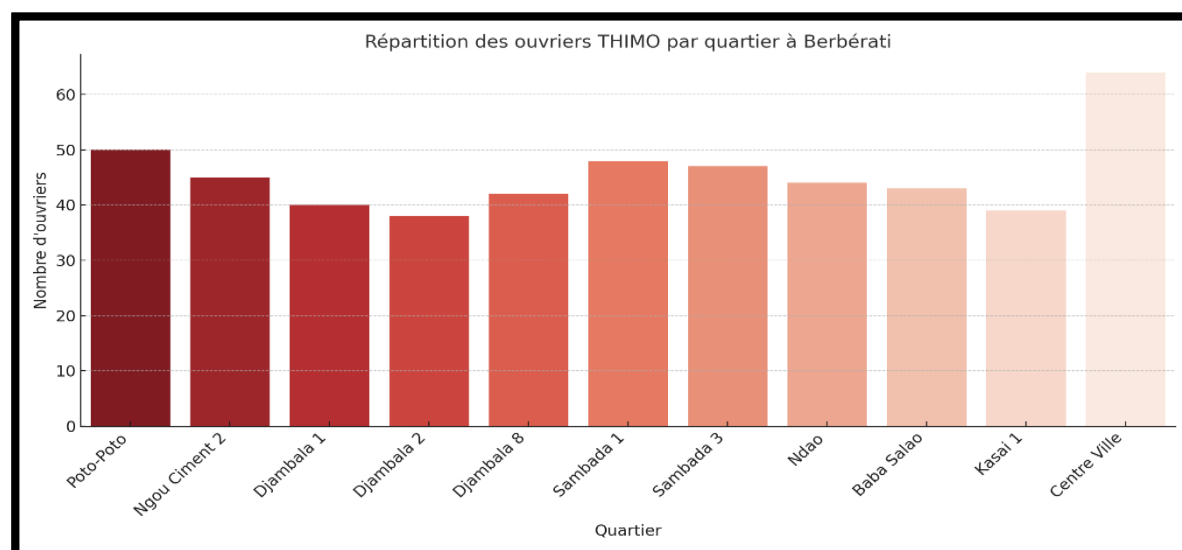

Cette figure montre une forte mobilisation dans toutes les zones, avec une prédominance de la Zone 4.

Tableau n° 13 : Manœuvres retenus pour les travaux de proximités à Berberati

Nombre des personnes inscrites	Nombre des manœuvres prévus en 2025	Nombres des manœuvre engagés en 2025	%manœuvre THIMO
3627	500	805	161%

Source : UGP-PROVIR, 2025.

- Sur 3627 personnes inscrites pour les THIMO à Berberati, 805 manœuvres ont été retenus soit un taux de 161% contre une prévision de 500 manœuvres THIMO dans le cadre de résultat des indicateurs en 2025. Nous constatons un dépassement en termes de recrutement des manœuvres THIMO de 61% par rapport à la prévision. Cette augmentation s'explique par un besoin réel élevé en terme de main d'œuvre pour les travaux lancés dans la ville de Berberati.

Figure 6 : Situation des manœuvres THIMO à Berberati



Tableau n° 14 : Bilan de la main d'œuvre THIMO par entreprise à Berberati

Entreprises/ Chantiers	Nbre manœuvres	% F	Nbre F	% H	Nbre H	Montant verser	Nbre des manœuvres /jour
---------------------------	-------------------	-----	-----------	-----	-----------	-------------------	--------------------------------

Recrutement de la main d'œuvre THIMO pour les travaux de construction et de réhabilitation des ouvrages de proximités							
ZAM -ZAM (Baba Salao)	115	40,86%	47	59,13%	68	8 972 500	3450
WADEYA (Centre-ville)	364	35,16%	128	64,83%	236	22 403 250	10920
MTC (Djambala)	90	32,22%	29	67,77%	61	4 059 450	2700
PROMO (Sambanda1)	106	33,96%	36	66,03%	70	4 652 750	3180
Recrutement de la main d'œuvre THIMO pour les travaux de drainage, des voiries et chemin piéton des ouvrages de proximités							
Djazz Junior (Djambala)	30	26,66%	8	73,33%	35	1 752 500	900
GSM (SEFCA)	23	39,13%	9	60,86%	14	555 000	690
CACS (Ça-va3)	60	41,66%	25	60%	22	797 500	1830
SELECT (Centre-ville)	16	37,05%	6	62,05%	10	835 000	480
Sommes total						44 027 950	

Source : UGP-PROVIR, 2025.


Ce tableau présente la situation des manœuvres recrutés par les entreprises, selon le genre y compris les montants versés et le nombre/jour des manœuvres :

Parmi les quatre (04) entreprises retenues dans le cadre des travaux THIMO à Berberati en ce qui concerne la construction et réhabilitation des ouvrages, WADEYA SERVICE a plus de manœuvres avec 364 recrutés (128 femmes soit 35,16% et 236 hommes soit 64%), suivi de l'entreprise ZAM -ZAM avec 115 manœuvres recrutés (47 femmes soit 40,86% et 236 hommes soit 59,13%), puis de l'entreprise PROMO construction avec 106 manœuvres recrutés et mis au travail (36 femmes soit 40,86% et 70 hommes soit 59,13%), et du MTC avec ses 90 manœuvres recrutés (dont 29 femmes soit 32,22% et 61 hommes soit 67,77%).

Tandis que les quatre (04) entreprises pour les travaux de drainage, des voiries et chemin piéton toujours à Berberati, CACS-SARL a recruté 60 manœuvres (25 femmes soit 41,66% et 22 hommes soit 60%), suivi de Djazz Junior avec 30 manœuvres recruts (6 femmes soit 26,66% et 35 hommes soit 73,33%), ensuite de GSM dont 23 manœuvres (9 femmes soit 39,13% et 14 hommes soit 60,86%), pour enfin terminer avec SELECT dont 16 manœuvres (6 femmes soit 37,05% et 10 hommes soit 62,05%).

Le montant total versé est de Quarante Quatre Millions Vingt Sept Milles Neuf Cent Cinquante (44 027 950) Francs CFA pour les huit (08) entreprises retenues dans le cadre des travaux de proximité de la composante 2 à Berberati.


Figure 7 : Bilan de la main-d'œuvre THIMO à Berberati

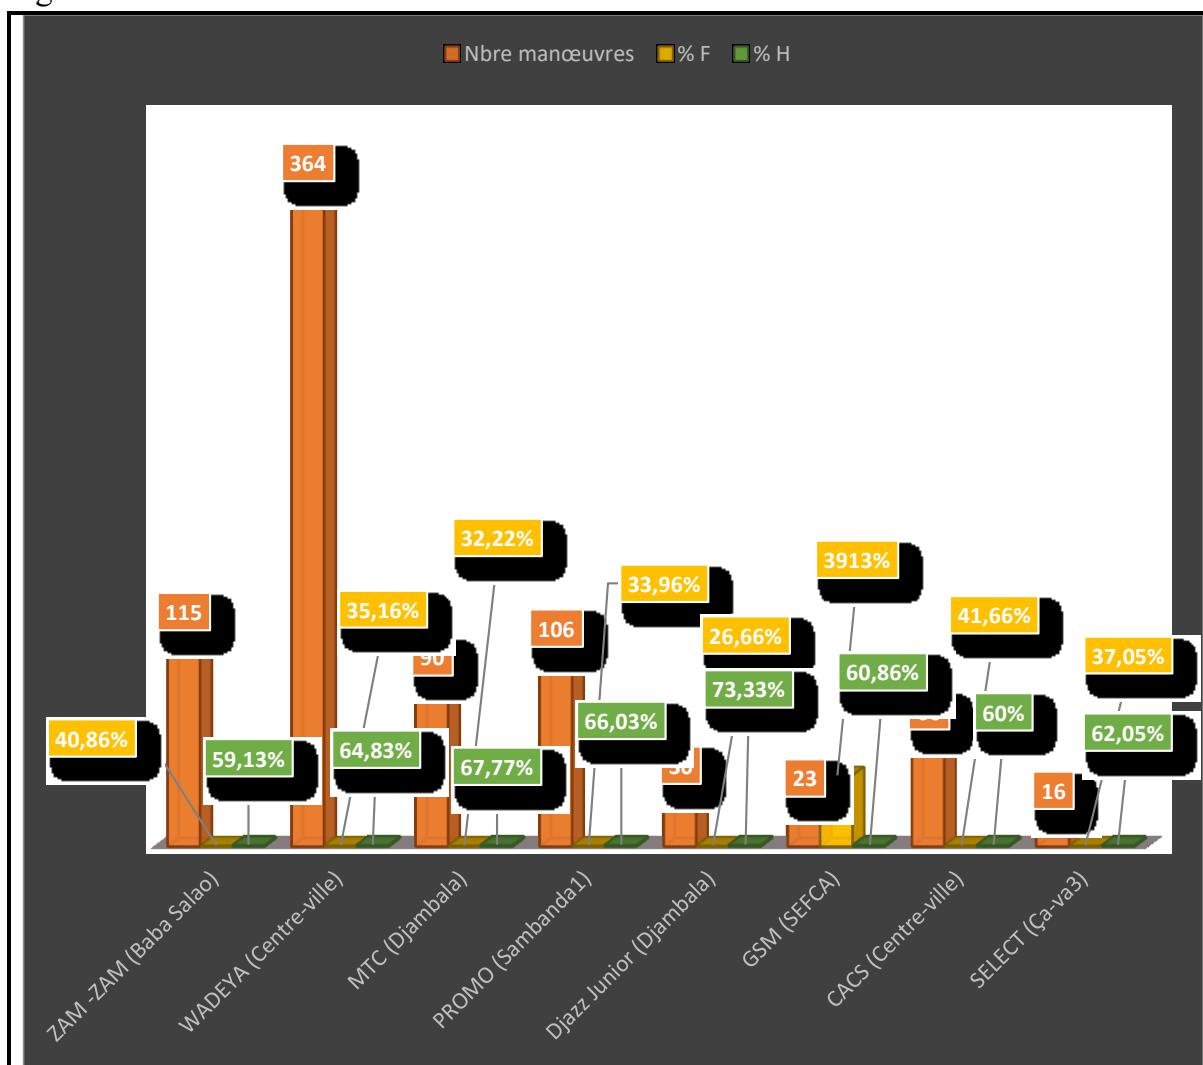

2.1.4. Analyse d'évaluation de l'impact THIMO a Berberati

Depuis le début de démarrage des travaux à Berberati surtout avec les activités THIMO, ces derniers ont constitué un levier rapide et efficace pour soutenir les ménages vulnérables dans un contexte urbain marqué par la pauvreté, l'insécurité et le chômage. Ainsi, l'analyse d'impact socioéconomique des THIMO par l'enquête auprès des ménages bénéficiaires ont montrés plus de 657 manoeuvres mobilisés, dont **428 (140 femmes et 288 hommes)** ont répondu à l'enquête et ont décrit une transformation significative de leurs conditions de vie, de leur niveau de revenu, de leur sécurité alimentaire, de leur accès aux services sociaux essentiels et de leur cohésion familiale. L'analyse participative de l'enquête est ainsi présentée :

Figure 8 : Taux de participation



L'échantillon est composé à 67,3% d'hommes et 32,7% de femmes. Cette distribution montre une dominance masculine parmi les bénéficiaires ou participants. Cela pourrait s'expliquer par la nature des activités du THIMO, souvent orientées vers des travaux à forte intensité de main-d'œuvre, traditionnellement occupés par des hommes. Toutefois, la participation de près d'un tiers de femmes reste encourageante et reflète une certaine ouverture à l'inclusion du genre.


Figure 9 : Sources de revenus des travailleurs communautaires avant THIMO



Avant leur participation, 75,2% déclaraient avoir une source de revenus, tandis que 24,8% n'en avaient pas. Cela révèle que le THIMO a ciblé à la fois des personnes totalement sans revenus et d'autres disposant de petits revenus irréguliers, favorisant

ainsi une diversité socioéconomique au sein des bénéficiaires. Ce mélange peut avoir favorisé l'entraide et la cohésion dans les équipes.

Figure 10 : Impact de THIMO sur la situation économique des travailleurs



L'analyse du graphique relatif à l'impact du THIMO sur la situation économique des bénéficiaires révèle une perception globalement très positive du programme. En effet, près de 99% des participants, hommes et femmes confondus, estiment que leur situation économique s'est améliorée à la suite de leur participation au projet. Parmi eux, 50% des femmes déclarent un impact positif et 50% un impact très positif, tandis que du côté des hommes, 48,96% évoquent un impact positif et 47,57% un impact très positif. Les perceptions négatives demeurent marginales, inférieures à 3% dans l'ensemble, ce qui confirme l'efficacité du programme en matière d'amélioration du bien-être économique.

Cette tendance montre que le THIMO a permis aux bénéficiaires de renforcer leur stabilité financière, d'améliorer leurs revenus et de retrouver une certaine autonomie économique. Le niveau de satisfaction particulièrement élevé chez les femmes souligne également l'importance du programme dans la promotion de l'inclusion économique du genre féminin, souvent plus exposé à la précarité. L'absence quasi totale de perceptions négatives traduit la pertinence du ciblage et l'adéquation du dispositif aux besoins réels des ménages vulnérables. Dans l'ensemble, le THIMO apparaît donc comme un levier efficace de relèvement économique à court terme, ayant contribué non seulement à l'augmentation des revenus mais aussi au renforcement de la confiance économique et sociale des bénéficiaires.

Tableau n° 15 : Utilisation des revenus THIMO

Utilisation principale	Nombre	Pourcentage des répondants (428)
Achat de vivres / sécurité alimentaire	334	78%
Paie ment de soins médicaux	146	34%
Paie ment des frais scolaires	124	29%
Investissement dans une AGR	175	41%
Épargne (tontine/AVEC)	81	19%
Réparations du logement	98	23%

Analyse :

Les dépenses essentielles (alimentation, santé, enfants) arrivent en première position. Cependant, un pourcentage important (41%) montre une **tendance forte à l'entrepreneuriat micro-local**, signe d'autonomisation financière.

Tableau n° 16 : AGR les plus répandues

Type d'activité	Pourcentage	Nombre de répondants
Petit commerce alimentaire	37%	158
Coiffure / beauté	22%	94
Réparation / artisanat	17%	73
Téléphone / crédit	16%	68
Agriculture urbaine / maraîchage	8%	35
Total	100%	428

Analyse :

- Les THIMO créent **un effet multiplicateur économique**.
- Les jeunes filles réinvestissent fortement dans des activités de coiffure.
- Les hommes préfèrent les activités techniques ou artisanales.

► **Impacts sur la santé et l'accès aux soins**

- Les revenus THIMO ont amélioré l'accès aux soins médicaux :
- 34% ont utilisé leurs revenus pour payer des médicaments.

- 18% ont déclaré avoir pu consulter un médecin pour la première fois depuis plusieurs mois.
- Les PDI montrent une amélioration substantielle de leur accès aux soins.

► **Résultat majeur :**

- Les ménages auparavant dépendants des dons humanitaires ont pu financer leurs propres soins.

► **Impacts sur la scolarisation des enfants**

- Le paiement des frais scolaires est rapporté par 29% des répondants.

► **Indicateurs :**

- 31% des manœuvres femmes ont payé les fournitures scolaires
- 22% des jeunes hommes ont payé les uniformes
- Plusieurs manœuvres ont inscrit leurs enfants pour la première fois

► **Effets observés :**

- Réduction de l'absentéisme scolaire
- Amélioration du bien-être psychosocial des parents
- Augmentation de l'estime de soi

► **Renforcement de la cohésion sociale et réduction des tensions**

Les THIMO ont favorisé :

- le fonctionnement d'équipes mixtes homme/femme,
- le respect mutuel créé par les modules VBG/EAS/HS,
- le travail inclusif avec des PDI et des personnes handicapées,
- l'entraide sur les chantiers.

► **Résultats mesurés :**

- 81% des répondants affirment avoir amélioré leurs relations sociales
- 67% disent avoir renforcé leur capacité à travailler en équipe
- 48% ont acquis ou renforcé des compétences relationnelles

► **Témoignage type :**

- « Les THIMO ont changé notre manière de nous parler dans le quartier. Les hommes nous respectent plus. »

► **Réduction de la vulnérabilité des femmes et jeunes filles**

- L'un des impacts les plus significatifs.

► **Éléments observés :**

- recul de la dépendance économique
- capacité de négociation accrue au sein du ménage
- réduction du risque d'exploitation sexuelle basé sur la pauvreté
- autonomisation financière progressive
- jeunes filles devenues actrices de changement

► **Impact spécifique sur les Personnes Déplacées Internes (PDI)**

- Les PDI représentent environ **18% des travailleurs communautaires.**

► **Impacts notables :**

- stabilisation temporaire du revenu
- capacité à reconstruire une partie de l'habitation (cases, toitures)
- réduction de la dépendance humanitaire
- réintégration sociale dans les quartiers d'accueil

► **Cas marquants :**

- Plusieurs PDI ont déclaré que le THIMO a été « le premier travail payé de leur vie » depuis leur déplacement.

► **Impacts psychosociaux**

- Les transformations psychosociales ont été significatives.

► **Améliorations rapportées :**


- regain de dignité,
- réduction du stress lié à la faim,
- sentiment d'appartenance à une communauté,
- fierté de contribuer au changement du quartier,
- confiance en soi retrouvée.

► **Indicateur important :**

- 32% des travailleurs communautaires ont déclaré que le THIMO a eu un impact « **très important** » sur leur moral et leur stabilité émotionnelle.

► **Impacts psychosociaux**

Renforcement du sentiment de dignité par le THIMO (cf : Figure suivant).



Les données du tableau indiquent que le THIMO a renforcé le sentiment de dignité chez la grande majorité des bénéficiaires. En effet, 80,84% des participants déclarent avoir retrouvé un sentiment de dignité, tandis que 18,69% affirment que cela a été le cas « un peu ». Seule une proportion très marginale de 0,47% estime ne pas avoir ressenti de changement à ce niveau.

Les résultats sont similaires entre les femmes et les hommes, avec respectivement 80,71% et 80,90% des répondants qui confirment un renforcement clair de leur dignité. Ces chiffres traduisent un impact social fort du THIMO, perçu de manière quasi unanime comme positif. Le programme semble donc avoir contribué à améliorer non seulement les conditions économiques, mais aussi la valorisation.


Usage du revenu THIMO	Effectif	% des bénéficiaires
Nourriture	361	84,3 %
Épargne	265	61,9 %
Démarrage d'une activité économique	248	57,9 %
Soins de santé	246	57,5 %
Scolarité des enfants	191	44,6 %
Loyer / logement	138	32,2 %

L'analyse de l'utilisation du revenu issu des activités THIMO par les 428 bénéficiaires révèle que le revenu répond en priorité aux besoins essentiels des ménages. En effet, 84,3% des bénéficiaires ont utilisé leur revenu pour l'achat de nourriture, confirmant le rôle du THIMO comme un filet de protection sociale contribuant à la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, une proportion significative des bénéficiaires a affecté ce revenu à des stratégies de renforcement de la résilience, notamment l'épargne (61,9%) et le démarrage ou le développement d'une activité économique (57,9%), traduisant une dynamique positive de relèvement économique.

Le revenu THIMO a également permis d'améliorer l'accès aux services sociaux de base, avec 57,5% des bénéficiaires ayant couvert des dépenses de santé et 44,6% des dépenses liées à la scolarité des enfants. En revanche, l'utilisation du revenu pour le loyer ou le logement reste plus limitée (32,2%), ce qui suggère que les ménages priorisent les besoins alimentaires et productifs face à des ressources financières contraintes. Dans l'ensemble, ces résultats montrent que le programme THIMO contribue simultanément à la satisfaction des besoins immédiats et au renforcement progressif de la résilience des ménages vulnérables, s'inscrivant ainsi dans une logique de Nexus Urgence–Relèvement–Développement.


Figure 12 : Acquisition de compétence

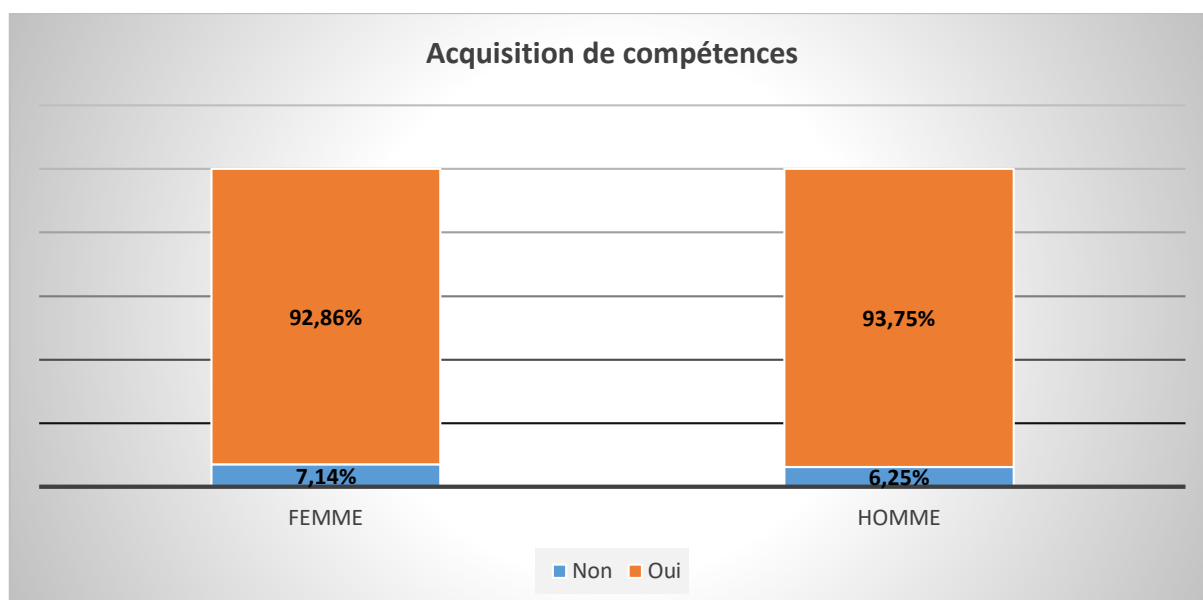

Les données montrent que le THIMO a fortement contribué à l'acquisition de nouvelles compétences chez les bénéficiaires. En effet, plus de 92% des participants, aussi bien femmes (92,86%) qu'hommes (93,75%), déclarent avoir acquis de nouvelles compétences au cours du projet. Seule une minorité, environ 7% des femmes et 6% des hommes, affirme ne pas en avoir bénéficié.

Cette quasi-unanimité illustre la dimension formatrice du THIMO, qui ne se limite pas à offrir un emploi temporaire, mais favorise également le développement de savoir-faire pratiques et professionnels. Les bénéficiaires ont donc non seulement amélioré leur situation économique, mais aussi renforcé leurs capacités techniques et leur employabilité future, confirmant ainsi la portée durable du programme en matière de renforcement des compétences.

Figure 13 : Amélioration de l'employabilité




Les données indiquent que le THIMO a globalement amélioré l'employabilité des bénéficiaires, selon la perception de la majorité des participants. En effet, 75,47% des répondants, dont 78,57% des femmes et 73,96% des hommes, estiment que leur participation au projet a renforcé leurs chances de trouver un emploi à l'avenir. En complément, 19,63% des bénéficiaires considèrent que le THIMO a « peut-être » amélioré leur employabilité, traduisant une perception positive mais prudente. Seule une faible proportion, 4,91%, ne constate aucun effet sur leur capacité à accéder à un emploi.

Ces résultats confirment que le programme a eu un impact significatif sur le développement des compétences transférables et l'expérience professionnelle des participants. Le fait que les femmes se sentent légèrement plus confiantes que les hommes quant à leur employabilité témoignent d'un effet encourageant en matière d'autonomisation économique féminine. Dans l'ensemble, le THIMO a contribué à accroître la confiance des bénéficiaires dans leur avenir professionnel, renforçant ainsi leur insertion potentielle sur le marché du travail.

► Sentiment de traitement avec équité


La grande majorité des participants, soit 98,83%, déclarent se sentir traités avec équité sur les chantiers. Cette perception positive est légèrement plus marquée chez les femmes (99,29%) que chez les hommes (98,61%), mais cette différence reste très faible. Seule une minorité de 1,17% des répondants estime ne pas être traitée équitablement. Ces résultats montrent que, de manière générale, les travailleurs perçoivent les conditions sur les chantiers comme justes et équitables, indépendamment de leur sexe.

Figure 14 : Sentiment de traitement avec équité



(Cf. le commentaire présenté ci-haut)


Figure 15 : Situation sur le harcèlement



La majorité des participants, 95,79%, déclarent ne pas avoir été victimes de harcèlement, tandis que 4,21 % indiquent en avoir subi.

La proportion de femmes ayant vécu des cas de harcèlement (7,14%) est plus élevée que celle des hommes (2,78%), ce qui suggère que les femmes sont légèrement plus exposées à ce type de situation. Dans l'ensemble, ces résultats montrent que les cas de harcèlement restent minoritaires parmi les travailleurs, mais mettent en évidence un besoin potentiel de mesures de prévention et de protection, en particulier pour les femmes.

Figure 16 : Disponibilité et utilisation des équipements de protection individuelle

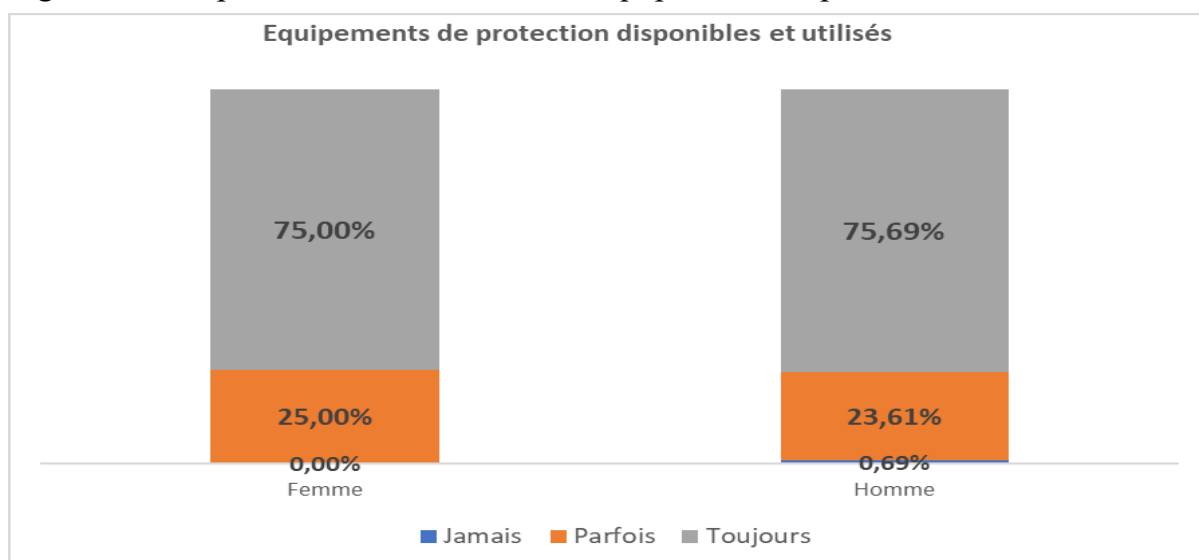


La majorité des participants, 75,47 %, déclarent que les équipements de protection sont toujours disponibles et utilisés sur les chantiers. Une proportion d'environ 24% indique

qu'ils ne sont disponibles et utilisés que parfois, tandis que moins de 0,5% déclarent ne jamais en disposer.


La répartition est très similaire entre femmes et hommes, avec 75% des femmes et 75,69% des hommes affirmant un usage constant des équipements. Ces résultats montrent que, globalement, les mesures de sécurité sont bien respectées et que les équipements de protection sont largement accessibles et utilisés par les travailleurs.

Figure 17 : Capacité des participants à supporter les travaux

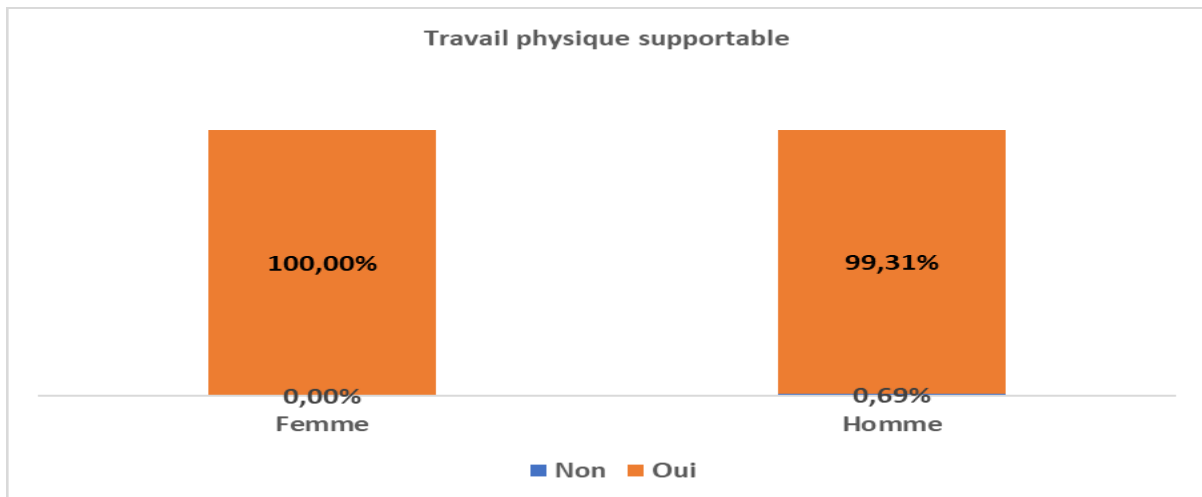


La quasi-totalité des participants, soit 99,53%, jugent que le travail physique sur les chantiers est supportable. Toutes les femmes interrogées (100%) et presque tous les hommes (99,31%) expriment cette perception positive. Seule une très faible minorité (0,47%) considère que le travail n'est pas supportable. Ces résultats indiquent que les conditions physiques de travail sont globalement adaptées et tolérables pour l'ensemble des travailleurs, indépendamment du sexe.

Figure 18 : Accompagnement psychosocial

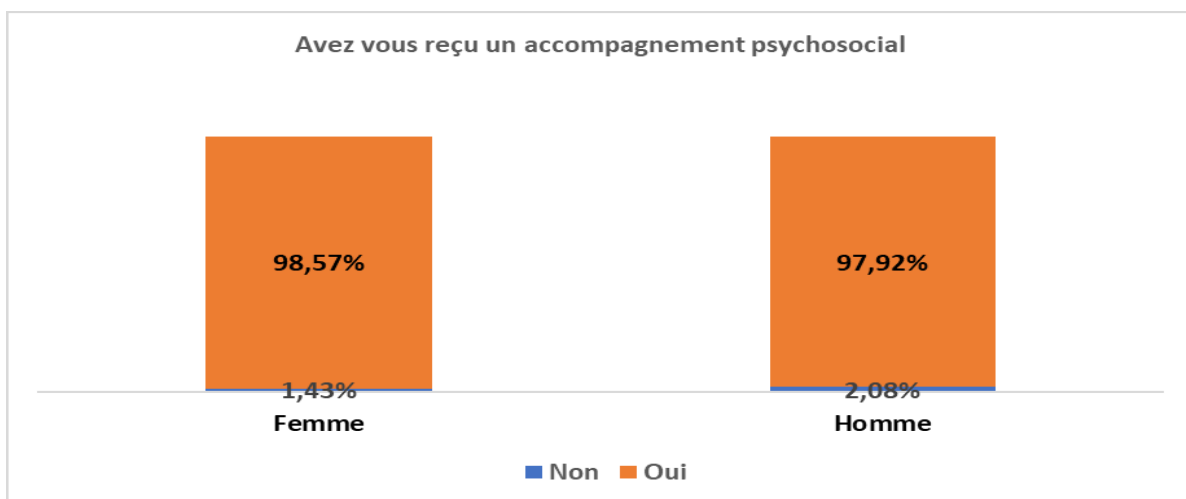

La très grande majorité des participants, 98,13%, déclarent avoir bénéficié d'un accompagnement psychosocial. Cette proportion est légèrement plus élevée chez les femmes (98,57%) que chez les hommes (97,92%), mais la différence reste faible. Seule une minorité de 1,87% n'a pas reçu ce type de soutien. Ces résultats montrent que l'accompagnement psychosocial est largement accessible et fourni à presque tous les travailleurs, contribuant ainsi à leur bien-être sur les chantiers.

Figure 19 : Souhait de participer à d'autres cycles de THIMO



La grande majorité des participants, 96,73%, souhaitent participer à d'autres cycles de THIMO. Cette volonté est légèrement plus élevée chez les hommes (96,88%) que chez les femmes (96,43%), mais la différence est minime. Seule une minorité de 3,27% ne manifeste pas ce souhait. Ces résultats indiquent un fort intérêt et une satisfaction générale des participants à l'égard du programme, incitant à la poursuite et au développement de futurs cycles.

L'analyse des revenus mensuels montre une amélioration significative à chaque étape du programme. Avant THIMO, le revenu moyen des participants était de 16 555 FCFA, passant à 36 860 FCFA pendant le programme et atteignant 53 480 FCFA après sa participation.

Ces résultats confirment que le programme THIMO a un effet très positif sur le pouvoir d'achat des participants, avec une augmentation progressive et significative du revenu moyen. Cela renforce l'impact économique du programme et la valeur de ses activités sur l'employabilité et la stabilité financière des travailleurs.

NB : Les résultats montrent que les participants se sentent globalement bien traités, soutenus et en sécurité sur les chantiers, avec un haut niveau de satisfaction concernant l'équité, l'accompagnement psychosocial et l'utilisation des équipements de protection. Cependant, il existe de légères vulnérabilités, notamment un faible pourcentage de cas

de harcèlement et quelques travailleurs n'ayant pas toujours accès aux équipements ou à l'accompagnement psychosocial.

Il est donc recommandé de renforcer les mesures de prévention contre le harcèlement, de s'assurer de la disponibilité systématique des équipements de protection pour tous, et de maintenir l'accompagnement psychosocial de manière constante. Par ailleurs, le fort intérêt des participants pour de futurs cycles de THIMO suggère de poursuivre et élargir ces programmes, tout en intégrant des mécanismes réguliers d'évaluation et de retour d'expérience pour améliorer encore la qualité de l'encadrement et des conditions de travail.

2.1.5. Situation de réalisation travaux d'équipements socio-collectifs et d'aménagement des quartiers dans les zones prioritaires à Bangui et Berberati de la composante 2

2.1.5.1. Contrats des travaux des infrastructures de base à Berberati

Les contrats des entreprises pour les travaux de bâtiments et espaces publics sont présentés de la manière suivante :

- **Lot 1 : entreprise MTC**, pour un délai de 4 mois ;
- **Lot 2 : entreprise PROMO CONSTRUCTION**, pour un délai de 4 mois ;
- **Lot 3 : entreprise ZAM-ZAM**, pour un délai de 4 mois ;
- **Lot 4 : entreprise WADEYA-SERVICE**, pour un délai de 6 mois.

Tableau n° 17 : Etat de réalisation des travaux de construction et de réhabilitation des ouvrages de proximités

Entreprises par lot	Prévisionnel de réalisation	% de réalisation annuel	Taux de C ⁿ de délais	Commentaires
Lot1 : MTC	100%	100%	100% (4/4 mois)	Travaux achevés en attente de réception provisoire par le Maître d'Ouvrage.
Lot2 : PROMO Construction	100%	100%	100% (4/4 mois)	Travaux achevés en attente de réception provisoire par le Maître d'Ouvrage.
Lot3 : ZAM-ZAM	100%	100%	100% (4/4 mois)	Travaux achevés en attente de réception provisoire par le Maître d'Ouvrage.
Lot4 : WADEYA SERVICE	100%	88,23%	83,33% (5/6 mois)	Travaux ont été suspendus suite à un accident survenu dans la zone du projet.

Source : UGP-PROVIR, TechniPlan, 2025. (Cf. les détails en annexe au tableau n°35)

Commentaire :

Il ressort du tableau, la situation des travaux suivants :

a) % des travaux réalisés par l'entreprise à ce jour se présente ci-après :

- Lot1, MTC : 100 % ;
- Lot2, PROMO Construction : 100% ;
- Lot3, ZAM-ZAM : 100% ;
- Lot4, WADEYA SERVICE : 88,23%.

b) Taux de consommation du délai par les entreprises de 4 mois à 6 mois est présenté comme suit :

- Lot1, MTC : 100% soit 4 mois de réalisation ;
- Lot2, PROMO Construction : 100% soit 4 mois de réalisation ;
- Lot3, ZAM-ZAM : 100% soit 4 mois de réalisation ;
- Lot4, WADEYA SERVICE : 83,33% soit 5 mois de réalisation sur un contrat de 6 mois comme délai d'exécution.

Figure 20 : Etat de réalisation des travaux de construction des ouvrages

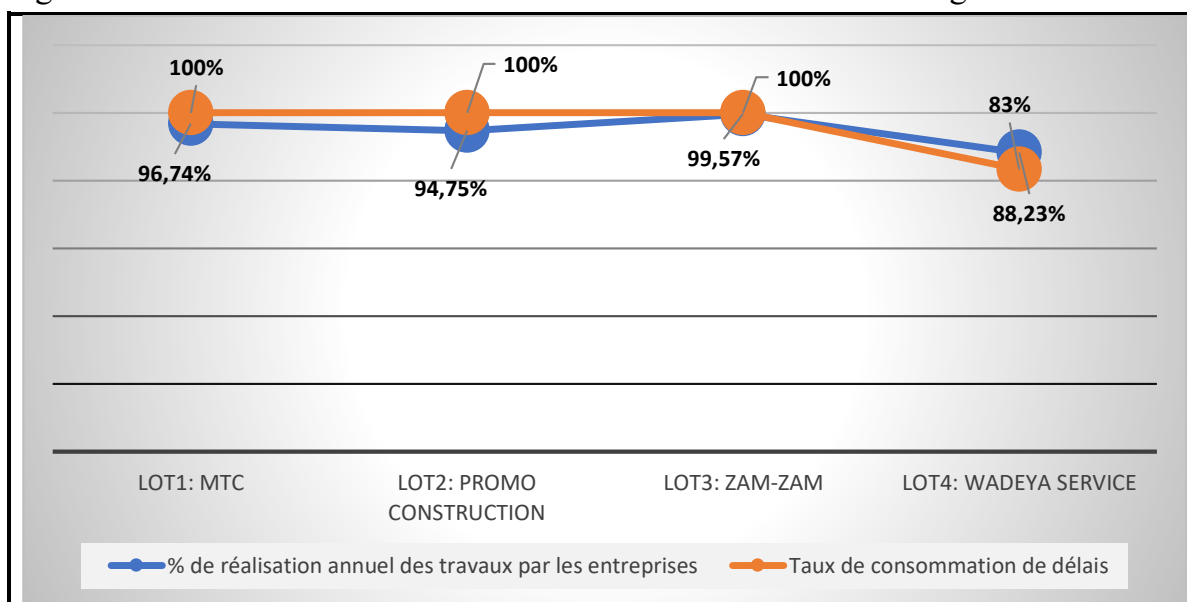


Tableau n° 18 : Synthèse du taux de réalisation financier des travaux de construction des ouvrages de proximité


Enterprise par lot	Montant initial du contrat	Paiements cumulés	Taux de paiement
Lot1 : MTC	165 050 451	159 665 168	97%
Lot2 : PROMO Construction	288 548 460	273 391 810	95%
Lot3 : ZAM-ZAM	100 322 292	96 142 509	96%
Lot4 : WADEYA SERVICE	773 215 955	682 243 454	88%

Source : UGP-PROVIR, TechniPlan, 2025.

Commentaire : L'analyse des dépenses de mises en œuvre au mois de Septembre 2025, fait ressortir des réalisations assez satisfaisantes par les entreprises suivantes :

- Zone 1 : MTC : 97% avec un paiement cumulé de 159 665 168 CFA avec un montant de contrat initial de 165 050 451 CFA ;
- Zone 2 : PROMO construction : 95% avec un paiement cumulé de 273 391 810 CFA contre un contrat initial de 288 548 460 ;
- Zone 3 : ZAM-ZAM : 96% avec un paiement cumulé de 96 142 509 CFA avec un contrat initial de 100 322 292 ;
- Zone 4 : WADEYA SERVICE : 88% avec un paiement cumulé de 682 243 454 CFA pour un contrat de 773 215 955.

Figure 21 : Situation financière des travaux de construction des ouvrages de proximité

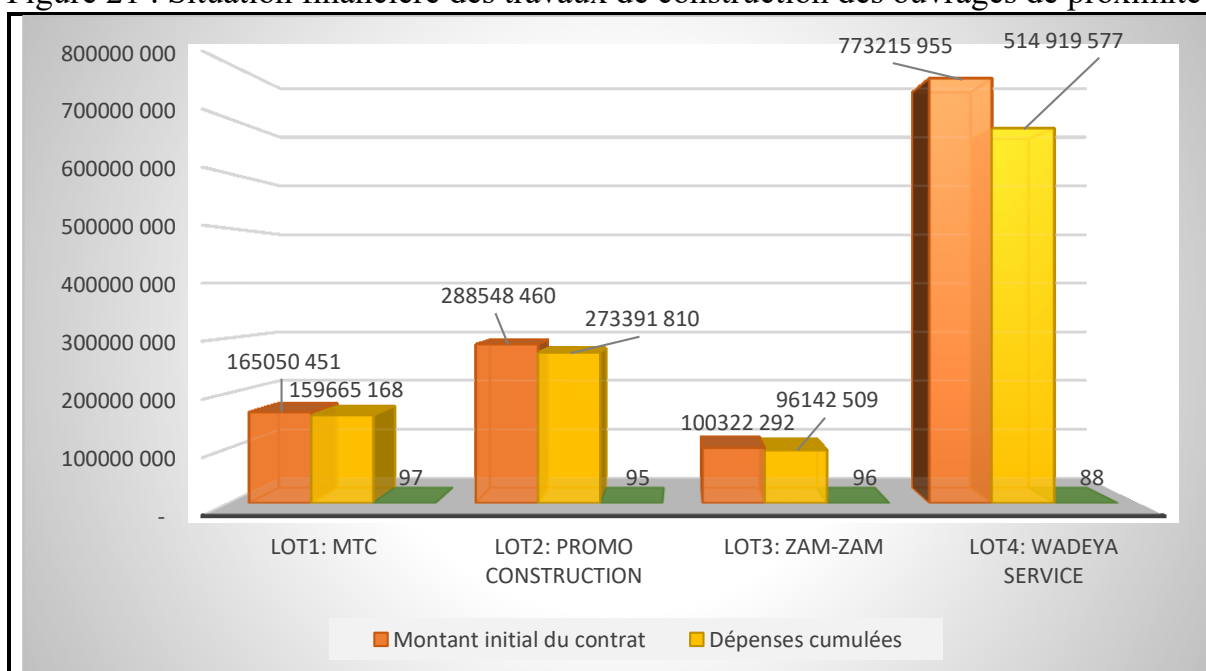

2.1.5.2. Contrat des travaux de drainage, de la voirie et des chemins piétons à Berberati

Les contrats des entreprises pour les travaux de drainage, de la voirie et des chemins piétons sont présentés de la manière suivante :

- Lot 1 : Entreprise DJAZZ Junior ; avec un contrat de 6 mois ;
- Lot 2 : Entreprise GSM Construction ; avec un contrat de 4 mois ;
- Lot 3 : Entreprise CACS SARL ; avec un contrat de 4 mois ;
- Lot 4 : Entreprise SELECT Corporation, avec un contrat de 4 mois.

Tableau n° 19 : Etat de réalisation des travaux de réhabilitation des chemins piétons et voies des ouvrages de proximités

Entreprises par lot	Prévisionnel de réalisation	% de réalisation	Taux de C ⁿ de délais	Commentaires
Lot1 : DJAZZ Junior	55,56%	16,01%	16,67% (1/6 *100)	Le taux de réalisation est inférieur à la

				prévision avec un écart de -39,55%.
Lot2 : GSM	83,33%	14,50%	25% (1/4*100)	Le taux de réalisation est inférieur à la prévision avec un écart de -68,83%.
Lot3 : CACS SARL	83,33%	7,70%	25% (1/4*100)	Le taux de réalisation est inférieur à la prévision avec un écart de -75,63%.
Lot4 : SELECT Corporation	83,33%	7,90%	25% (1/4*100)	Le taux de réalisation est inférieur à la prévision avec un écart de -75,43%.

Source : UGP-PROVIR, TechniPlan, 2025. (Cf. les détails en annexe au tableau n°36)

Commentaire :

Il ressort du tableau, la situation des travaux suivants :

a) % des travaux réalisés par les entreprises sont présentés ci-après :

- Lot1, DJAZZ Junior : 16,01% contre une prévision de 55,56% ;
- Lot2, GSM est de : 14,50% contre une prévision de 83,33% ;
- Lot3, CACS SARL : 7,90% contre une prévision de 83,33% ;
- Lot4, SELECT Corporation : 7,90% contre une prévision de 83,33%.

b) Taux de consommation du délai des entreprises de 4 mois à 6 mois est présenté comme suivant :

- Lot1, DJAZZ Junior : 16,67% soit 6 mois de réalisation ;
- Lot2, GSM : 25% soit 4 mois de réalisation ;
- Lot3, CACS SARL : 25% soit 4 mois de réalisation ;
- Lot4, SELECT Corporation : 25% soit 4 mois de réalisation.

Figure 22 : Etat de réalisation des travaux de drainage, chemins pétiions et voies

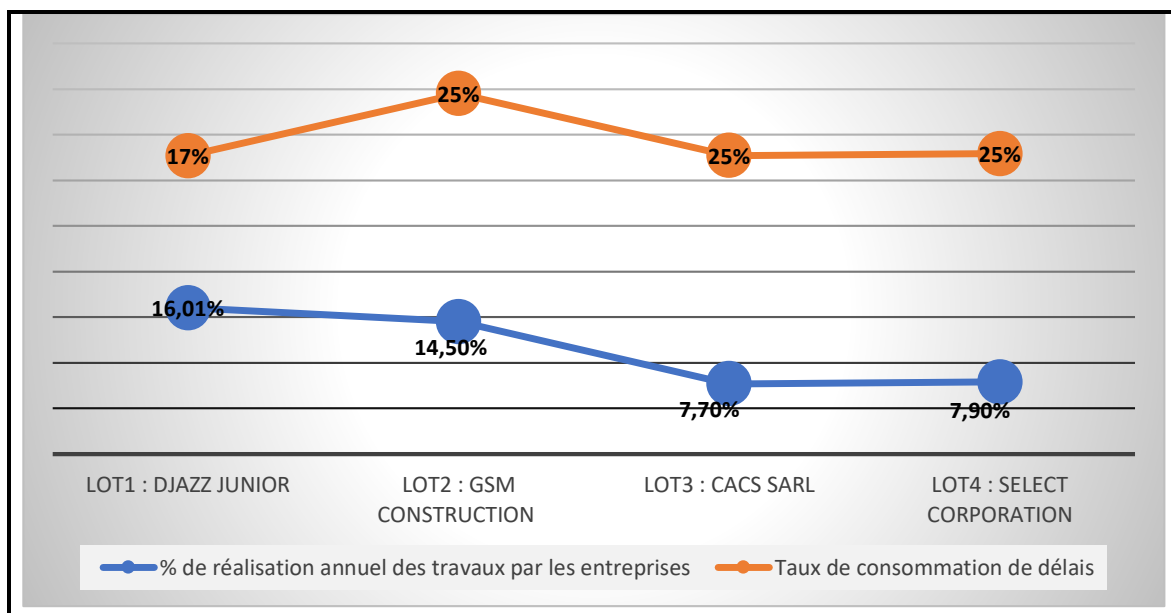


Tableau n° 20 : synthèse du taux de réalisation financier des travaux de drainage, chemins pétions et voies de proximité


Entreprise par lot	Montant initial du contrat	Dépenses cumulées	Taux des dépenses globales
Lot1 : DJAZZ-Junior	987 172 623	158 074 774	16%
Lot2 : GSM	113 828 925	16 494 563	14%
Lot3 : CACS SARL	391 450 500	30 220 088	8%
Lot4 : SELECT Corporation	88 877 250	7 348 625	8%

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Commentaire : L'analyse des dépenses de mises en œuvre au mois de Septembre 2025, fait ressortir des réalisations assez satisfaisantes par les entreprises suivantes :

- Zone 1 : DJAZZ-Junior : 16% avec un paiement cumulé de 158 074 774 CFA avec un montant de contrat initial de 987 172 623 CFA ;
- Zone 2 : GSM : 14% avec un paiement cumulé de 16 494 563 CFA contre un contrat initial de 113 828 925 ;
- Zone 3 : CACS SARL : 8% avec un paiement cumulé de 30 220 088 CFA avec un contrat initial de 391 450 500 ;
- Zone 4 : SELECT Corporation : 8% avec un paiement cumulé de 7 348 625 CFA pour un contrat de 88 877 250.

Figure 23 : Situation financière des travaux de drainage, chemins pétions et voies de proximité

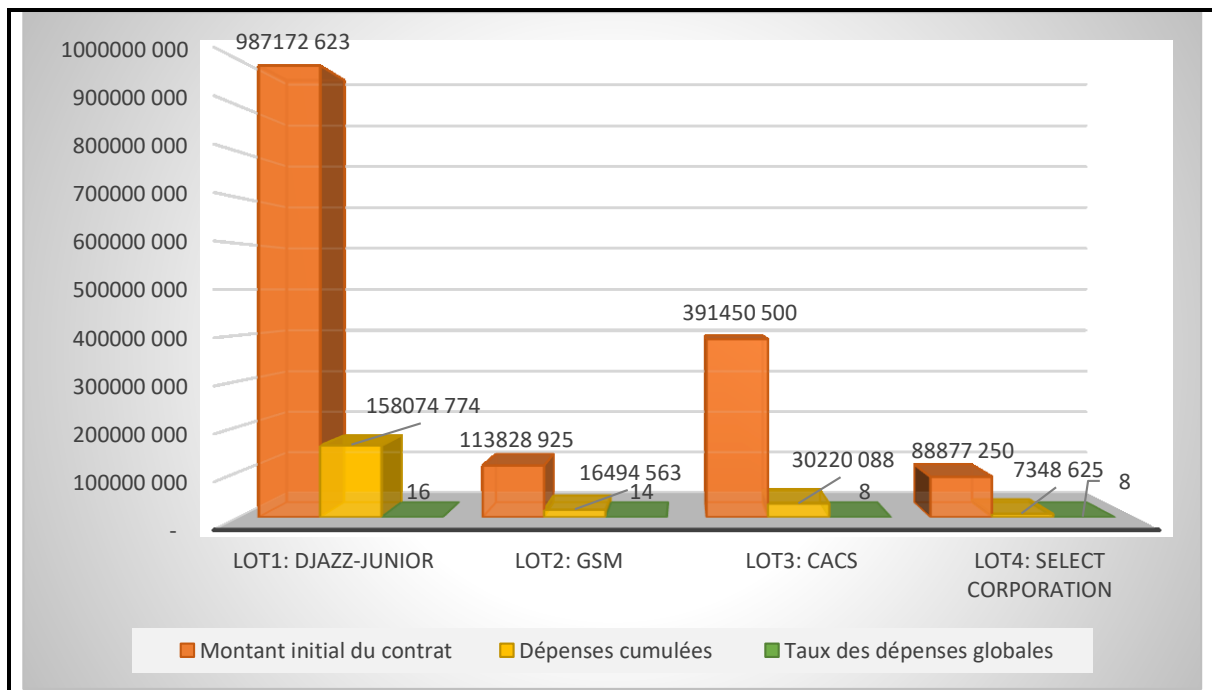

Observations : Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2, l'avancement des travaux de drainage, voirie et chemin piéton est faible dû à la suspension des travaux pour des raisons techniques liées aux types des voies et chemins piétons à réaliser. Des échanges sont en cours pour déterminer le type des voies/chemins piétons à réaliser afin de relancer les travaux des entreprises.

2.1.6. Réhabilitation de bâtiment administratif abritant l'UGP PROVIR de Berberati par l'établissement Espoir Service

Les travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de la Mairie de la ville de Berberati concernent :

- L'installation du chantier pour le stockage des matériaux ;
- La reprise partielle de la couverture par endroit selon des dégradations constatées.
- La pose des auvents sur les ouvertures ;
- Le remplacement des battants de porte et les chassis naco des fenêtres ainsi que les lame en bois ;
- La reprise partielle du plafond en contreplaqués de 5 mm ;
- La reprise de la peinture sur murs après l'application de la masticque ainsi que celle des fenêtres.

NB : Les travaux de réhabilitation de la salle de conférence de la Mairie de Berberati ont été réalisés dans sa globalité et la réception technique a été prononcée avec la participation du Comité technique local.

- **La réhabilitation des travaux a été exécutée à hauteur de 100%.**

Image photographique du bâtiment administratif de la Mairie de Berberati



C. Composante 3 : Gestion du projet

► Les contrats exécutés au niveau de la composante 3

Pour la mise en œuvre de la composante 3, les contrats de prestations ci-après ont été exécutés :

Contrats de Prestations de Services de Consultants

N°	Contrats signés	Montants du contrat
Année d'exécution des contrats en 2024		
1	CF-PIU- MIN INFRAS-429363-CS-CDS, Elaboration du manuel d'exécution du projet	8 250 000
2	PROVIR -19/S/CI/24, Elaboration de la Stratégie de Passation des Marchés pour le Développement (PPSD) et du Plan de Passation des Marchés (PPM).	20 677 000
3	Acquisition du logiciel TOMPRO.	23 123 000
4	CF-PIU- MIN INFRAS-447850-CS-CDS. Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des documents ERS/PGS et le Plan d'action VBG/EAS/HS.	7 694 500
Total des engagements		59 744 500
Etat d'exécution des contrats en 2025		
1	23 Consultants recrutés comme staff du PROVIR.	301 340 000
2	Agence ICBTP pour l'entretien des locaux du PROVIR, N°198-PROVIR.	14 400 000
3	Agence de Sécurité SENEVE SECURITY. Gardinnage des locaux du PROVIR N°197/24/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR.	4 498 200

4	Location d'un bâtiment pour l'unité de gestion du projet N°0101/24/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR	16 800 000
5	Assistante technique, CF-PIU-PROVIR-477782-CS CQSA.	6 000 000
6	Evaluation de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation (PAR) des sites de travaux des infrastructures de proximité à Berberati pour la composante 2 du PROVIR. N°06/25/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR.	4 000 000
7	Maitrise d'œuvre complet des travaux de bâtiment à usage de bureau devant abriter le siège de PROVIR. Contrat n°14 et n°15/25/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR	99 164 800
8	Contrat PROMO CONSTRUCTION au Réf. : N°05/MURFVH/DIRCAB/T/UGP-PROVIR/2025. Recrutement d'une entreprise pour des travaux spécifiques sur le site de décharge à Berberati.	123 132 478
Total des engagements		569 335 478

Source : UGP-PROVIR, 2025.

3.1. Construction des travaux spécifiques sur le site de décharge de Berberati par l'entreprise PROMO construction

La consistance des travaux spécifiques du site de décharge est :

- Le débroussaillage de la voie d'accès au site sur une dimension de 100m x 4 m ;
- Le reprofilage de la voie d'accès ;
- Le débroussaillage du site des travaux ;
- La fourniture et la pose de double cornière, de longueur de 2,50m scellé dans du béton de fondation de 50 cm x 50 cm, espacé verticalement de 2,50m ;
- Le déploiement et la fixation de deux rangées de fils de fers barbelés espacés horizontalement de 30 cm ;
- La construction d'un abri pour gardien de 4 m x 2 m en briques cuites avec toiture en tôle alu 5/10e, le sol compacté avec un dallage de 5 cm en béton de forme avec une porte et une fenêtre ;
- L'excavation de deux casiers de section planes de 50 m x 25 m et de 2,50 m de profondeur munis de rampe d'accès permettant le stockage des remblais et des déchets.

NB : Les travaux du site de décharge sont suspendus pour des échanges sur la gestion des eaux de lixiviat.

Image Photographique des travaux du site de déchet de Berberati



Source : UGP-PROVIR, 2025.

3.2. Mission de maîtrise d'œuvre complète des travaux de Construction du bâtiment à usage des bureaux devant abriter le siège de l'UGP PROVIR

Un rôle de contrôle qualité déterminant a été exercé par les études du Cabinet LUSTRE-ARCI.

a) Analyse Préliminaire des Études

- **Document Analysé :** Rapport préliminaire des études Architecturales et Techniques (reçu le 20/11/2025).
- **Conclusion :** Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations formulées.
- Date de Transmission de l'Avis : 24 Novembre 2025.

ARCI

Document Analysé : Dossier architectural d'Avant-Projet Sommaire de la construction du bâtiment du siège de PROVIR (reçu le 06/12/2025).

- **Processus** : Analyse approfondie en collaboration avec le Coordonnateur Adjoint et réunion de mise au point avec les responsables du Cabinet LUSTRE-ARCI.
- **Conclusion Ferme** : Avis NON favorable (suite aux échanges et observations écrites dans le compte rendu d'analyse de documents).
- **Conséquence** : Le Bureau d'études est tenu de reprendre l'intégralité du travail sur la base des observations formulées avant de pouvoir passer à l'étape suivante (APD : Avant-Projet Détaillé). Le projet des études du siège du projet PROVIR est actuellement à environ 30% d'avancement global, correspondant à la phase de validation de l'APS (2^{ème} version de l'APS corrigé). Cette étape marque la fin des études conceptuelles et ouvre la voie à la phase de conception détaillée (APD), sous réserve de la prise en compte des observations techniques formulées.

3.3. Les réalisations des activités des sauvegardes et des autres experts du projet programmées et réalisées en 2025

Pour l'année fiscale 2025, les activités programmées et réalisées pour les sauvegardes et les autres experts sont développées de la manière suivante :

3.3.1. Les activités prévues

- Mise en œuvre des PGES Spécifiques : (i) revue des PGES/soumis par le consultant SERF Burkina (PGES linéaire) ; (ii) prise en compte des commentaires de la Banque mondiale et demande d'ANO sur le PGES des sites linéaires à Berberati ; (iii) Validation des PGES chantiers et leurs adoptions) ;
- Mise en œuvre du PGMO ;
- Validation et Divulgence des Instruments de sauvegardes (CERC, PGES, PAR) : (i) organiser un atelier de divulgation des PGES à Berberati et les Lois nationales environnementales et sociales) ;
- Suivi environnemental deux fois par an par le Ministère en charge de l'Environnement : (Suivi de l'effectivité de la mise en œuvre du PGES par le Ministère de l'environnement) ;
- Campagne d'information et de sensibilisation sur les activités du PROVIR dans les 13 zones : (i) Information, sensibilisation sur le PROVIR et le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales) ;
- Renforcement des capacités des Parties Prenantes au Projet PROVIR (i) Renforcement de capacité des cadres de l'UGP, y compris les autorités locales, les dirigeants communautaires (CTL, CCC) et les entreprises sur le PEES, le CGES et le PGES ; ii) renforcer la capacité des points focaux de sécurité sur la gestion des risques de sécurité du PROVIR ; iii) renforcement de capacités sur la gestion des déchets solides et liquides) ;
- Elaboration du document du PGES du site linéaire ;
- Suivi environnemental et social y Compris VBG des activités mises en œuvre du Projet ;
- Actualisation du plan d'action social pour les activités priorisées pour les six mois ;

- Mise en Œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes : (mise en place et formation des Comités Locaux de Gestion des Plaintes dans les 9 zones du PROVIR à Bangui) ;
- Fonctionnement du MGP à Berberati ;
- Évaluation de la Performance et Mise à jour du PMPP ;
- Mise en Œuvre du PAR et du Suivi de l'audit du PAR : (élaboration du TDR de réalisation de l'audit du PAR et suivi de la réalisation de l'audit du PAR) ;
- Mise en Œuvre du plan d'action VBG : (i) identification et formation des points focaux VBG/EAS/HS à Bangui ; ii) sensibiliser la communauté riveraine sur les six (06) types de VBG/EAS/HS et leurs conséquences sur la santé sexuelle de reproduction ; iii) organiser une causerie éducative dans les zones sélectionnées à l'endroit des leaders communautaires, ainsi que la jeunesse sur la notion de VBG/EAS/HS) ; iv) former les ouvriers des entreprises/Bénéficiaires de la ville de Berberati sur le code de conduite et les faire signer) ;
- Mise en œuvre et suivi du MGP (NES 10) ;
- Mécanisme de Gestion des Plaintes ;
- Mise à jour de la cartographie des services de prise en charge des cas de VBG/EAS/HS.
- Fonds de sécurité et contingence ;
- Achat des extincteurs pour la sécurité du bâtiment abritant l'UGP ;
- Kits complets des véhicules y compris extincteurs ;
- Formation du personnel du projet dans le domaine de la sécurité ;
- Formation des Points focaux départementaux en charge de la sécurité ;
- Activité sécuritaire de liaison avec les points focaux ;
- Acquisition des moyens de communication (Talkie-walkie) avec les PF.

3.3.2. Les activités réalisées

3.3.2.1. Volet environnemental

- **Validation et Divulgence des Instrument de sauvegardes** : (a) les documents Cadres et spécifiques de la Gestion Environnementale et Sociale comme les CGES, PMPP, PGES, Manuel CERC et le CGES-CERC qui sont élaborés, (b) réparation des activités du fond additionnel de FEM ;
- **Mise en œuvre des PGES Spécifiques** : (a) deux (2) PGES spécifiques respectivement le PGES des sites fixes et le PGES des sites linéaires qui sont élaborés par le PROVIR et mis à disposition des quatre (4) entreprises à Berberati pour le cadrage de leurs PGES Chantier, (b) réunion de cadrage avec les entreprises sur l'élaboration du PGES chantier qui s'est tenue à Berberati, (c) le PGES des sites fixes et linéaires sont validés par la Banque y compris le PGES chantier pour la réhabilitation de bâtiment du Ministère de l'Urbanisme de la Ville et de l'Habitat de Berberati, (d) une notice d'impact environnemental pour le bureau provisoire de l'UGP/Berberati a été produite, (e) des screening de site d'emprunt, de décharge des déchets, des deux carrières, (f) le bâtiment du ministère de l'urbanisme de Berberati a été réhabilité en partie comme bureau de

l'UGP Régionale, (g) le rapport d'évaluation du bâtiment du MURFVH a été élaboré.

- **Renforcement des capacités des Parties Prenantes au Projet PROVIR :** formation du CTL et CCC à Bangui et à Berberati sur le Manuel CERC et le CGES CERC additif, y compris les dix (10) normes environnementales et sociales et leurs exigences ont été rappelées aux participant
- **Mise en œuvre du PGM O :** Suivi effectif de la mise en œuvre du PGM O ;
- **Campagne d'information et de sensibilisation sur les activités du PROVIR dans les 13 zones :** information et sensibilisation de plus de 3727 personnes de différent sexes et âges sur le PROVIR et les Cahier des Clauses Environnementales et Sociale aux nouvelles entreprises et les concessionnaires.
- **Suivi environnemental deux fois par an par le Ministère en charge de l'Environnement** tenu qu'une seul fois à Berberati ;
- **Suivi environnemental et social y Compris VBG des activités mises en œuvre du Projet** réalisés.

► **Activités non démarrées**

- Non réalisation des activités de l'EIES/PGES, le PAR des infrastructures structurantes à Bangui et EIES/PAR des infrastructures de proximité à Berberati ainsi que la formation sur les Lois environnementales et sociales ainsi que la Gestion des déchets solides et liquides

3.3.2.2. Volet social (CPR, PGM O, PAR, PMPP)

- **Mise en Œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes :** avec l'indemnisation de 146 PAPs dans le cadre de la mise en œuvre du PAR des travaux de proximités à Berberati, après résolution de 12 plaintes enregistrées ;
- **Evaluation de la Performance et Mise à jour du PMPP :** (a) mise à jour du PMPP à Bangui et Berberati dans le cadre du FA du FEM, (b) suivi de la réalisation de 11 activités dans le cadre de PMPP suite à laquelle 594 participants ont été formés/informés et sensibilisés (355 hommes soit 59,76% et 239 femmes soit 40,24%) ;
- **Mise en Œuvre et Suivi :** effectif de l'audit du PAR à Berberati.

► **Activités non démarrées**

- Actualisation du plan d'action social pour les activités priorisées pour les six mois et la mise en œuvre de MGP à Bangui.

3.3.2.3. Volet VBG (PA/VBG-EAS/HS)

- **Mise en Œuvres du plan d'action VBG :** (a) Sensibilisation de la communauté riveraine sur la VGB/EAS/HS et leurs conséquences sur la santé sexuelle de reproduction à Berberati, (b) signature des conventions de partenariat avec des structures de prise en charge des VBG/EAS/HS à Berberati, (c) vulgarisation du plan d'action VGB à l'endroit des partie prenantes à Berberati à travers une

formation, formation du personnel/Entreprise sur le code de bonne conduite, (d) formation des bénéficiaires (manœuvres) du projet à Berberati et la confection de la boîte à images pour faciliter la compréhension au sein de la communauté, (e) causerie éducative avec les leaders communautaires et les représentants de la jeunesse sur le volet Information-Education-Communication à Berberati ;

- **Mise en œuvre et suivi du MGP (NES 10) :** via l'identification, mise en place et formation des points focaux VBG/EAS/HS à Berberati ;
- **Mise en œuvre du mécanisme de Gestion des Plaintes :** à travers la mise en place d'une ligne verte au numéro 1319 du projet pour la gestion des plaintes.

► Activités non démarrées


- Mise en place des CLGP, et l'identification des points focaux VBG/EAS/HS dans les neuf zones de Bangui ;
- Mise à jour de la cartographie des structures de prise en charge des cas de VBG/EAS/HS.

Tableau n° 21 : Gestion des plaintes du projet en 2025

Cas de la gestion des plaintes	Plaintes resensés	Plaintes résolues
Plaintes liées aux travailleurs - ESE	9	5
Plaintes liées au PAP-PAR - SSS	12	12
Plaintes liées au VGB/EAS/HS	3	3
Total général	24	20

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Figure 24 : Cas de gestion des plaintes du projet

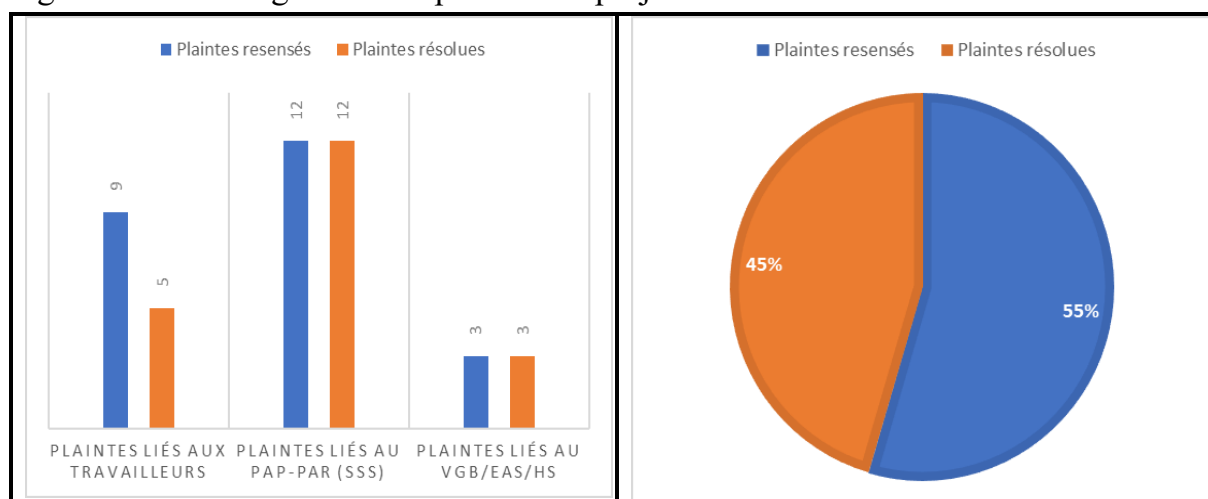

Commentaire :

Analyse des deux graphiques nous montre que sur les (24) plaintes enregistrées dont (4) non résolues, (20) traitées et résolues avec succès parmi lesquels Une (1) plainte sensible dans le domaine de VBG résolue, douze (12) plaintes non sensibles liées au PAR à Berberati et (5) plaintes liées aux travailleurs dont Une (1) plainte ordinaire liées à un enfant mineur maltraité par son grand-père dans la zone du projet. Ceci dit, c'est une plainte non liée au projet, ni le grand père, ni l'enfant travaillent pour le compte du projet. Plainte orientée à la justice pour le droit de l'enfance mineur (Plainte clôturée pour l'UGP).

Ainsi, la répartition de ces plaintes enregistrées et traitées par l'équipe des sauvegardes est répartie comme suit :


- Neuf (9) plaintes enregistrées, dont seulement cinq (5) plaintes ont été résolues et clôturées avec satisfaction par le CLGP et les quatre (4) autres plaintes non traitées sont dus en attentes de la réaction de l'UGP/BANGUI et la Banque (plainte pour la construction de passerelle reliant le quartier et l'école) ; pour la réponse à l'arrêt de travail de l'entreprise SGM (planification d'une réunion encours par l'UGP/régionale ; pour la régularisation de salaire d'un ouvrier de MOUS (disposition encours), pour la mise en place par la MOUS d'un cadre de concertation non opérationnel (en attente de la réponse de la MOUS) liés aux activités de sauvegarde environnementale (ESE) ;
- Douze (12) plaintes enregistrées et résolues par la sauvegarde sociale (ESS) ;
- Trois (3) plaintes enregistrées et résolues par la sauvegarde (VBG/EAS/HS).

Tableau n° 22 : Documents cadres et spécifiques des sauvegardes

Documents cadres et spécifiques des sauvegardes	SSE	SSS	VBG
CGES, CGES-CERC, MANUEL-CERC, PGES-PROJET, PGES-CHANTIER, PMPP, PEES, SUIVI-CHANTIER	8	1	1
CPR, PAR, PMPP, PGMO, MGP	-	5	-
PA-VGB/EAS/HS, PMPP, MGP (Canaux de Signalement et Circuit de Référencement	-	-	3

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Figure 25 : Documents cadres et spécifiques élaborés et validés du projet

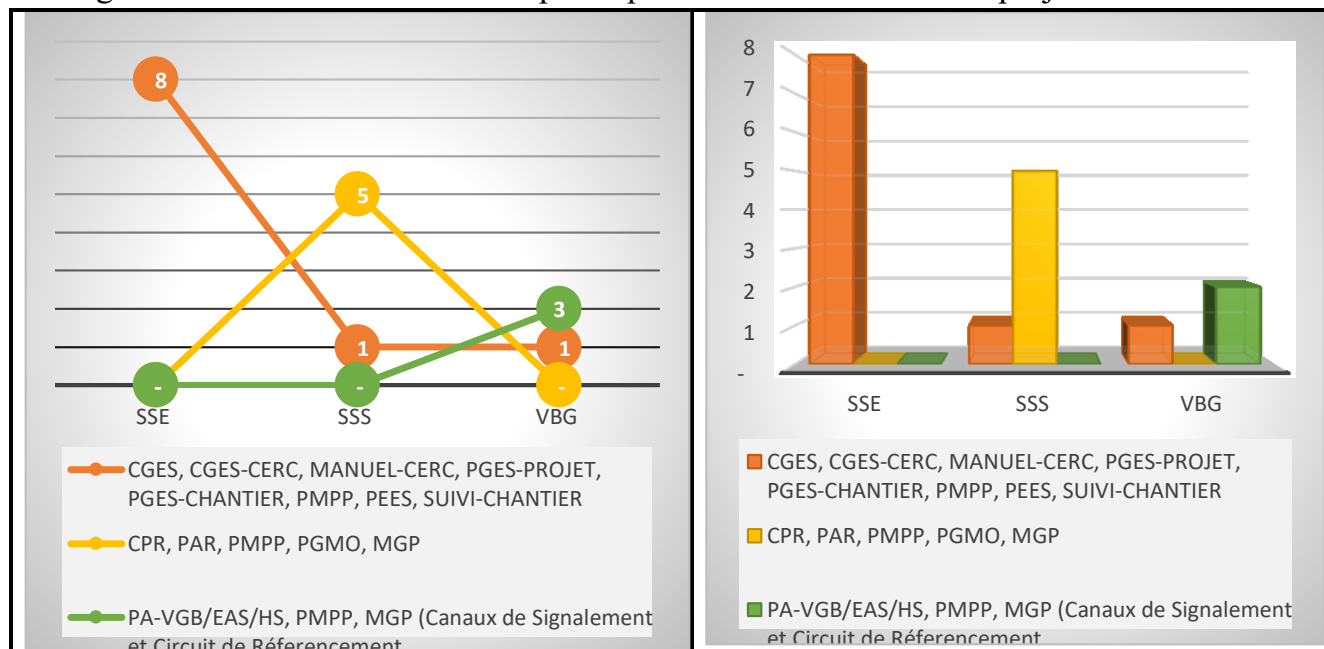

Commentaire :

Les deux (2) graphiques légendés en différentes couleurs présentent la situation des documents cadres et spécifiques élaborés par l'équipe des sauvegardes du projet et sont interprétés comme suit :

- couleur orange est lié aux activités de sauvegarde environnementale (ESE) avec plus de **(8 documents cadres et spécifiques élaborés)** contribuant efficacement du point de vue macro et constituant un levier pertinent dans la mise en œuvre du projet ;
- couleur jaune-forcé à trait aux activités de sauvegarde sociale (ESS) avec **(5 documents spécifiques élaborés)**. Celle-ci est la base du lancement des activités globales au projet surtout avec l'identification de PAP et la réalisation de PAR qui donne lieu au démarrage des travaux dans les zones d'exécution dudit projet ;
- couleur verte **(3 documents spécifiques élaborés)** concerne les activités de la Violence Basé sur le Genre (VBG/EAS/HS) ayant permis de minimiser les risques liés aux violences dans les zones d'intervention du projet en mettant en place les mesures de préventions et de réponses. Ce volet détient l'épée Damoclès pour la fermeture du projet durant sa mise en œuvre.

3.3.2.4. Volet Gestion des Risques de Sécurité

- Installation de 09 extincteurs pour la sécurité des bâtiments de l'UGP Centrale (7) et l'UGP locale de Berberati (2) ;
- Renforcement des capacités du personnel de l'UGP centrale ;

- Formation des Cadres des entreprises adjudicataires des marchés des travaux de proximités de Berberati sur la gestion des risques de sécurité sur les chantiers ;
- Identification, mise en place, formation et dotation (moyens de communication) des points focaux de sécurité de Berberati ;
- Acquisition de moyen de communication (téléphone) aux Points Focaux, installation des traceurs GPS sur les véhicules ;
- Identification, mise en place, formation et dotation (moyens de communication) des points focaux de sécurité à Bangui suivi de l'élaboration d'une Procédure Opérationnelle Standard (SOP) pour la sécurité des déplacements.

3.3.2.5. Volet communication

- **Élaboration de la stratégie de communication** : (i) diagnostic des besoins en communication dans les villes cibles Bangui et Berberati (enquête, entretiens avec les parties prenantes locales, rédaction et validation de la stratégie de communication 2025-2026) ;
- **Production de supports de communication** : Création de l'identité visuelle du projet (déclinaison du logotype en plusieurs formats et tailles) ; (i) rédaction de la charte graphique ; (ii) conception et impression de brochure de présentation du projet (format dépliant et langue Française)) ; (iii) banderoles d'information en soutien aux activités des experts en sauvegardes sociales ; (iv) affiches de présentation des ouvrages du projet pour un engagement communautaire ; (v) affiche 12 m2 ; (vi) kakemonos-Roll up de présentation du projet ;
- **Activités médiatiques et digitales** : Lancement de la page Facebook « Provir RCA » (+ 200 abonnés à fin juin) ; (i) conception en cours du site web du projet ; (ii) diffusion de communiqués de presse ; (iii) réalisation de reportages télévisés diffusés sur la page Facebook ;
- **Organisation d'événements et mobilisation communautaire** : (i) Soutien à l'organisation des ateliers participatifs avec les Comités Techniques Locaux et Comité de Coordination Communautaire ; (ii) réunion de sensibilisation avec les autorités locales et les parties prenantes de Berberati ; (iii) réunion de sensibilisation avec les personnes affectées par le projet à Berberati ; (iv) production et diffusion d'un morceau musical tradi moderne dans les communautés.
- **Édition et production de deux (2) magazines du projet « PROVIR Mag ».**

3.3.2.6. Volet Architecte Urbanisme

- **Etudes architectural de Bangui** : (i) Examen des dossiers des neuf (09) zones et production d'un document récapitulant les observations et manquements à corriger (au-delà de ceux de la Banque) ; (ii) Collaboration étroite avec l'équipe de TechniPlan pour : Reprendre les plans d'états des lieux de chaque site, Réviser et redimensionner certains ouvrages pour l'adaptation au terrain, intégrer l'ensemble des observations et les travaux achevés et en attente de validation pour la Zone 1, Zone 2 et Zone 4.
- **Travaux (Infrastructures et Aménagements Spécifiques) et études de Berberati** : (i) Aménagement du Rond-Point Central (Voirie et Drainage) Prise

en compte des observations (Banque et PROVIR), et production d'un nouveau devis intégrant les modifications ; (ii) Centre de Santé de Poto-Poto : Proposition de Modification du Hangar jugé satisfaisant avec la sauvegarde de l'investissement en cours de construction tout en intégrant les observations du Ministère de la Santé).

- **Projet de construction du Siège du PROVIR** : (i) Analyse Préliminaire des Études avec avis jugé favorable sous réserve de la prise en compte des observations formulées ; (ii) Analyse de l'Avant-Projet Sommaire (APS) produit par le cabinet LUSTRE ARCI avec un avis NON favorable (suite aux échanges et observations écrites dans le compte rendu d'analyse de documents). Le Bureau d'études est tenu de reprendre l'intégralité du travail sur la base des observations formulées avant de pouvoir passer à l'étape suivante (APD : Avant-Projet Détaillé).
- **Autres Contributions et Gouvernance** : (i) Réunions Stratégiques de participation active à divers groupes de travail (UGP, Bureaux d'études, prestataires) et aux réunions avec l'équipe de gestion du projet à Washington pour l'avancement global du PROVIR ; (ii) Gouvernance du projet de participation à la réunion du Comité de Pilotage et à la validation du Plan de Travail et de Budget Annuel (PTBA) tenue le 21 novembre 2025.

3.3.2.7. Volet Système d'Information Géographique

- **Revisitation des sites et formation au formulaire Kobo toolbox** : Sites revisités et géolocalisés ; équipe technique formée (voir cartes en annexes). La formation a permis d'avoir les informations réelles sur l'état d'avancement des travaux sur le terrain, rendant les informations plus fiables et accélérant la prise de décision pour le suivi.
- **Préparation du tableau de bord de suivi à distance** : Tableau de bord opérationnel sur Power BI, facilitant le suivi en temps réel et la transparence dans la gestion du projet.
- **Revue des linéaires et vérification des traçons** : Linéaires vérifiés ; nouvelle étude lancée pour garantir la cohérence des interventions (voir cartes en annexe).
- **Conception de la carte sur les 7 km depuis la Cathédrale Notre-Dame de Bangui** : Carte produite, permettant d'orienter les interventions et de cibler les zones prioritaires (voir en annexe).
- **Analyse et commentaire des cartes étudiées** : Carte annotée et partagée, facilitant la communication des résultats des études et la prise de décision collective entre l'UGP et le bureau d'étude.

IV. SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2025

Du point de vue flux financier en ce qui concerne le Tableau Ressource Emploi (TRE) du projet, ce dernier progresse favorablement sur les opérations courantes (Composantes 2-3 : 48-56 %), mais les études et investissements structurants (Composante 1 : 11 %) freinent les objectifs globaux. Un focus prioritaire sur le déblocage des dossiers APS/APD est planifié pour atteindre >60 % de décaissement fin 2026.

Conformément aux informations du Tableau des Ressources et Emplois (Modèle III) pour l'exercice 2025, le PROVIR présente un exercice globalement satisfaisant avec une bonne mobilisation des ressources IDA et une utilisation progressive des fonds.

Au 31 décembre 2025, le total des ressources mobilisées s'élève à 5 283 150 819 XAF, dont l'ensemble provient des concours IDA (avance initiale et DRF). Les dépenses cumulées atteignent 3 432 881 473 XAF, soit un taux d'exécution d'environ 65%, avec un solde net disponible de 1 850 269 346 XAF, signe d'un reste-à-engager suffisant pour les prochaines étapes.

La structure des dépenses confirme la priorité accordée aux infrastructures et services de base dans les quartiers (environ 49% du total), suivie de la composante « Gestion du projet » (environ 37%), puis des investissements de réduction des risques d'inondation (environ 14%). Aucune dépense n'a encore été engagée sur la composante « Interventions d'urgence conditionnelles », cohérent avec son caractère de réserve.


D'un point de vue de trésorerie, le solde net à la clôture se retrouve principalement sur le compte BGFI BANK PROVIR IDA (1 832 915 459 XAF), avec une légère évolution des avances à justifier (passant de 10 659 700 XAF à 12 678 200 XAF), ce qui implique une vigilance sur la justification des crédits décaissés dans les prochains mois.

Ainsi, les détails des analyses et commentaires des différents tableaux liés aux prévisions et les dépenses effectués par composante sont présentées comme suit :

Données financière clés du projet		
1	(%) Taux de décaissement	12,6%
2	(%) Taux d'engagement	22%
3	Montant approuvé	40 950 000 000 FCFA
4	Montant Décaissé	5 138 188 040 FCFA
5	Montant Non Décaissé	35 811 811 960 FCFA

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Figure 26 : Taux de décaissement et d'engagement

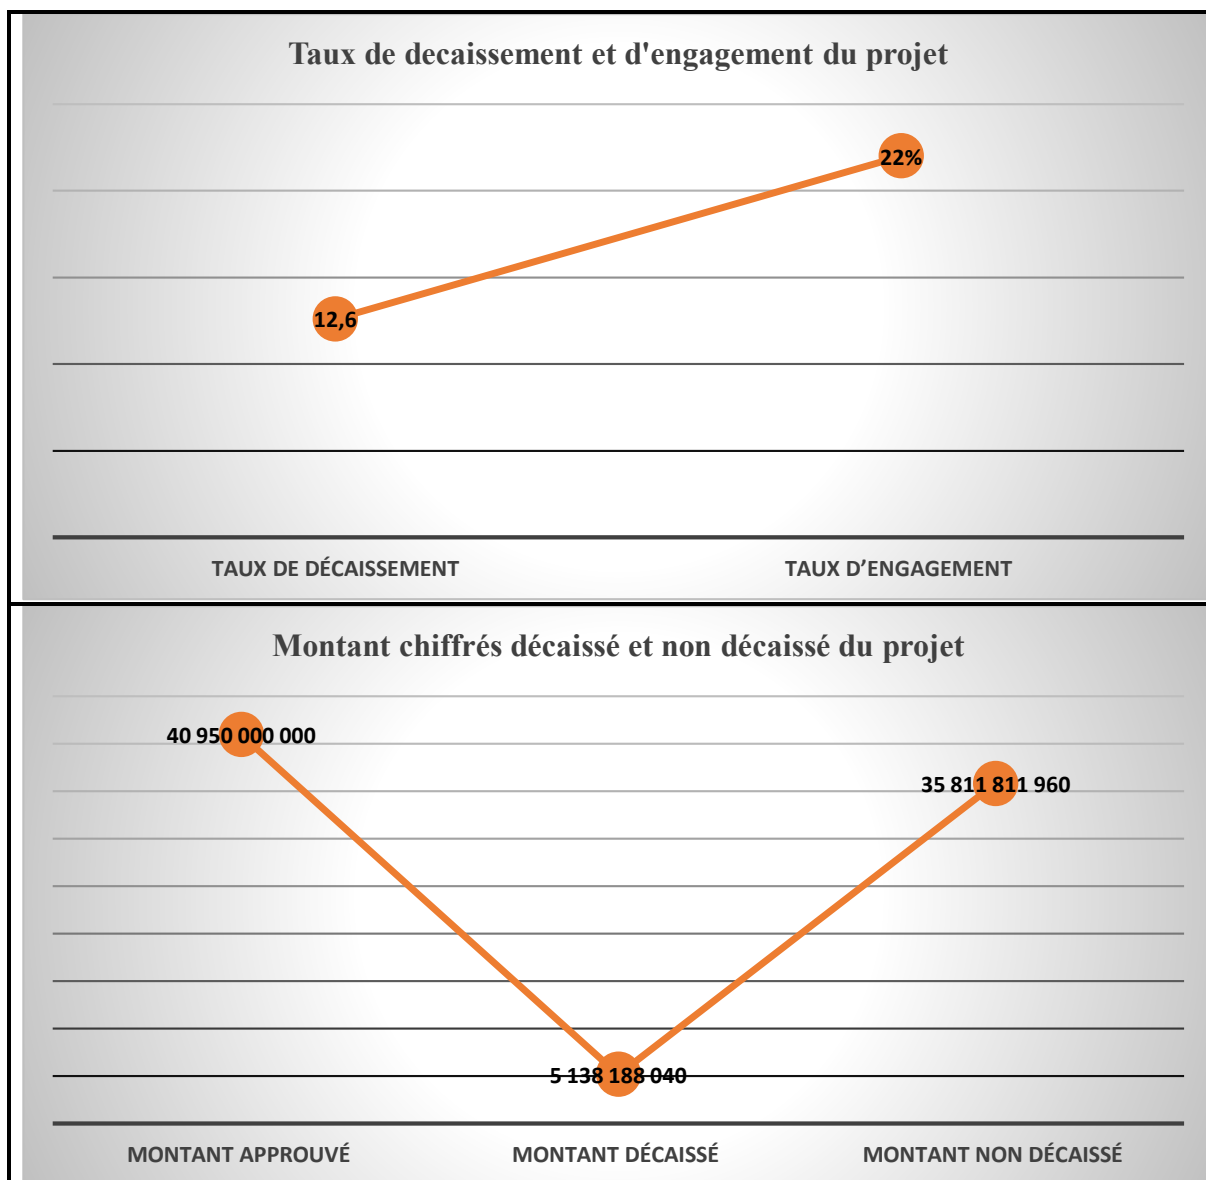

4.1. Rappel de la situation d'exécution financière du projet au 31/12/2024

Les dépenses effectuées de 2023 à 2024, s'élève à un montant de 570 197 842 Franc CFA contre une prévision globale du PPA de 600 000 000 Franc CFA, soit un taux d'exécution financière de 95,03% au 31 décembre 2024.

Tableau n° 23 : Dépenses effectués sur le PPA du Projet de 2023 à 2024

N°	Activités	Budget prévisionnel 2023-2024	Total des dépenses annuelles 2023-2024
1	Composante 1 : Investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base à l'échelle de la ville	600 000 000	75 955 058
2	Composante 2 : Infrastructure de quartier et services de base		22 310 409
3	Composante 3 : Gestion de projet		471 932 375
4	Composante 4 : Interventions d'urgence en cas d'urgence		0
TOTAL GENERAL			570 197 842
Taux d'exécution			95,03%

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Commentaire :

Les dépenses réalisées de 2023 à 2024 sont commentées de la manière suivante :

- **Composante 1 (SERF BURKINA pour APD) :** Les décaissements totalisaient le FCFA de 41 084 676 en 2023 et le FCFA de 34 870 382 en 2024 dans le cadre du contrat SERF BURKINA relatif à l'avant-projet Détaillée (APD). Ces fonds soutenaient des activités spécifiques à chaque projet lié à cet entrepreneur.
- **Composante 2 (TECHNIPLAN pour APS) :** Pour 2024, le FCFA a été déboursé dans le cadre du contrat TECHNIPLAN pour l'étude préliminaire du projet (APS). Cette allocation s'est concentrée sur la planification et les travaux préparatoires pour la composante.
- **Composante 3 (Fonctionnement et Fournisseurs) :** Les dépenses ont atteint le FCFA de 237 349 084 en 2023 et le FCFA 234 583 290 en 2024, couvrant principalement les coûts opérationnels, les paiements aux fournisseurs de biens et services, ainsi que les missions UGP à Berberati pour les activités PROVIR. Ces dépenses reflètent l'exécution continue du projet en fonctionnement et le soutien sur le terrain.

Résumé des décaissements

Composante	2023 (FCFA)	2024 (FCFA)	Contrat Principal
C1	41 084 676	34 870 382	SERF BURKINA (APD)
C2	-	22 310 409	TECHNIPLAN (APS)
C3	237 349 084	234 583 290	Fonctionnement/PROVIR


Dépenses financières en chiffre du projet effectuées par trimestre

	1 ^{er} T	2 ^{ème} T	3 ^{ème} T	4 ^{ème} T
Composante 1	0	32 038 880	112 554 152	46 720 377
Composante 2	204 610 686	438 189 833	776 440 004	451 244 960
Composante 3	158 657 980	183 343 010	208 370 582	248 726 897
Composante 4	0	0	0	0

Evolution du taux d'exécution financières du projet par trimestre

Libellées	1 ^{er} T	2 ^{ème} T	3 ^{ème} T	4 ^{ème} T
Taux d'exécution financières	115%	31%	63,67%	25,85%

Figure 27 : Evolution de la gestion financière en pourcentage et en chiffre par trimestre

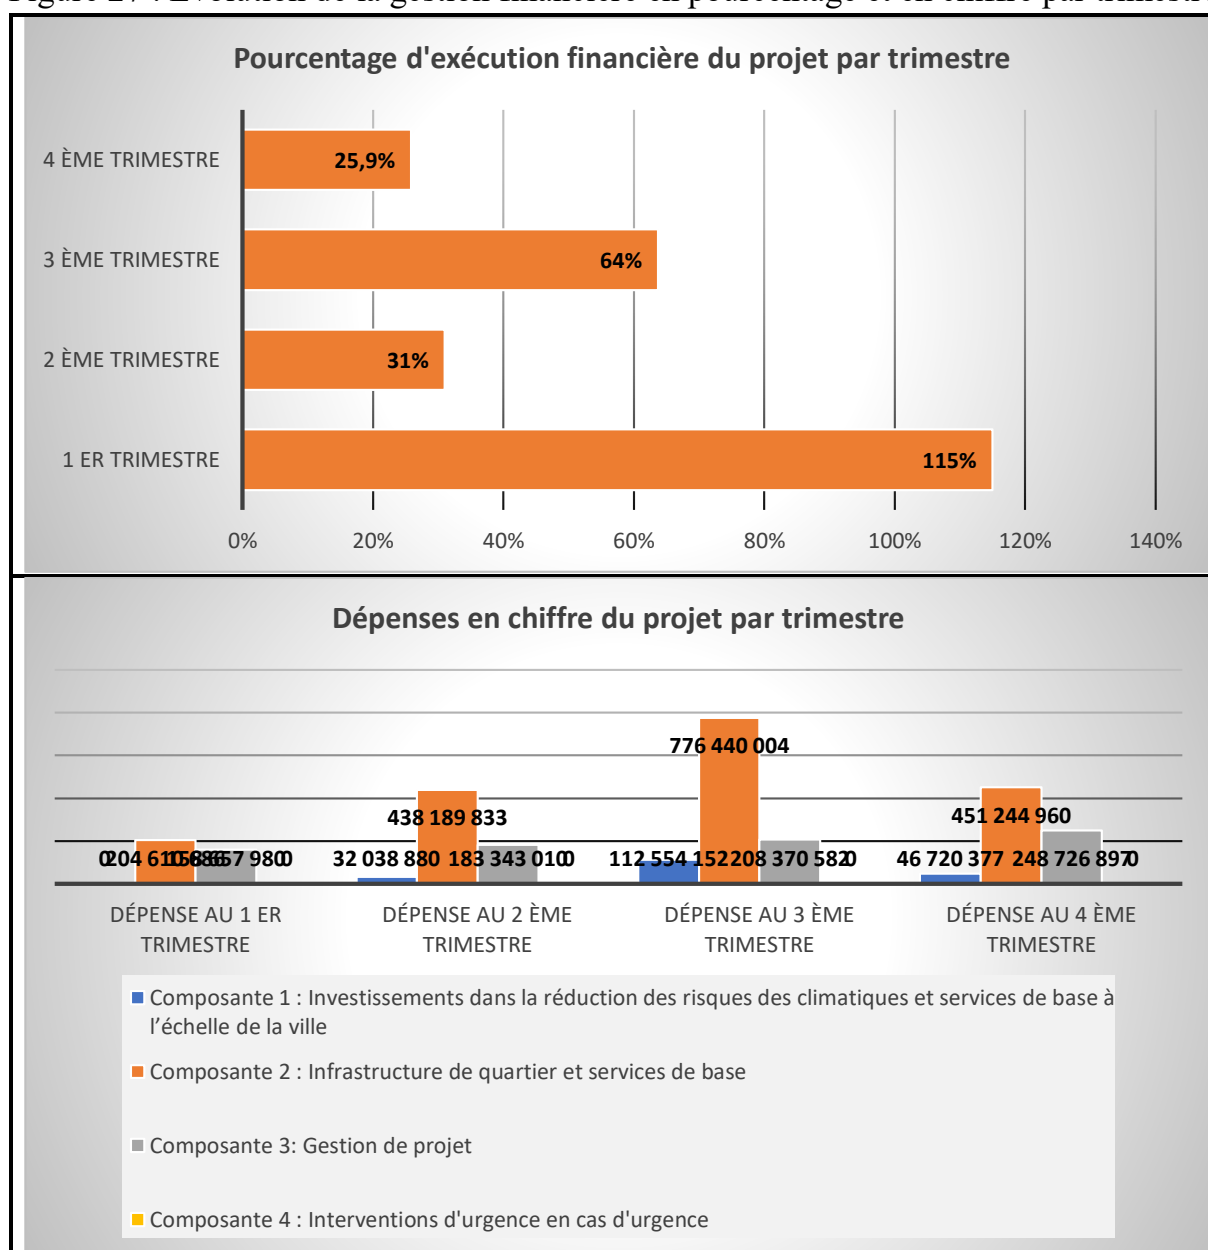

Les deux (2) figures représentées ci-haut présentent l'évolution de situation financière du projet sur les quatre (4) trimestre de l'année 2025.

Au premier trimestre 2025, on constate un dépassement du taux d'exécution financière à hauteur de 115% dû au paiement de deux (2) factures de 2024 en souffrance pour insuffisance de trésorerie d'une part et d'autre part par non prise en compte dans la prévision budgétaire de 2025, pour chuter au 2^{ème} trimestre à 31% dû à une politique de restriction des dépenses afin de corriger le dépassement de 15% obtenus au 1^{er} trimestre, tandis qu'au 3^{ème} trimestre de la même année ce taux a connu une augmentation passant de 31% à 64% dû aux recrutements des entreprises pour les travaux de proximité de Berberati, pour enfin rechuter au 4^{ème} trimestre à 25,85% avec la clôture des activités en ce fin de trimestre 2025.

4.2. Situation d'exécution budgétaire du projet au 31 décembre 2025

Les dépenses cumulées du projet liquidé, s'élève à un montant de 2 908 834 326 Franc CFA contre une prévision globale du PTBA sur une année de 7 650 968 791 Franc CFA, soit un taux d'exécution budgétaire du projet de 38,5% au 31 décembre 2025.

Tableau n° 24 : Situation d'exécution budgétaire du projet au 31 décembre 2025

N°	Activités	Budget annuel du projet 2025 (PTBA)	Dépenses du budget annuel	Taux d'exécution Budgetaire	Solde 2025
1	Composante 1 : Investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base à l'échelle de la ville	2 402 130 784	271 835 546	11,3%	2 130 295 238
2	Composante 2 : Infrastructure de quartier et services de base	3 760 330 122	1 819 637 538	48,4%	1 940 692 584
3	Composante 3: Gestion de projet	1 112 474 873	814 861 242	73,2%	297 613 631
4	Composante 4 : Interventions d'urgence en cas d'urgence	0	0	0	0
5	Imprévu	376 033 012	39 618 022	11%	336 414 990
TOTAL GENERAL		7 650 968 791	2 908 834 326	38,5%	4 742 134 465

Sources : UGP-PROVIR, 2025.

Synoptique de la situation budgétaire du projet

Budget annuel du projet 2025 (PTBA)	Dépenses du budget annuel	Taux d'exécution Budgétaire
7 650 968 791	2 908 834 326	38,5%

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Figure 28 : Situation d'exécution budgétaire du projet


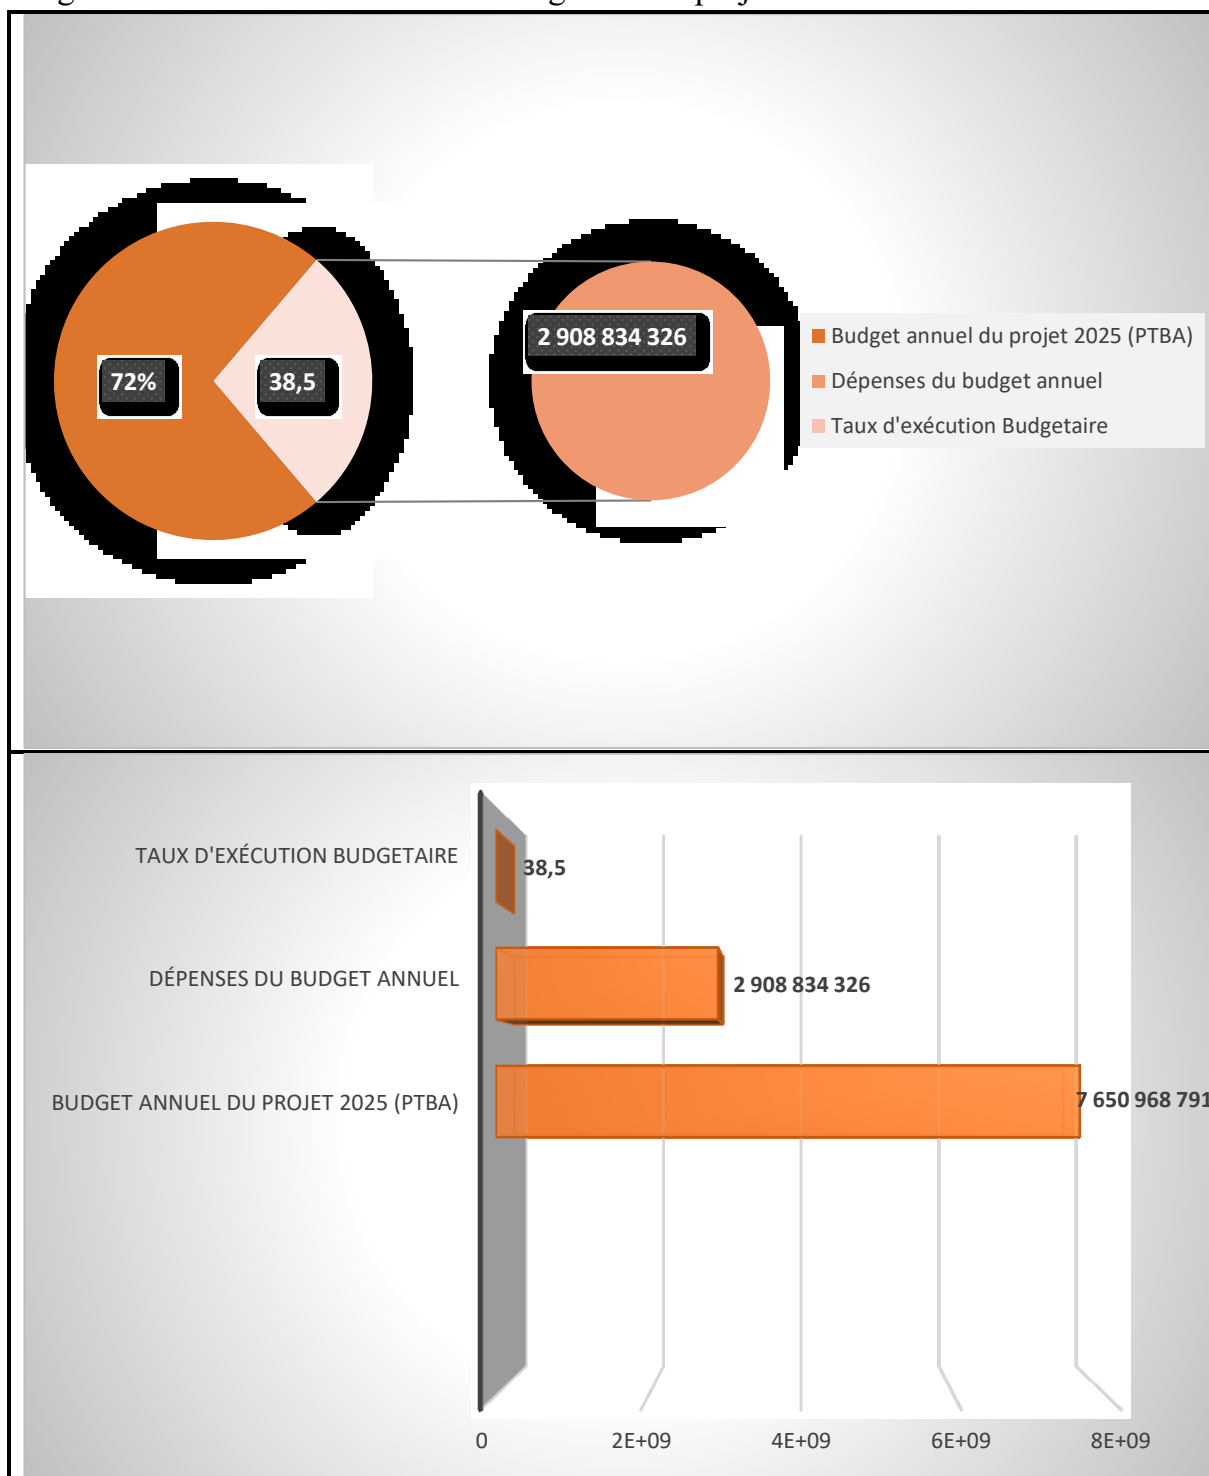


Figure 29 : Situation budgétaire du projet par composante

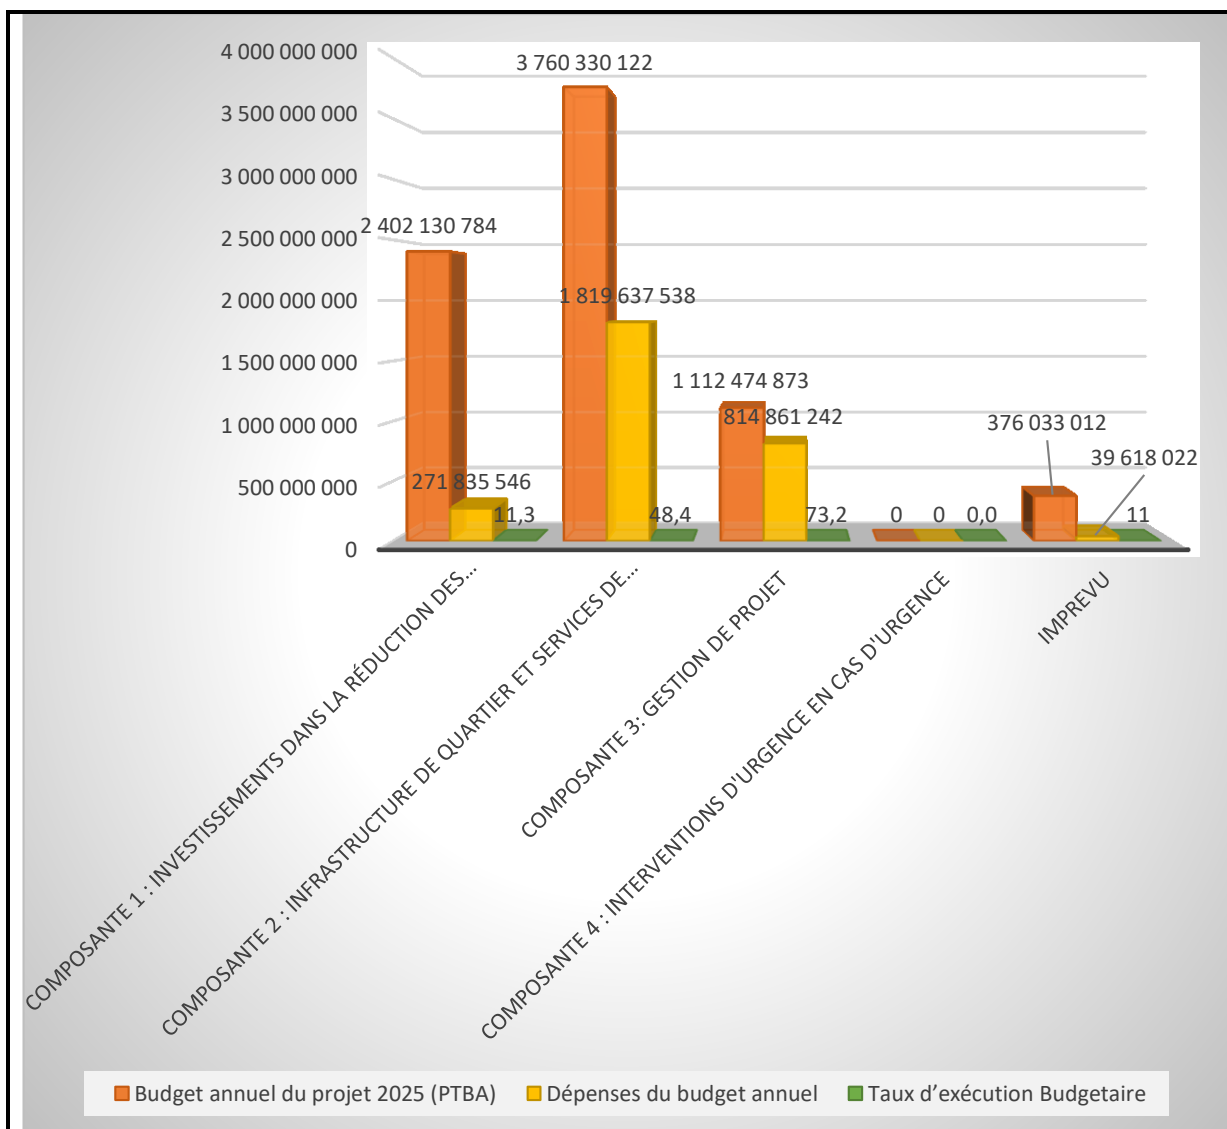

Commentaire :

- **Composante 1 : Investissements dans la réduction des risques climatiques et services de base (11,3%)**

Cette composante montre un faible taux global malgré un décaissement cumulé de 271,8 millions FCFA. Les sous-activités d'études (1.2 à 1.4) sont à 0%, indiquant des retards dans les phases préparatoires. Seule la Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS, 1,5) performe bien à 79%. L'appui institutionnel (1,2) est quasi nul (1%). Recommandation : Prioriser les études bloquantes pour débloquer les investissements structurants à Bangui et Berberati.

- **Composante 2 : Infrastructure de quartier et services de base (48,4%)**

Meilleure performance avec 1,82 milliard FCFA décaissés, tirée par les travaux de voirie/drainage à Berberati (2,8,8, 83%) et bâtiments publics (2,6, 183% – dépassement positif). Les lots à Bangui (2,7, 2,9) et autres études sont à 0%. MOUS (2,1) à 29 %. Point fort : Exécution rapide des infrastructures prioritaires. Recommandation : Accélérer les lots Bangui pour équilibrer les zones.

- **Composante 3 : Gestion de projet (73,2%)**

Solide à 814,9 millions FCFA, avec des ressources humaines à 81 % (quasi-total pour la plupart des postes, sauf Suivi-Evaluation à #DIV/0 !). Frais de fonctionnement à 71 %, matériaux à 58 %. Sauvegardes environnementales/sociales/VBG dépassent souvent (103-209 %). Point fort : Staff et opérations bien gérés. Risque : Secteurs Suivi-Evaluation et urgences vides. Recommandation : Compléter les contrats pour éviter les DIV/0 ! Audits ET.

- **Composante 4 : Interventions d'urgence (0%)**

Aucune activité ni décaissement (#DIV/0 !). Recommandation : Prévoir un plan d'activation rapide en cas de crise climatique.

- **Imprévu 10 % et Total général (11%)**

Imprévu à 11% (39,6 millions), soutenable. Globalement, 2,91 milliards FCFA décaissés sur 7,65 milliards prévus – progression inégale, forte en Composante 2/3, faible en 1/4. Affluence positive en fin d'année (octobre-décembre : 749 millions).

4.3. Situation du contrôle interne au 31 décembre 2025

Le présent rapport de la situation annuelle de l'audit interne du projet en 2025 et sont énumérées comme suit :

Activités réalisées :

- Publication d'un rapport d'audit interne couvrant le 1^{er} trimestre 2025 ;
- Publication d'un rapport d'audit interne couvrant le 2^{ème} trimestre 2025 ;
- Publication d'un rapport d'audit interne couvrant le 3^{ème} trimestre 2025 ;
- Un rapport d'audit opérationnel sur les activités réalisées à Berberati ;
- Diverses notes d'audit ponctuel à l'attention du Coordonnateur national de PROVIR ;
- Elaboration et vulgarisation des outils de gestion des actifs non monétaire ;
- Révision des manuels du projet suite au financement additionnel FEM ;
- Elaboration de la cartographie des risques du projet 2026 ;
- Elaboration du plan d'action annuel des activités de l'audit interne 2026.

Activité en cours :

- Appui aux travaux de fin d'exercice 2025 ;
- Préparation de la mission d'audit interne du 4^{ème} trimestre 2025.

4.4. Synthèse d'évaluation des principales réalisations du projet au 31 décembre 2025

Cette analyse permet de faire une brève synthèse d'évaluation des principaux résultats atteints au 31 décembre 2025, ces réalisations synthétiques sont ainsi présentées :

1 USD = 585 franc CFA

Tableau n° 25 : Synthèse des principales réalisations financière du projet au 31/12/2025					
Composante 1. Investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base à l'échelle de la ville					
Libellés	Montant initial USD	Montant initial FCFA	Dépenses annuelles	% réalisée	Ecart
Sous-composante 1.1. Infrastructure pour la réduction des Risque d'Inondation et d'Erosion	40 000 000	23 400 000 000	266 315 546	1,14%	23 133 684 454
Sous-composante 1.2. Appui Institutionnel à la Planification Intégrée des risques Climatiques et à la Gestion Urbaine	5 000 000	2 925 000 000	5 520 000	0,19%	2 919 480 000
Sous total	45 000 000	26 325 000 000	271 835 546	1,03%	26 053 164 454
Composante 2. Infrastructures et services de base dans les quartiers					
Infrastructures de quartier	20 000 000	11 700 000 000	1 819 637 538	15,55%	9 880 362 462
Composante 3: Gestion du projet					
Unité de Gestion du Projet	5 000 000	2 925 000 000	814 861 242	27,86%	2 110 138 758
Composante 4 : Interventions d'urgence en cas d'urgence					
Cas d'urgence	0	0	0	0%	0

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Principaux résultats d'évaluation des activités du projet atteint au 31/12/2025	
Projet : Projet des Villes Inclusives et Résilientes (PROVIR)	
Ministère Fiduciaire : Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale	
Ministère de Tutelle : Ministère de l'Urbanisme de la Ville et de l'Habitat (MURFVH)	
Autres ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet : 1. Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération Internationale ; 2. Ministre l'Environnement et du Développement Durable ; 3. Ministère des Eaux et Forêts Chasse et Pêche ; 4. Ministère de l'Equipeement des Travaux Publics ; 5. Mairies de la Ville de Bangui et de Berberati.	
Objectif global du projet : L'objectif de développement du projet est d'améliorer l'accès aux infrastructures résiliente au changement climatique et aux services de base dans les villes sélectionnées.	
Zones d'intervention : Ville de Bangui et la ville de Berberati	
Date approbation: 7 Octobre 2024	Date de clôture: 29 Aout 2029
Montant initial du projet : 70 000 000 USD	Montant décaissé : 5 138 188 040 milliards USD
Fonds additionnel du FEM : 9 175 000 USD	
Montant total du financement : 79 175 000 UDS	Montant non décaissé : milliards 35 811 811 960 USD
Taux de décaissement global du projet : 12,6% Taux d'engagement global du projet : 22%	
Situation budgétaire du projet au 31 décembre 2025 Montant du PTBA de 2025 : 7 650 968 791 milliards de francs CFA Taux d'exécution budgétaire annuel du projet : 38,5% Taux d'engagement annuel de la passation des marchés : 74,12% Taux de réalisation des activités annuelle du PTBA 2025 : 57,89%	
Composante 1. Investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base à l'échelle de la ville	
Sous-composante 1.1. Infrastructure pour la réduction des Risque d'Inondation et d'Erosion	► Contrat de SERF BURKINA (documents cadres et documents spécifique) : 45% de réalisation Les documents cadres ci-dessous ont été élaborées : - Cadre de gestion environnemental et social (CGES) ; - Cadre de la politique de réinstallation (CPR) ; - Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) y compris le manuel de gestion des plaintes (MGP). ► Cabinet SGI : 35% de réalisation - Études APS de Bangui et Berberati déjà disponibles pour les travaux structurants.
Sous-composante 1.2. Appui Institutionnel à la Planification Intégrée des risques Climatiques et à la Gestion Urbaine	► Création du site Web du Ministère de l'Urbanisme, de la Réforme Foncière, des Villes et de l'Habitat (MURFVH) avec 1 an d'abonnement en lien suivant : 100% de réalisation - https://www.minurbanisme-rca.org/.

Composante 2. Infrastructures et services de base dans les quartiers

► Cabinet SERF BURKINA :

Dans le cadre de la composante 2, les documents spécifiques suivant ont été élaborés :

- (i) Plan de gestion de la main d'œuvre (PGMO) ; (ii) Plan de gestion Environnementale et sociale (PGES) des sites fixes et linéaires ; (iii) Plan d'action pour la réinstallation (PAR).

► TECHNIQUE PLAN : 46,25%

L'étude des travaux d'équipements socio-collectifs et d'aménagement des quartiers dans les zones prioritaires mené dans les deux (2) villes sont les suivantes :

Bangui :

- Études APS de Bangui disponibles.

Berberati :


- (i) Études APS ; (ii) Études APD ; (iii) DAO ; (iv) les travaux pour les travaux des infrastructures et le ; (iv) Contrôle de surveillance est toujours en cours pour les travaux pour l'entreprise WADEYA SERVICE y compris les travaux de drainage et voie d'accès et chemins piétons à Berberati.

► Fondation Joseph Worher de la structure Lazarienne (FJWSL) pour la MOUS à Berberati : 50% de réalisation pour Berberati


Les principales réalisations concernent :

- Mobilisation communautaire ;
- Sélection et engagement de la main d'œuvre THIMO ;
- Appui à la mise en œuvre des clauses sociales et environnementales ;
- Suivi et gestion des cas de VBG, EAS et HS ;
- 805/500 manœuvres retenus, soit un taux de 161% dans le cadre des travaux THIMO à Berberati pour la première phase de recrutement ;
- Evaluation d'impact THIMO socioéconomique jugé satisfaisant dû au niveau de vie des travailleurs THIMO qui s'est améliorés après l'enquête de satisfaction du taux de participation des travailleurs via l'outil kobo toolbox inclus dans l'activité dédié à l'ONG-FJWSL.

Situation des manœuvres THIMO à Berberati

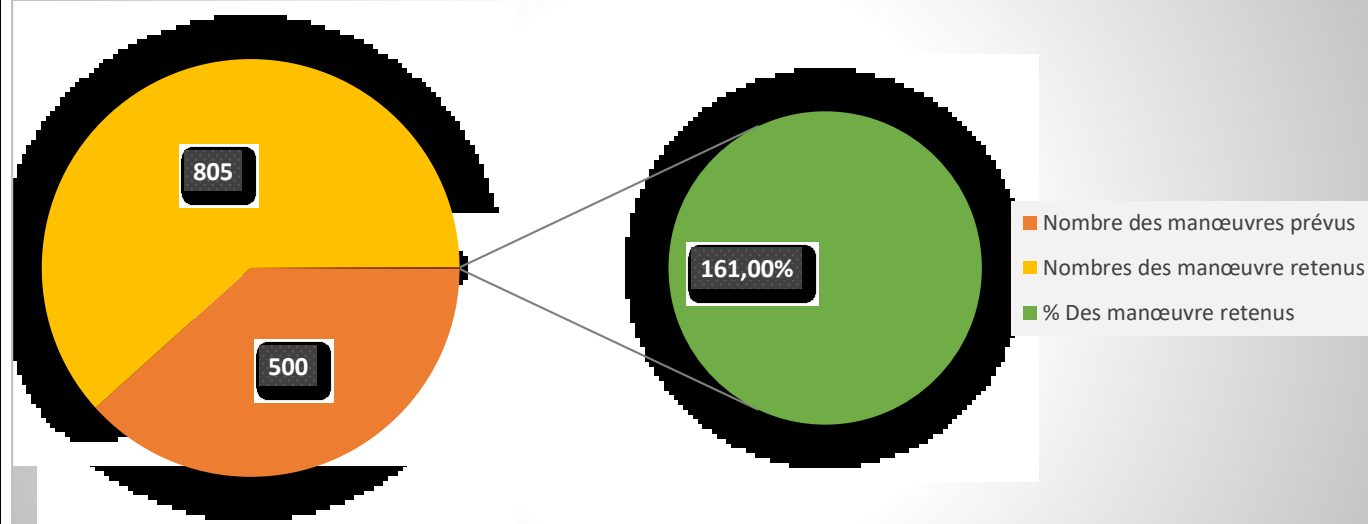

Répartition de la main d'œuvre THIMO à Berberati selon les entreprises

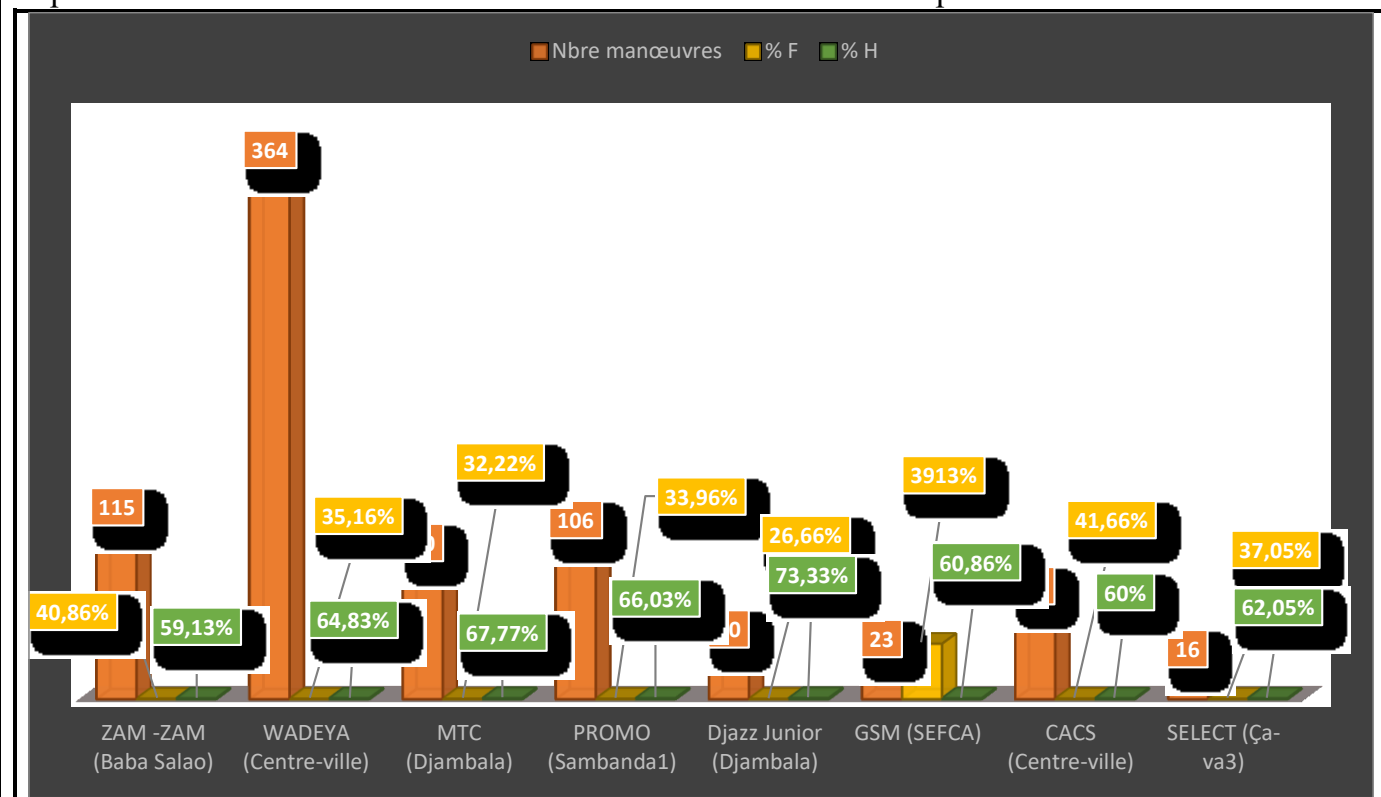

► SGI pour les travaux structurants : 35%

- Bangui et Berberati : APS disponible mais attente d'intégration des observations

► Travaux de proximité de la composante 2 à Berberati :

Travaux des infrastructures de base dans les quartiers : 95,23% de réalisation

- Lot 1 : entreprise MTC ;
- Lot 2 : entreprise PROMO ;
- Lot 3 : entreprise ZAM-ZAM ;
- Lot 4 : entreprise WADEYA-SERVICE.

Travaux de drainage, voirie et chemin piéton : 11,50% de réalisation

- Lot 1 : Entreprise DJAZZ Junior ;
- Lot 2 : Entreprise GSM Construction ;
- Lot 3 : Entreprise CACS SARL ;
- Lot 4 : Entreprise SELECT Corporation.

Figure : Etat de réalisation des travaux de construction des ouvrages


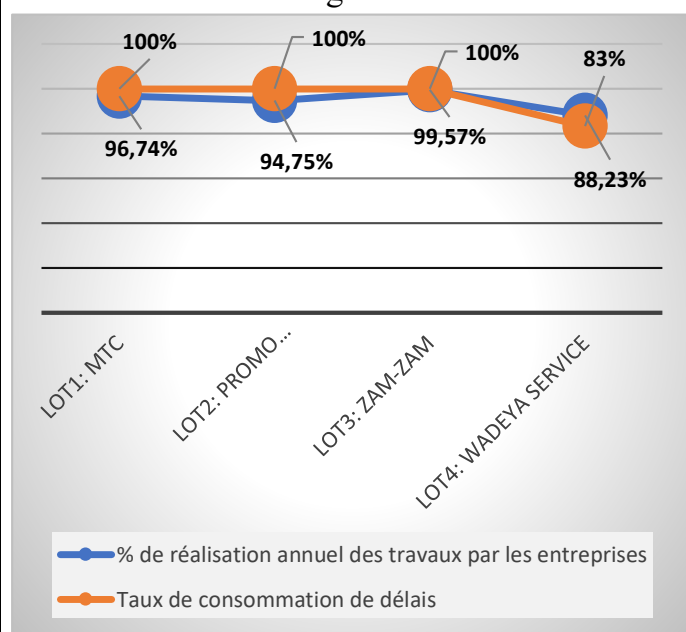


Figure : Etat de réalisation des travaux de drainage, chemins piétons et voies



► Etablissement Espoir : 100% de réalisation

Image photographique du bâtiment administratif de la Mairie de Berberati

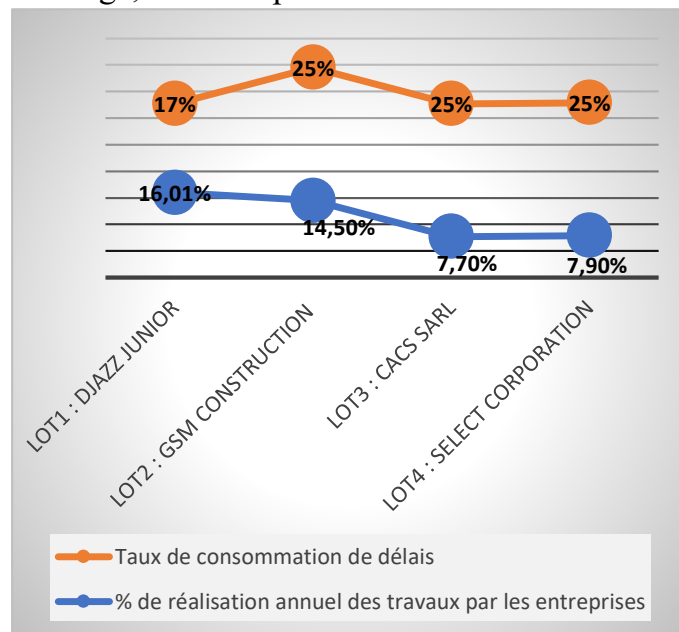

Composante 3: Gestion du projet

- **Cabinet LUSTRE-ARCI pour la construction du Siège du PROVIR : 30% de réalisation**
 - APS : avis favorable ;
 - APD : Avis NON favorable (suite aux échanges et observations écrites dans le compte rendu d'analyse de documents).
- **PROMO construction pour le site des déchets pour une durée de 15 ans : 85% de réalisation**


Site de dechet de Berberati



Abrite pour le gardien du site de déchet




► Situation d'engagements du PTBA

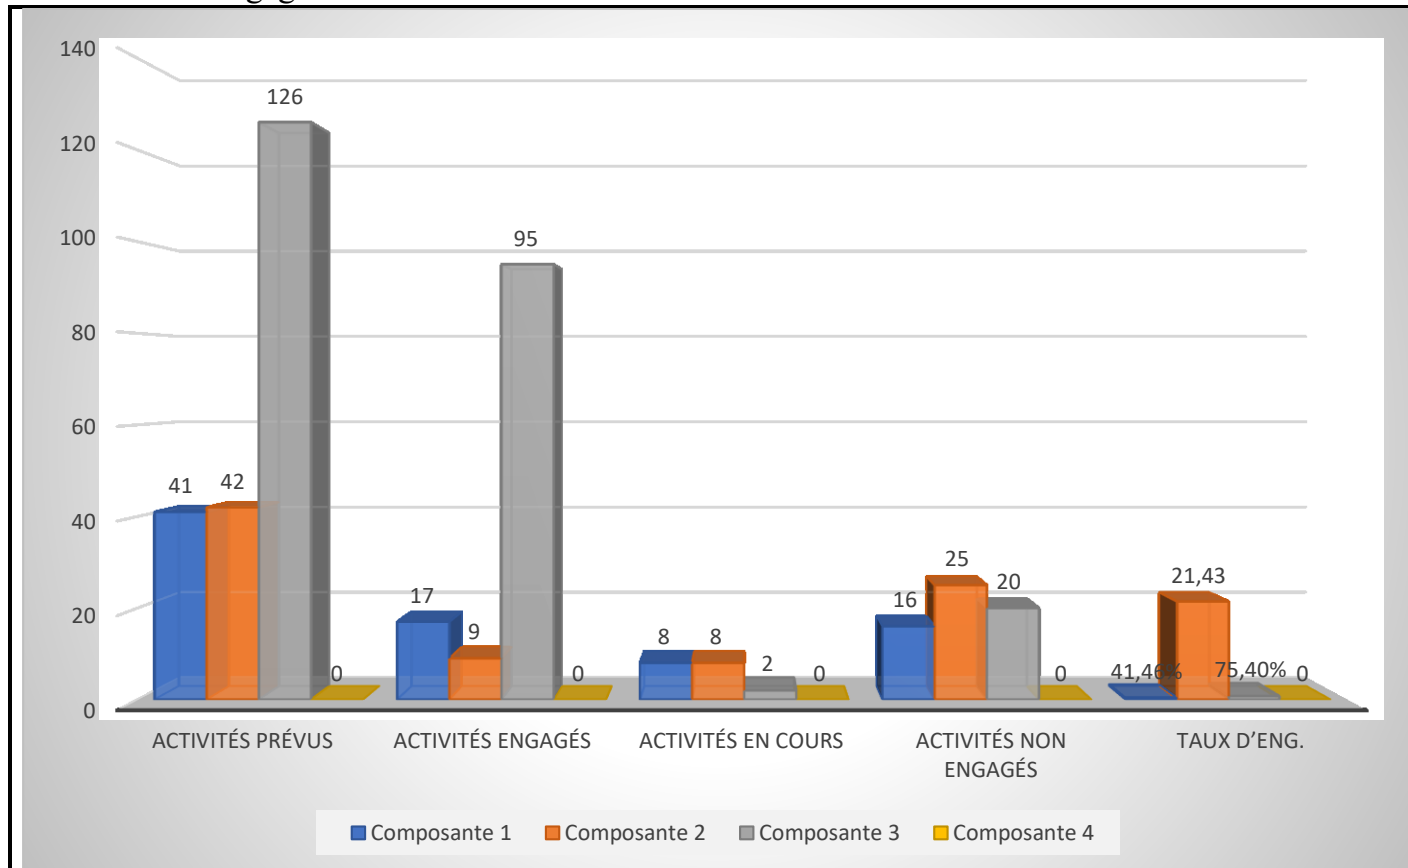

Cette figure présente des taux de réalisation des activités au 31 décembre 2025 par composante ci-après : (i) composante 1 : 41,46% ; (ii) composante 2 : 21,43 ; (iii) composante 3 : 75,40%. Sur les 209 activités prévues, plus de 121 activités ont été réalisées soit un taux de réalisation global de 57,89% au 31 décembre 2025.

► Situation des différentes réunions de coordination tenues par le projet : 78

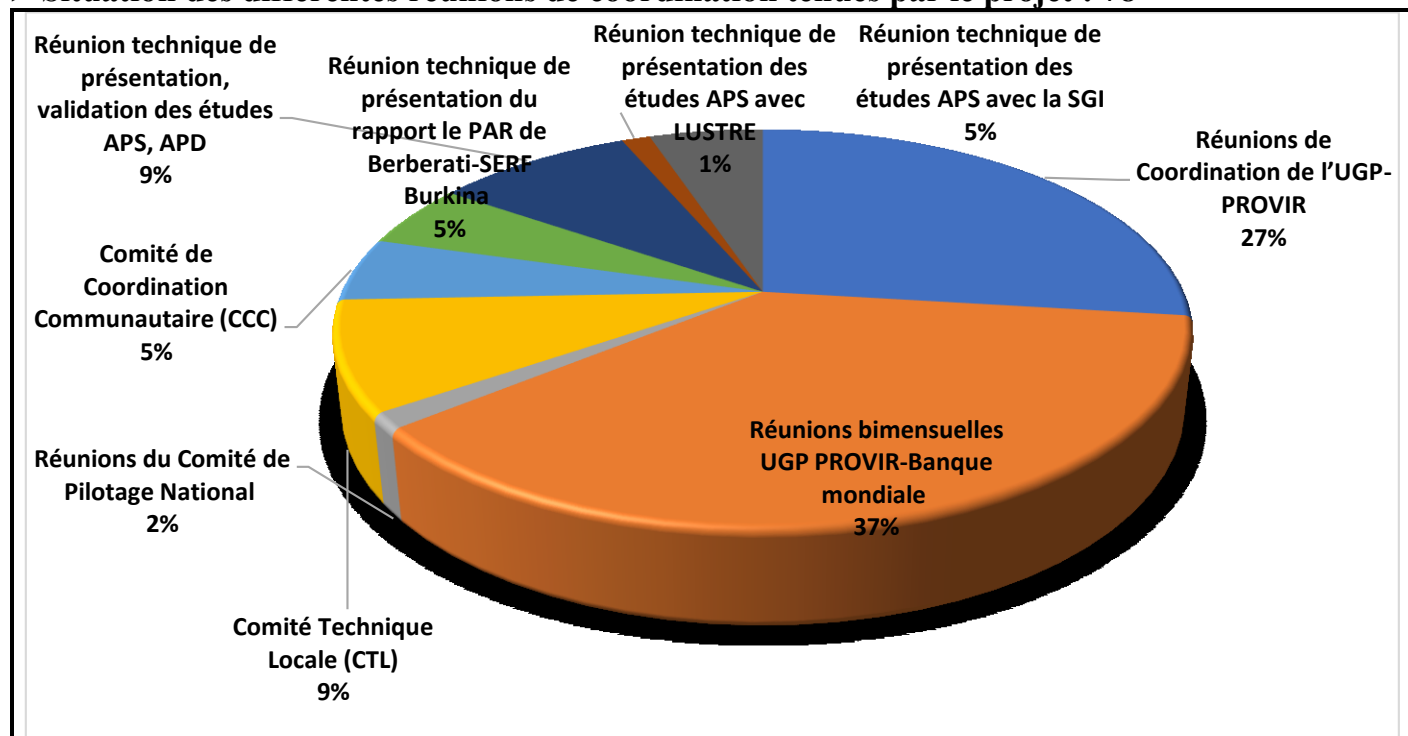


► **Situation des Comité d'Orientation Stratégique du projet : 100%**

- CPN au niveau stratégique : 2
- CTL de Bangui et Berberati : 2


► **Réalisation de Passation des marchés du projet**

- Sur les 59 marchés programmés, 44 marchés ont été engagés soit un taux d'engagement annuel de 74,12% en termes réalisation des marchés du projet en 2025.


Réalisation par type des marchés

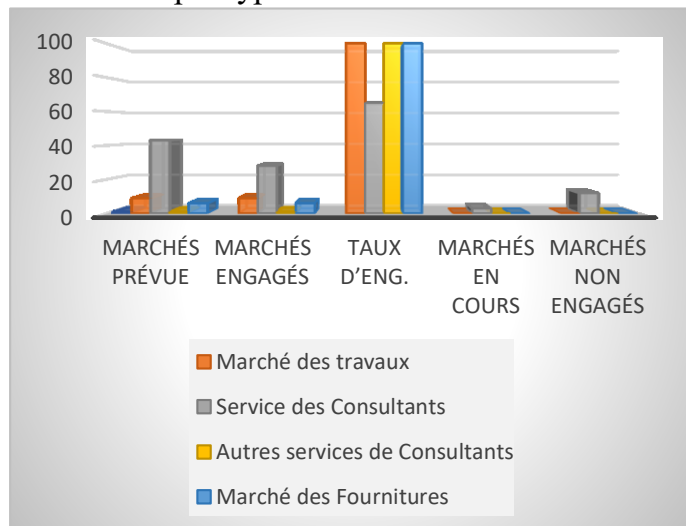


Réalisation des marchés prévus et engagés

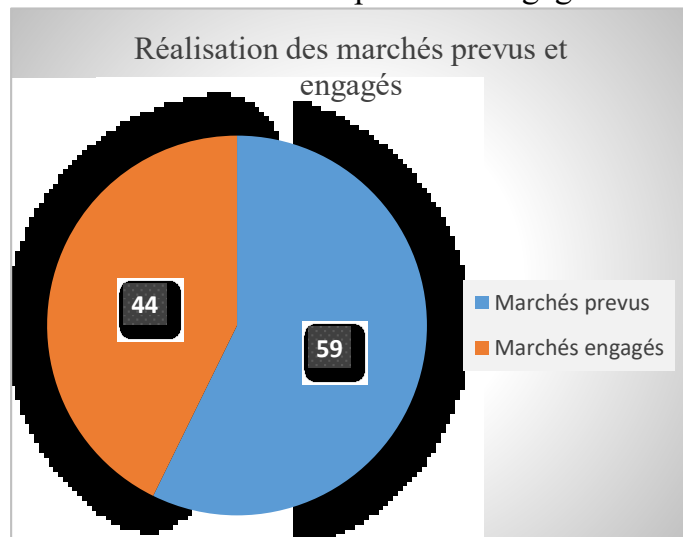

Taux d'engagement des marchés du projet

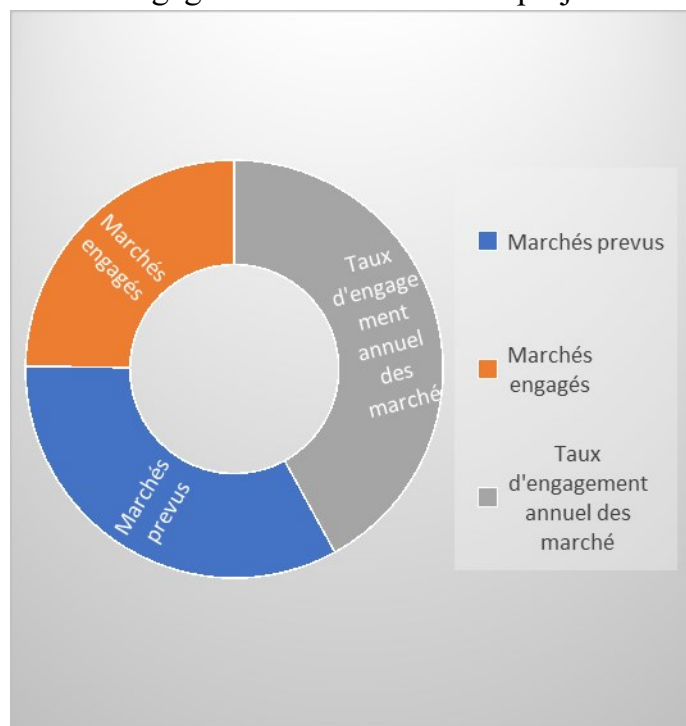


Réalisation des marchés par composantes

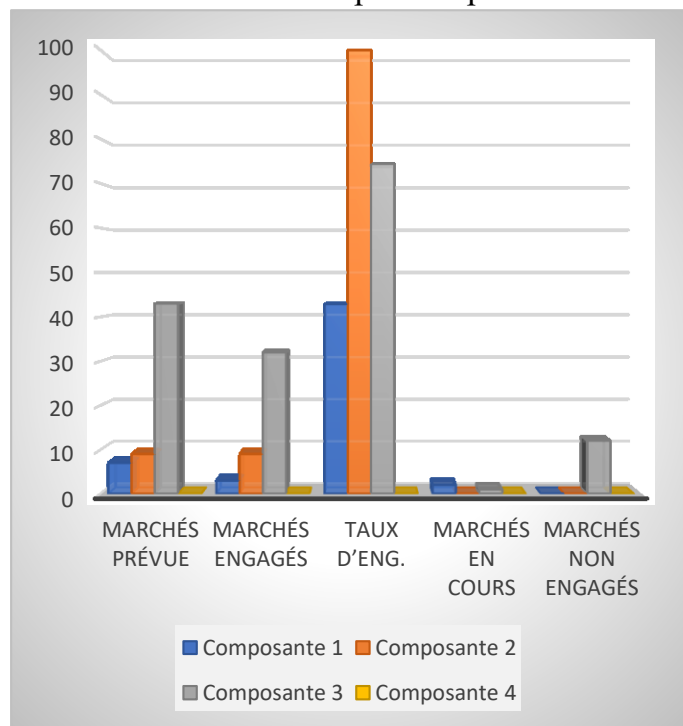


► **État de mise en œuvre de la Gestion budgétaire du projet**

En ce qui concerne la situation d'exécution budgétaire du projet :


- Le taux d'exécution budgétaire du projet est de 38,5% au 31 décembre 2025 contre un taux de 95,03% au 31 décembre 2024.

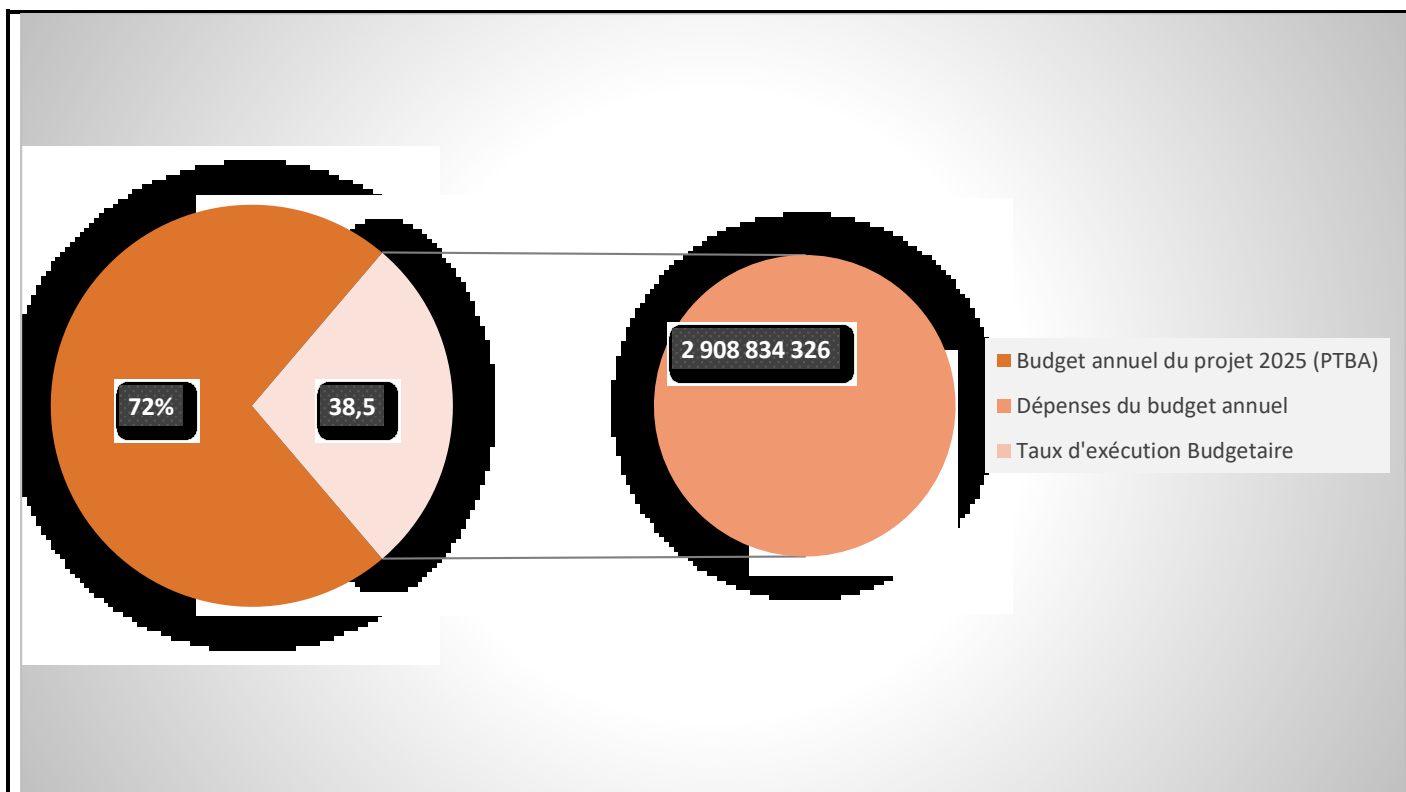

Pourcentage d'exécution financière du projet par trimestre

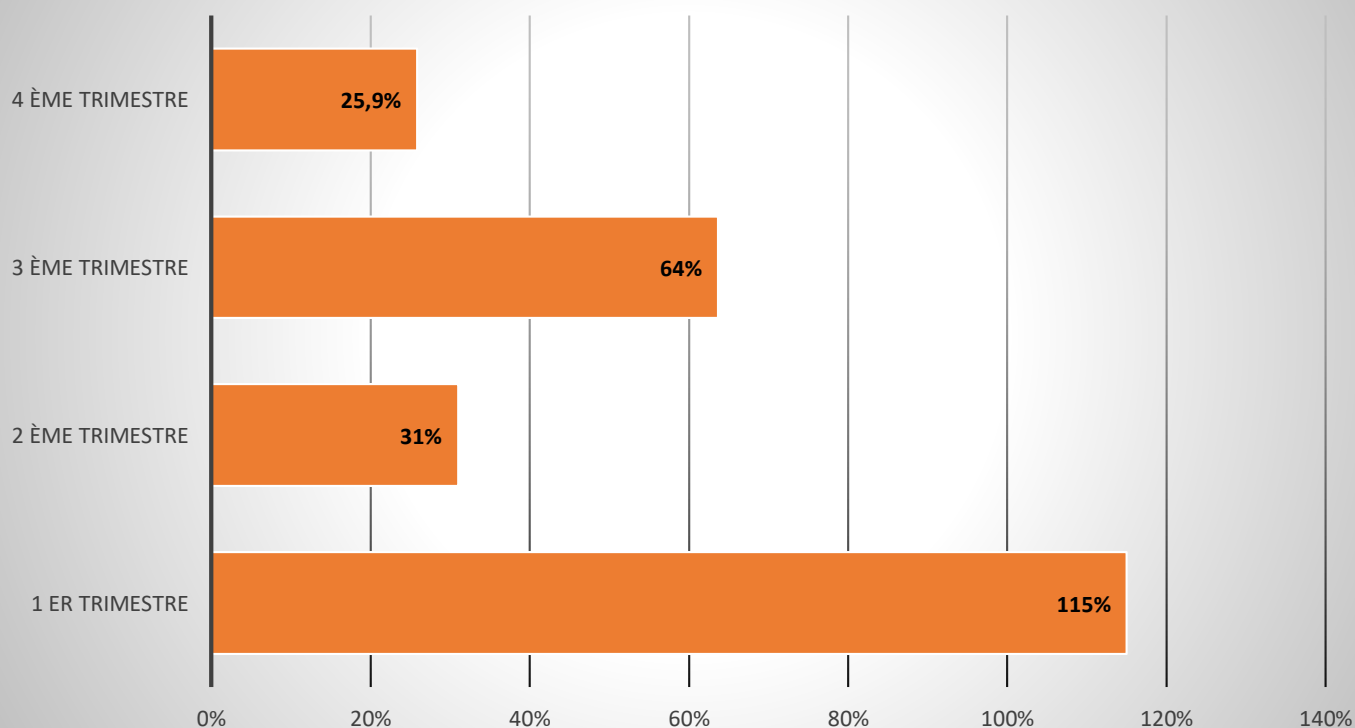


Taux de décaissement et d'engagement du projet

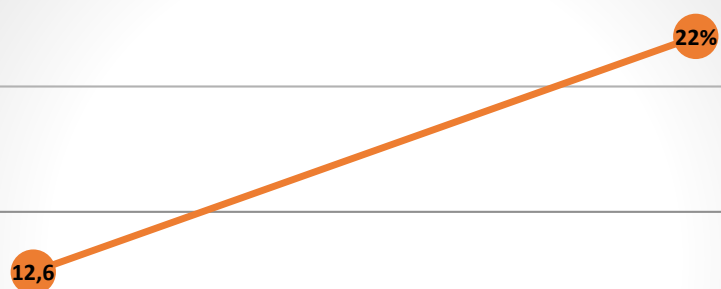

TAUX DE DÉCAISSEMENT

TAUX D'ENGAGEMENT

Dépenses en chiffre du projet par trimestre

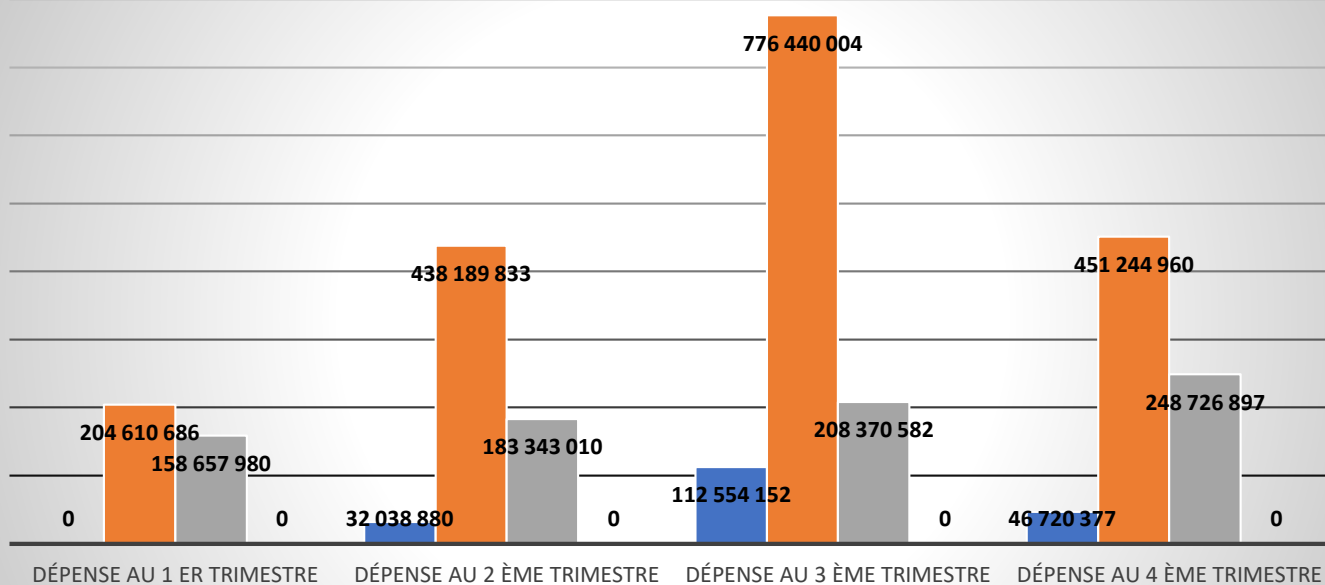

- Composante 1 : Investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base à l'échelle de la ville
- Composante 2 : Infrastructure de quartier et services de base
- Composante 3: Gestion de projet
- Composante 4 : Interventions d'urgence en cas d'urgence

Montant chiffrés du projet

40 950 000 000

35 811 811 960


5 138 188 040

MONTANT APPROUVÉ

MONTANT DÉCAISSÉ

MONTANT NON DÉCAISSÉ

Situation budgétaire du projet par composante

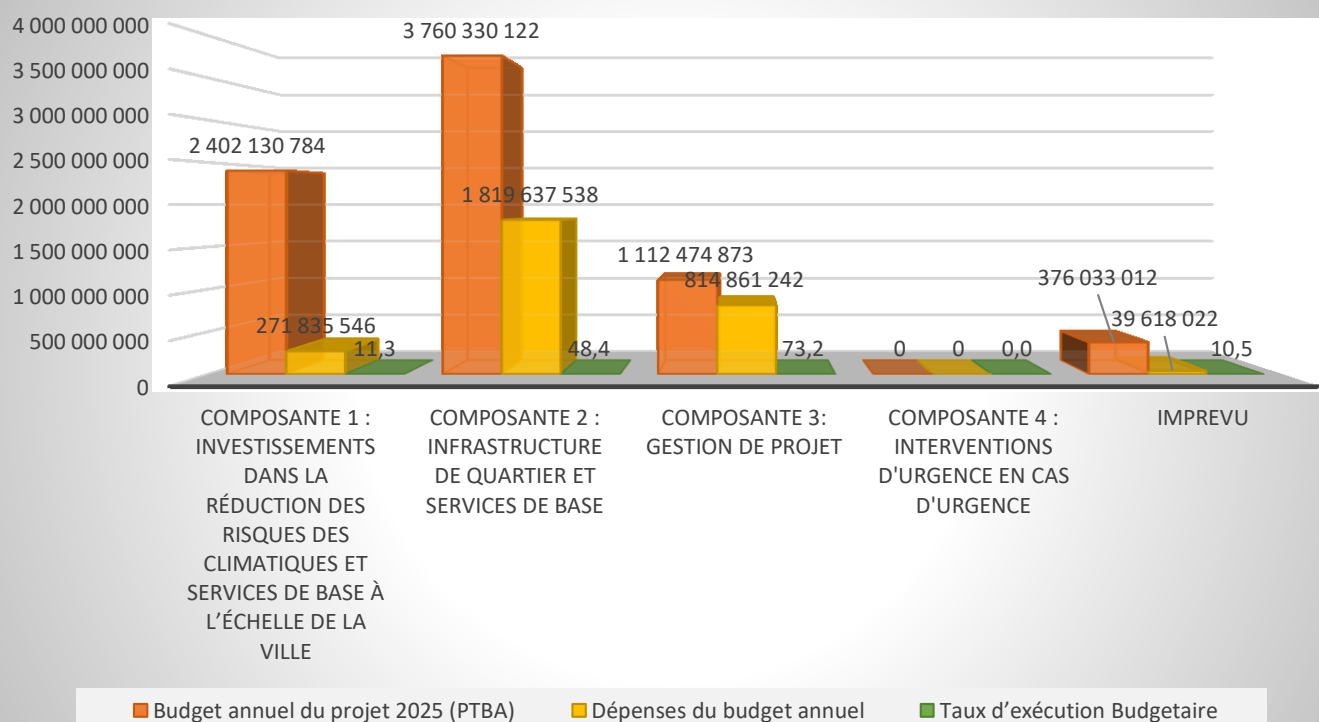

► **Réalisation de l'Audit Interne : 90%**

- Élaboration de la charte d'audit interne ;
- Élaboration de la cartographie des risques du projet 2025 et 2026 ;
- Élaboration du plan d'action annuel des activités de l'audit interne ;
- Elaboration et vulgarisation des outils de gestion des actifs non monétaire ;
- Révision des manuels du projet suite au financement additionnel FEM ;
- Un rapport d'audit opérationnel sur les activités réalisées à Berberati ;
- Diverses notes d'audit ponctuel à l'attention du Coordonnateur national de PROVIR
- Élaboration et publication rapport d'audit interne pour les trois (3) trimestre 2024).

► **Mise en œuvre des instruments de gestion environnementale, sociale et VBG : (65,85%)**

- Validation et Divulgarion des Instrument de sauvegardes ;
- Mise en œuvre des PGES Spécifiques ;
- Renforcement des capacités des Parties Prenantes au Projet PROVIR ;
- Mise en œuvre du PGMO ;
- Campagne d'information et de sensibilisation sur les activités du PROVIR dans les 13 zones ;
- Suivi environnemental deux fois par an par le Ministère en charge de l'Environnement ;
- Suivi environnemental et social y Compris VBG des activités mises en œuvre du Projet.

► **Mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales : (40%)**

- Mise en Œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes ;
- Evaluation de la Performance et Mise à jour du PMPP ;
- Mise en Œuvre et Suivi.

► **Mise en œuvre des mesures de Prévention et d'atténuation des risques de Violence Basée sur le Genre (VBG) : (40%)**

- Mise en Œuvre du plan d'action VBG ;
- Mise en œuvre et suivi du MGP (NES 10) ;
- Mise en œuvre du mécanisme de Gestion des Plaintes.

Figure : Cas de gestion des plaintes du projet


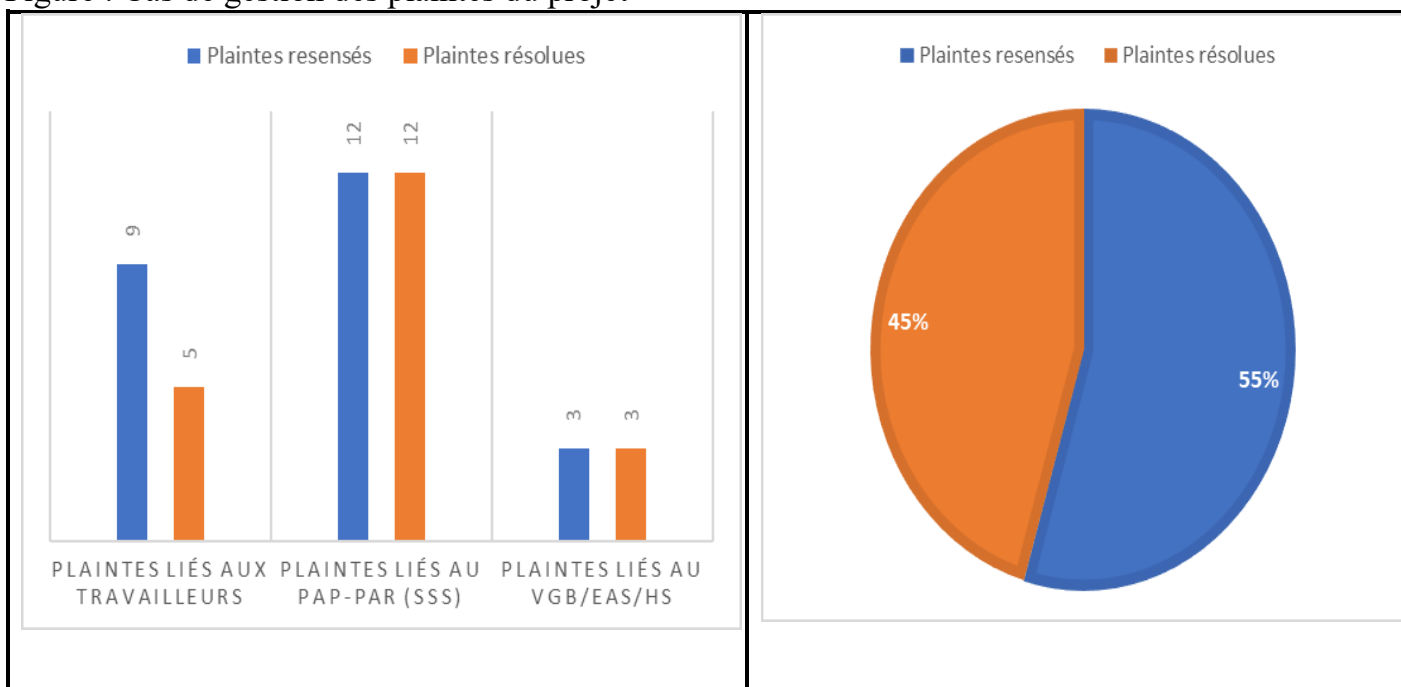


Figure : Documents cadres et spécifiques élaborés et validés du projet

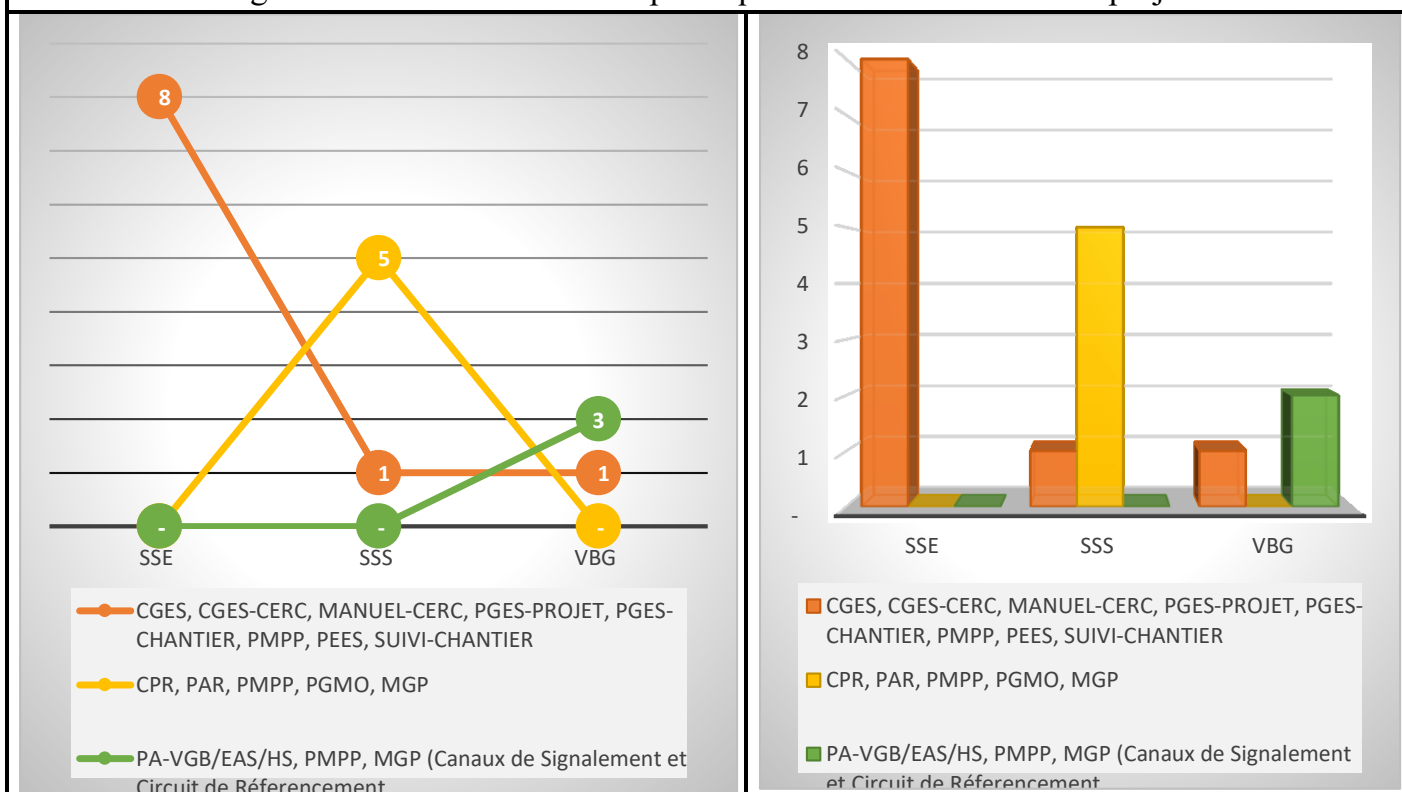

► Stratégie de la Gestion des Risques de Sécurité du projet : (93,55%)

- Installation de 09 extincteurs pour la sécurité des bâtiments de l'UGP Centrale (7) et l'UGP locale de Berberati (2) ;
- Renforcement des capacités du personnel de l'UGP centrale ;
- Formation des Cadres des entreprises adjudicataires des marchés des travaux de proximités de Berberati sur la gestion des risques de sécurité sur les chantiers ;
- Identification, mise en place, formation et dotation (moyens de communication) des points focaux de sécurité de Berberati ;
- Acquisition de moyen de communication (téléphone) aux Points Focaux ;
- Identification, mise en place, formation et dotation (moyens de communication) des points focaux de sécurité à Bangui suivi de l'élaboration d'une Procédure Opérationnelle Standard (SOP) pour la sécurité des déplacements.

► Mise en œuvre du plan de communication : 100%

Les Cinq (5) activités réalisées sont les suivantes :

- Élaboration de la stratégie de communication ;
- Production de supports de communication ;
- Activités médiatiques et digitales ;
- Organisation d'événements et mobilisation communautaire ;
- Édition et production de deux (2) magazine du « PROVIR Mag ».

► les réalisation de l'Architecte Urbanisme : (25%)

- Etudes architectural de Bangui ;
- Travaux (Infrastructures et Aménagements Spécifiques) et études de Berberati ;
- Projet de construction du Siège du PROVIR ;
- Autres Contributions et Gouvernance.

► **les réalisation du Système d'Information Géographique : (25%)**

- Revisitation des sites et formation au formulaire Kobo toolbox ;
- Préparation du tableau de bord de suivi à distance ;
- Revue des linéaires et vérification des traçons ;
- Conception de la carte sur les 7km depuis la Cathédrale Notre-Dame de Bangui
- Analyse et commentaire des cartes étudiées.

► **Identification des besoins dans la ville Bambari : 100%**

- Identification des besoins de la ville BAMBARI menée par le Cabinet URBA CONSULTING.

► **Cadre des résultats du projet par rapport aux objectifs fixé en 2025**

Indicateurs d'Objectif de Développement du Projet (IODP)

- Améliorer l'accès aux infrastructures de résilience climatique, 0% ;
- Amélioration de l'accès aux services de base, 0%.

NB : Source des données : RGPH4 en cours de traitement, kobo toolbox via l'enquête de satisfaction à mi-parcours, rapport d'avancement annuel du projet. Ces données seront rendues disponibles après la réalisation des travaux structurants et celle des travaux de proximité.

Indicateurs Intermédiaires du Projet (IIP)

***Investissements dans la réduction des risques d'inondation et d'érosion**

- Personnes formées (Nombre), 245/50 soit 490% ;
- Nombre des femmes formées : 120/25 soit 480% ;
- Personnes formées au niveau communautaire (nombre), 38/50 soit 76%.

***Infrastructures et services de base dans les quartiers**

- Bâtiment/cour réhabilité (Nombre), 2/2 soit 100% ;
- Bâtiment scolaire/cour réhabilité (Nombre), 4/2 soit 200% ;
- Réhabilitation des petits marchés (clôtures, entrepôts, etc.) (Nombre), 2/3 soit 66,67% ;
- Bâtiment de santé/cour réhabilité (Nombre), 1/0 soit 100% ;
- Petits espaces publics réhabilités (Nombre), 2/5 soit 40% ;
- Création d'emplois temporaires dans le secteur des travaux publics à forte intensité de main-d'œuvre (Nombre), 805/500 soit 161%.

Indicateur lié à la Gestion de projet :

- Rapport financiers (RSF) sont présentés à temps (Oui), 4/ 4 soit 100% ;
- Le plan de travail et le budget annuels sont soumis dans les délais (Oui), 1/1 soit 100% ;
- Grievs relayés par le système GRM-Gestion de Plainte et traités dans les délais impartis (Pourcentage), 20/60 soit 33,33% ;
- Manuel du CERC préparé (Oui), 1/1 soit 100%.

V. SITUATION DU CADRE DE RESULTAT DU PROJET PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS FIXES DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2025

Tableau n° 27 : Situation du Cadre de Résultat des indicateurs du projet en 2025

N°	Activités	Valeur de reference en 2024	Résultats attendus en 2025	Résultats obtenus en 2025	Taux de réalisation en 2025	Commentaires/Source de collecte d'information ou des données de l'ODP et des IIP
Indicateur d'Objectif de Développement du Projet (IODP)						
Améliorer l'accès aux infrastructures de résilience climatique						
01	Personnes protégées contre les risques d'inondation ou d'érosion (Nombre)	0	80 000	0	0%	Source des données : RGPH4 en cours de traitement, kobo toolbox via l'enquête de satisfaction à mi-parcours, rapport d'avancement annuel du projet. Ces données seront rendues disponibles après la réalisation des travaux structurants et celle des travaux de proximité.
02	Personnes protégées contre les risques d'inondation ou d'érosion - Femmes (nombre)	0	40 000	0	0%	Source des données : RGPH4 en cours de traitement, kobo toolbox via l'enquête de satisfaction à mi-parcours, rapport d'avancement annuel du projet. Ces données seront rendues disponibles après la réalisation des travaux structurants et celle des travaux de proximité.
Amélioration de l'accès aux services de base						
03	Personnes bénéficiant de meilleures conditions de vie en milieu urbain (Nombre)	0	50 000	428	0,86%	Source des données : kobo toolbox issu du rapport d'évaluation d'impact de la MOUS pour la ville

						de Berberati, rapport d'avancement annuel du projet.
04	Personne bénéficiant de meilleures conditions de vie en milieu urbain - femmes (Exigence de RMS - Nombre)	0	25 000	128	0,51%	Source des données : kobo toolbox issu du rapport d'évaluation d'impact de la MOUS pour la ville de Berberati, rapport d'avancement annuel du projet.
Indicateur Intermédiaire du Projet (IIP)						
Investissements dans la réduction des risques d'inondation et d'érosion						
05	Personnes formées (Nombre)	0	50	210	420%	Source de collecte des données, suivi de la liste de présence/décharge des participants, rapport de formation et le rapport d'avancement annuel. Nombre des PME : 31 ; nombre de personnes formés en PEES, CGES, PGES, PMPP, VBG/EAS/HS et sécuritaire y compris le CTL, CCC et les OSC : 210.
06	Femmes formées (Nombre)	0	25	120	480%	Source de collecte des données, suivi de la liste de présence/décharge des participants, rapport de formation et le rapport d'avancement annuel.
07	Personnes formées au niveau de l'Etat (Nombre)	0	10	0	0%	Source de collecte des données, suivi de la liste de présence/décharge des participants, rapport de formation et le rapport d'avancement annuel du projet. Cette activité n'est pas réalisée.

08	Personnes formées au niveau municipal (Nombre)	0	5	0	0%	Source de collecte des données, suivi de la liste de présence/décharge des participants, rapport de formation et le rapport d'avancement annuel du projet. Cette activité n'est pas réalisée.
09	Personnes formées au niveau communautaire (nombre)	0	50	38	76%	Source de collecte des données, suivi de la liste de présence/décharge des participants, rapport de formation et le rapport d'avancement annuel du projet.
Infrastructures et services de base dans les quartiers						
10	Routes secondaires réhabilitées (Kilomètres)	0	2	0	0%	PV des travaux produit par techniplan. Travaux de proximité en cours de réalisation à Berberati.
11	Drainage secondaire construit (Kilomètres)	0	2	0	0%	PV des travaux produit par techniplan. Travaux de proximité en cours de réalisation à Berberati.
12	Routes tertiaires réhabilitées (Kilomètres)	0	5	0	0%	PV des travaux produit par techniplan. Travaux de proximité en cours de réalisation à Berberati.
13	Drainage tertiaire construit (Kilomètres)	0	5	0	0%	PV des travaux produit par techniplan. Travaux de proximité en cours de réalisation à Berberati.
14	Sentiers piétonniers réhabilités (Kilomètres)	0	10	0	0%	PV des travaux produit par techniplan. Travaux de proximité en cours de réalisation à Berberati.
15	Drainage des voies piétonnes construit (Kilomètres)	0	10	0	0%	PV des travaux produit par Techniplan. Travaux de proximité en cours de réalisation à Berberati.

16	Passerelles pour piétons construites (Nombre)	0	2	0	0%	PV des travaux produit par Techniplan. Travaux de proximité en cours de réalisation à Berberati.
17	Drainage vert (biefs) construit (Kilomètres)	0	2	0	0%	PV des travaux produit par Techniplan. Travaux de proximité en cours de réalisation à Berberati.
18	Bâtiment/cour réhabilité (Nombre)	0	2	2	100%	Source : collecte des données annuelle, PV des réunions de Techniplan et les rapports des travaux réalisés à Berberati.
19	Bâtiment scolaire/cour réhabilité (Nombre)	0	2	4	200%	Source des données : mission et rapport de suivi/PV des réunions/Techniplan.
20	Réhabilitation des petits marchés (clôtures, entrepôts, etc.) (Nombre)	0	3	2	66,67%	Source : rapport de suivi, PV des réunions et rapports de Techniplan.
21	Bâtiment de santé/cour réhabilité (Nombre)	0	0	1	100%	Source : rapport de suivi, rapport de démarrage et PV des réunions Techniplan. Aucune activité n'a été prévue en 2025 mais une salle d'accueil des patients et le point d'eau avaient été construit et réhabilité à Berberati.
22	Petits espaces publics réhabilités (Nombre)	0	5	2	40%	Source : rapport de suivi, rapport de démarrage et PV des réunions Techniplan. Les travaux sont en cours de finition à Berberati. (1) Rond-point au niveau du centre-ville de Berberati dans la zone 4 et un (1) point d'eau

						construit/réhabilité au quartier Ndao dans la zone 3.
23	Sous-projets examinés et validés par les comités de coordination communautaire (CCC) des citoyens (pourcentage)	0	100	0	0%	Source des données : rapport annuel, rapport de mission de suivi et de l'atelier de vulgarisation du PTBA. Cette activité n'est pas réalisée.
24	Création d'emplois temporaires dans le secteur des travaux publics à forte intensité de main-d'œuvre (Nombre)	0	500	805	161%	Source des données : Fondation Joseph Worker qui exécute cette activité de recrutement des manoeuvres THIMO en ce moment à Berberati. Rien que pour les données THIMO à Berberati nous sommes à 161,4% soit un dépassement de 61% ce qui explique par une forte création d'emploi chez les jeunes, les adultes et les personnes vulnérables.
Gestion de projet						
25	Les rapports financiers sont présentés à temps (Oui/Non)	0	4	4	100%	Source des données : rapport de RSF. (4) rapports réalisés et rendus disponibles soit 100%.
26	Le plan de travail et le budget annuels sont soumis dans les délais (Oui/Non)	0	1	1	100%	Sources des données : PTBA-PROVIR 2025 validé et rendus disponible.
27	Griefs relayés par le système GRM- Gestion de Plainte et traités dans les délais impartis (Pourcentage)	0	60	20	33,33%	Sources des données : rapport de mise en œuvre du PAR et rapport de VBG. Sur les (24) plaintes enregistrées, (4) non résolues, (12) plaintes traitées et résolues avec

						succès dans le cadre du PAR dont 11 plaintes non sensibles à Berberati, (3) plaintes résolues dans le domaine de VBG dont une (1) plainte jugé sensible et résolue, (5) plaintes liées aux travailleurs enregistrés, traités et résolues.
28	Manuel du CERC préparé (Oui/Non)	0	1	1	100%	Source des données : issue de manuel CERC déjà élaboré et rendus disponible.

Source : UGP-PROVIR, 2025.

VI. DIFFICULTES RENCONTREES ET LES MESURES CORRECTIVES

La mise en œuvre des activités a été affectée par un certain nombre de contraintes objectives parmi lesquelles on peut citer les difficultés et les mesures correctives suivants :

DIFFICULTES RENCONTREES	MESURES CORRECTIVES
Validation des dossiers techniques des avenants aux contrats des travaux : (i) avenant au contrat des travaux du lot 1 de bâtiment et espace public de Berberati relatif au centre de santé de potopoto ; (ii) avenant au contrat des travaux du lot 4 de bâtiment et espace public de Berberati relatif aux (constructions des latrines, réalisation de peinture sur le mur de la clôture du lycée Barthélémy BOGANDA, (iii) aménagement du rond-point principal de Berberati ; et Avenant au contrat des travaux du site de décharge pour une durée de 15 ans à Berberati.	Relancer la Banque afin de donner son avis de non objection (ANO) sur les dossiers concernant les avenants aux contrats des travaux de Berberati indiqués.
Finalisation des études APS de Bangui (Phase I) par TechniPlan.	Mise en Place d'un Processus de Suivi Hebdomadaire des dossiers : (i) action : Instaurer des réunions de suivi hebdomadaires formelles et obligatoires avec chaque Bureau d'Études (BE) ayant des livrables en attente ou en révision ; (ii) Objectif : établir un planning partagé pour le déblocage des points en suspens et la livraison des versions corrigées, remplaçant la dynamique de soumission ponctuelle.

Source : UGP-PROVIR, 2025.

4.1. Synthèse des activités non réalisées impactant les indicateurs

Il est important de noter que dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PROVIR, certaines activités ayant des incidences significatives à l'évaluation des indicateurs du Projet tardent effectivement à démarrer. C'est le cas des activités telles que :

- i. Composante 1 : investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base à l'échelle de la ville**
 - Etudes sur le genre et les déplacements forcés en milieu urbain pour l'inclusion ;
 - Etude et élaboration d'une stratégie sur l'entretien et la maintenance ;
 - Etude pour l'analyse laboratoire de la composition chimique des boues de curage ;
 - Etude pour l'élaboration du plan d'aménagement urbain intégré (c.a.d., gestion des eaux pluviales/fluviiales et développement résilient et inclusif) de Bangui ;
 - Elaboration d'une étude sur la gestion et la maintenance des ouvrages d'assainissements construits ;
 - Etude sur le Genre et les déplacements forcés en milieu urbain pour l'Inclusion ;

- Evaluations de capacités techniques, institutionnelles et plan de renforcement de capacité des ministères cibles ;
- Etude pour la définition des activités de renforcement sectorielle - capacités, régulation et sensibilisation ;
- Renforcement des capacités institutionnelles.

ii. Composante 2 : Infrastructure de quartier et services de base

- Travaux d'Aménagement du site d'Enfouissement des Boue et Curages et de voies d'accès ;
- Etude diagnostique des processus de planification locale menés par les communes (y compris l'engagement citoyen) ;
- Etude et élaboration d'une stratégie sur l'entretien et la maintenance ;
- Etude sur l'historique des approches de viabilisation des quartiers et parcelles assainies ;

iii. Au niveau des sauvegardes

- Formation sur les Lois environnementales et sociales ainsi que la Gestion des déchets solides et liquides
- Actualisation du plan d'action social des activités priorisées pour les six mois et la mise en œuvre de MGP à Bangui.
- Mise en place des CLGP, identification et mise en place des points focaux VBG/EAS/HS dans les neuf zones de Bangui ;
- Mise à jour de la cartographie des structures de prise en charge des cas de VBG/EAS/HS.

VII. PERSPECTIVES

Au terme des perspectives pour la mise en œuvre du projet, les propositions suivantes sont formulées pour suivi et exécution :

- Finaliser les études des travaux structurants de Bangui et de Berberati ;
- Lancer les travaux structurants et de proximité à Bangui et à Berberati ;
- Pérenniser ou reconduire dans le PTBA 2026, les activités des équipes de sauvegardes non engagés de 2025 ;
- Actualiser le contrat de SERF BURKINA pour le démarrage des activités à Bangui ;
- Accélérer la mise en place et la formation des CLGP de Bangui (dans les 7 zones du projet) ;
- Obtenir des ANO sur les dossiers d'avenants aux contrats des travaux suivants : (i) avenant au contrat des travaux du lot 1 de bâtiment et espace public de Berberati relatif au centre de santé de potopoto ; (ii) avenant au contrat des travaux du lot 4 de bâtiment et espace public de Berberati relatif aux (constructions des latrines, réalisation de peinture sur le mur de la clôture du lycée Barthélémy BOGANDA, (iii) aménagement du rond-point principal de Berberati ; et Avenant au contrat des travaux du site de décharge pour une durée de 15 ans à Berberati ;
- Rechercher de Financement à hauteur de 88 millions de USD d'ici 2026 afin d'appuyer les travaux de Berberati (passant de 10 millions USD à 40 millions USD), de Bangui (passant de 30 millions à 88 millions USD) ;

VIII. CONCLUSION

Il est ressorti du bilan physique du projet que certaines activités n'ont pas connu de démarrage du fait des difficultés rencontrées mais aussi du fait des chronogrammes d'exécution respectifs des diverses structures d'exécution.

Durant l'année 2025, plusieurs activités du Projet des Villes Inclusives et Résilientes ont été mis en œuvre, parmi lesquelles certaines sont complètement terminées, d'autres en cours et certaines en attente de démarrage. Le faible taux de réalisation de certaines activités jugées prioritaires surtout les travaux structurant tant à Bangui qu'à Berberati et les travaux de proximité à Bangui a impacté le taux de décaissement et les indicateurs de performance du projet (IODP). Cela est dû en grande partie aux difficultés liées au retard dans les études techniques surtout avec la lenteur du bureau d'étude TechniPlan. Toutefois, malgré les contreperformances, des progrès significatifs ont été enregistrés sur l'ensemble des composantes du Projet ainsi qu'à l'élaboration des outils et des activités préparatoires du fonds additionnels du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM).

Le taux d'exécution budgétaire de 38,5% en fin décembre 2025 corrélé avec le taux d'exécution physique du projet de 57,89%, cache des inégalités entre les différentes composantes dont les taux sont entre 21,43% à 75,40%. La composante 1 a un taux de 41,46% ; la composante 3 a enregistré un taux le plus élevé de 75,40% ; enfin, le taux le plus faible revient à la composante 2 avec 21,43 par rapport aux activités programmées.

Le taux physique global a connu un progrès passant de 38,39% au 1^{er} semestre 2025 à 57,89% au 31 décembre 2025. Celui de la gestion financière a connu une variation relative passant de 4,81% au 1^{er} semestre à 38,5% au 31 décembre 2025. Les décaissements depuis le démarrage du projet sont établis à un montant de 5 138 188 040 milliards de FCFA, soit un taux de décaissement sur l'ensemble de portefeuille de 12,6% avec un niveau d'engagement global de 22%.

Du point de vue cadre de résultat du projet tant au niveau des IODP et des IIP, nous pouvons dire que quelques indicateurs ont été réalisés et d'autre non. Pour les IODP, les indicateurs à ce niveau ne peuvent être effectifs qu'après la réalisation des travaux structurants et ceux de proximité dans sa globalité. Cette réalisation permet de capitaliser en nombre leur pourcentage, et aussi celui de l'enquête de satisfaction à mi-parcours via l'outil kobotoolbox. Tandis qu'au niveau des IIP, l'atteinte des indicateurs a été très satisfaisant sauf ceux des travaux de proximité en ce qui concerne les activités de drainage, des voies et chemins piétons qui sont encore en cours d'exécution à Berberati.

En termes de perspectives, l'année 2026 sera consacrée à la poursuite des activités en démarrage tout en prenant en compte les mesures issues des différentes rencontres avec les bénéficiaires, les points focaux, le CTL, CCC, MGP, CPN et la Banque Mondiale pour leur mise en route rapide.

IX. LES ANNEXES

N°	Intitulé des sous annexes
1	Tableau n° 28 : Résultat provisoire de l'étude des solutions fondées sur la nature pour Bangui
2	Tableau n° 29 : Résultat provisoire de la ville de Berberati visant à réduire les risques de propagation de ces ravins et la dégradation des routes nationales
3	Tableau n° 30 : Détail des activités prévisionnelles planifiées dans le STEP
4	Tableau n° 31 : Activités engagés
5	Tableau n° 32 : Marchés en cours
6	Tableau n° 33 : Activités non engagés
8	Tableau n° 34 : Résultat provisoire de l'étude des solutions fondées sur la nature pour Bangui
9	Tableau n° 35 : Résultat provisoire de la ville de Berberati visant à réduire les risques de propagation de ces ravins et la dégradation des routes nationales
10	Tableau n° 36 : Détail des activités prévisionnelles planifiées dans le STEP
11	Tableau n° 37 : Activités engagées
12	Tableau n° 38 : Marchés en cours
13	Tableau n° 39 : Activités non engagées
	Tableau n° 40 : Détails des principaux résultats des personnes inscrites par catégories des THIMO à Berberati
	Tableau n° 41 : Etat d'avancement des travaux de construction/réhabilitation des ouvrages
	Tableau n° 42 : Etat d'avancement des travaux de réhabilitation des chemins piétons et voies des ouvrages de proximité
	Tableau n° 43 : Financier des travaux de construction des ouvrages de proximité
	Tableau n° 44 : Financier des travaux de réhabilitation des chemins piétons et voies des ouvrages de proximité
	Tableau n° 45 : Plan d'action prioritaire suivi du chronogramme détaillé du projet en 2025
	Tableau n° 46 : Evaluation détaillé des activités du PTBA au 31 décembre 2025
	Tableau n° 47 : Synoptique du suivi des contrats par composante du projet au 31 décembre 2025
	Tableau n° 48 : Synoptique du suivi financier du projet au 31 décembre 2025
14	Images photographiques des travaux et autres activités
15	Procès-Verbaux (PV) des Réunions des chantiers tenues par le Bureau de Contrôle Technique Plan au 31 décembre 2025

Tableau n° 28 : Résultat provisoire de l'étude des solutions fondées sur la nature pour Bangui

Groupe	Mesures
A. Protection et restauration des zones humides et des forêts	A1 – Corridors Ecologiques
	A2 – Agroforesterie
	A4 – Restauration de zones humides
	A5 – Renaturation des berges et du lit des rivières
	A6 – Gabions végétalisés, cultures tressées, fascines vivantes
B. Gestion des plaines inondables des rivières	B1 – Digue de retrait
C. Routes, voies d'accès et sentiers pédestre	C1 – Drainage intégré
	C2 – Routes intégrées avec bacs d'arbres
	C3 – Chemins en gradins avec bacs d'arbres
	C4 – Caniveaux végétalisés
D. Drainage intégré	D1 – Bassins de rétention multifonctionnels
	D2 – Fossés filtrants avec barrages de contrôle
E. Espaces verts publics	E2 – Avenues vertes
	E3 – Parcs de poche et aires de jeux naturelles
	E4 – Bassins de rétention
	E5 – Agriculture urbaine
F. Parcelles privées et aménagements	F1 – Cellules de bio-rétention / Jardins pluviaux
	F2 – Façades et cultures vertes
	F3 – Pavés perméables
	F4 – Toits verts
	F5 – Jardins résidentiels résilients au climat
	F6 – Réservoirs de récolte des eaux de pluie
	F7 – Murs de soutènement avec jardinières végétalisées

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 29 : Résultat provisoire de la ville de Berberati visant à réduire les risques de propagation de ces ravins et la dégradation des routes nationales

Quartier Samgbanda route de l'aéroport : - Samgbanda Reprofilage et trapèze de la ravine - Samgbanda Remblaiement - Samgbanda Barrages - Samgbanda Caniveaux secondaires - Samgbanda Caniveaux Principaux	Quartier Boulangerie: - Boulangerie Reprofilage et trapèze de la ravine - Boulangerie Remblaiement - Boulangerie Barrages - Boulangerie Caniveaux secondaires - Boulangerie Caniveaux Principaux.
Quartier Sopo: - Sopo Reprofilage et trapèze de la ravine - Sopo Remblaiement - Sopo Barrages - Sopo Caniveaux secondaires - Sopo Caniveaux Principaux.	Quartier Rosine: - Rosine Reprofilage et trapèze de la ravine - Rosine Remblaiement - Rosine Barrages - Rosine Caniveaux secondaires - Rosine Caniveaux Principaux.
Quartier Djambala: - Djambala Caniveaux Principaux - Djambala Caniveaux secondaires.	Quartier Kassaï: - Kassaï Remblaiement - Kassaï Reprofilage et trapèze de la ravine

	- Kassai Barrages.
Quartier Abattoir:	Quartier Boulangerie Kumbe:
- Abattoir Caniveaux Principaux	- Boulangerie Kumbe Remblaiement
- Abattoir Remblaiement	- Boulangerie Kumbe Caniveaux secondaires
- Abattoir Barrages.	- Boulangerie Kumbe Caniveaux Principaux.

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 30 : Détail des activités prévisionnelles planifiées dans le STEP

Composantes	N°	Réf. No. PPM	Activités : Nombre d'activités	Montant
Composante 1 : Nombre d'activités programmées (14)				45 millions de dollars
SC 1.1	08 activités pour la sous-composante 1.1			40 millions de dollars
	1	PROVIR - 01/S/SFQC/24	Etudes pour l'élaboration du plan d'aménagement urbain intégré (c'est-à-dire gestion des eaux pluviales/fluviales et développement résilient et inclusif) de Bangui	300 000
	2	PROVIR - 02/S/QC/24	Etude sur la gestion des déchets solides (institutionnel et opérationnel)	300 000
	3	PROVIR - 03/S/QC/24	Gouvernance urbaine pour des villes résilientes/inclusives (Etudes pour la définition et chiffrage des activités du volet	100 000
	4	PROVIR - 04/S/QC/24	Etude sur le genre et les déplacements forcés en milieu urbain pour l'inclusion	150 000
	5	PROVIR - 05/S/SFQC/24	Etude de construction des infrastructures prioritaires : élaboration d'APS, APD et DAO	2 000
	6	PROVIR - 06/S/SFQC/24	Elaboration de documents de sauvegardes : Etudes d'impact Environnemental et Social (PGES), Plan de Gestion des Déchets (PGD), des instruments cadre de sauvegarde	550 000
	7	PROVIR - 07/S/QC/24	Maitrise d'œuvre Urbaine et Sociale (MOUS)	200 000
	8	PROVIR - 08/S/QC/24	Etude pour l'analyse de laboratoire de la composition chimique des boues de curage	50 000
SC 1.2	06 activités pour la sous-composante 1.2			5 millions USD
	9	PROVIR - 09/S/QC/24	Etude diagnostique des processus de planification locale menés par les communes (y compris l'engagement citoyen)	50 000

	10	PROVIR - 10/S/QC/24	Etude sur l'historique des approches de viabilisation des quartiers et parcelles assainies	60 000
	11	PROVIR - 11/S/QC/24	Evaluation des capacités techniques, institutionnelles et plan de renforcement de capacité des ministères cibles	50 000
	12	PROVIR - 12/S/QC/24	Etude évaluation capacités engagement citoyen/société civile (ciblée autour des investissements du projet)	50 000
	13	PROVIR - 13/S/QC/24	Etude pour la définition des activités de renforcement sectoriel – capacités, régulation et sensibilisation	50 000
	14	PROVIR - 14/S/QC/24	Etudes d'aménagement des accès et du site d'enfouissement des boues de curage	50 000
	15	PROVIR - 15/S/QC/24	Diagnostic institutionnel et opérationnel pour la gestion des risques et désastres et des acteurs HYDROMET et du système d'alerte précoce en RCA et définition du plan d'investissement pour leur modernisation	150 000
	16	PROVIR - 16/S/QC/24	Etude Sauvegarde : Elaboration de documents de sauvegarde : Etude d'impact Environnemental et Social (EIES), Plan d'Action de Réinstallation (PAR), Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), Plan de Gestion des Déchets)	150 000
	17	PROVIR - 17/S/QC/24	Etudes Sauvegardes - Elaboration des instruments cadres de Sauvegardes et associés - CGES, CPR, PMPP, PEES, MGP, Evaluation des risques sécuritaires et risques VGB et plan de gestion des déchets	250 000
Composante 2 : Nombre d'activités programmées (9)				20 millions USD
CP.2	1	PROVIR - 01/T/AOI/24	Travaux de voirie drainage dans la ville de Bangui (en 09 lots)	9 510 475
	2	PROVIR - 02/T/AON/24	Travaux de bâtiments espaces publics dans la ville de Bangui (en 09 lots)	4 559 000
	3	PROVIR - 03/T/AON/24	Travaux de voirie drainage dans la ville de Berberati (en 04 lots) Compl	1 948 000
	4	PROVIR - 04/T/AON/24	Travaux de bâtiments espaces publics dans la ville de Berberati (en 04 lots)	2 199 000
	5	PROVIR - 05/S/QC/24	Etude diagnostique des processus de planification locale menés par les	50 000

			communes (y compris l'engagement citoyen)	
	6	PROVIR - 06/S/QC/24	Etude sur l'historique des approches de viabilisation des quartiers et parcelles assainies	60 000
	7	PROVIR - 07/S/QC/24	Travaux d'Amenagement du site d'Enfouissement des Boue et Curages et de voies d'Accès	50 000
	8	PROVIR - 08/S/QC/24	Etude diagnostique des processus de planification locale menés par les communes (y compris l'engagement citoyen)	50 000
	9	PROVIR - 09/S/QC/24	Etude et élaboration d'une stratégie sur l'entretien et la maintenance	100 000
Composante 3 : Nombre d'activités programmées (33)				5 millions USD
CP.3	1	PROVIR - 01/F/DC/24	Achat des mobiliers et équipements pour le personnel à recruter (UGP PROVIR et MURFVH)	24 081
	2	PROVIR - 02/F/AOI/24	Acquisition du matériel informatique (UGP PROVIR et MURFVH)	27 271
	3	PROVIR - 03/S/QC/24	Formations	150 000
	4	PROVIR - 04/S/QC/24	Formations (planification, SAP, etc.)	150 000
	5	PROVIR - 05/S/CI/24	Etude sur la prise en compte des aspects THIMO dans les documents d'appels d'offres	25 000
	6	PROVIR - 06/S/CI/24	Elaboration du manuel d'exécution du projet (et manuel suivi - évaluation)	15 000
	7	PROVIR - 07/S/CI/24	Elaboration de la Stratégie de Passation des Marchés pour le Développement (PPSD) et du Plan de Passation des Marchés (PPM)	40 000
	8	PROVIR - 08/S/QC/24	Etudes APS/APD/Mission de contrôle Réhabilitation de bâtiment pour l'Unité de Gestion MURFVH	180 000
	9	PROVIR - 09/S/QC/24	Instruments Sauvegardes Réhabilitation de bâtiment pour l'Unité de Gestion MURFVH	25 000
	10	PROVIR- 10/SC/CI/23	Recrutement d'un Coordonnateur pour le projet PROVIR	30 000
	11	PROVIR- 11/SC/CI/23	Recrutement d'un Coordonnateur Adjoint pour le projet PROVIR	20 400
	12	PROVIR- 12/SC/CI/23	Recrutement d'Un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière pour le projet PROVIR	22 800

	13	PROVIR-13/SC/CI/23	Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Sociales pour le projet PROVIR	20 400
	14	PROVIR-14/SC/CI/23	Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes environnementales pour le projet PROVIR	20 400
	15	PROVIR-15/SC/CI/23	Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés pour le projet PROVIR	22 800
	16	PROVIR-16/SC/CI/23	Recrutement d'un Spécialiste en VGB pour le projet PROVIR	20 400
	17	PROVIR-17/SC/CI/23	Recrutement d'un (e) Assistant (e) Administratif (Ve) (PURIC) pour le projet PROVIR	7 800
	18	PROVIR - 18/S/CI/24	Chauffeurs	16 364
	19	PROVIR - 19/S/CI/24	Comptable	28 965
	20	PROVIR - 20/S/CI/24	Expert en communication	41 455
	21	PROVIR - 21/S/CI/24	Auditeur interne	41 455
	22	PROVIR - 22/S/SMC/24	Auditeur externe	50 000
	23	PROVIR - 23/S/CI/24	Assistant VBG	20 689
	24	PROVIR - 24/S/CI/24	Assistant sauvegardes	20 689
	25	PROVIR - 25/S/CI/24	Ingénieur BTP	41 455
	26	PROVIR - 26/S/CI/24	Expert en sécurité	41 455
	27	PROVIR - 27/S/CI/24	Spécialiste en Suivi-Evaluation	41 455
	28	PROVIR - 28/S/CI/24	Géomaticien	41 455
	29	PROVIR - 29/S/CI/24	Ingénieur en Architecture	41 455
	30	PROVIR - 30/SNC/CE/24	Service de gardiennage du local UGP-PROVIR	13 090
	31	PROVIR - 31/SNC/CE/24	Service d'entretien de local UGP-PROVIR	27 000
	32	N°32/MURFVH/DIRCAB/T/UGP-PROVIR/2025.	Recrutement d'une entreprise pour des travaux spécifiques sur le site de décharge à Berberati. Duré des travaux 3 mois par l'entreprise PROMO CONSTRUCTION	123 133

	33	N°33/25/MURFV H/DIRCAB/UGP -PROVIR	Travaux de réhabilitation de bâtiment abritant l'UGP local de Berberati. Par l'Etablissement Espoir	11 036
Composant 4 : Nombre d'activités programmées (00)				00

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 31 : Activités engagées

N°	Intitule du Marché	Montant Prévisionnel	Méthode Passation des marches	Date de la signature du contrat	Observations
SERVICES DE CONSULTANTS (FIRMES OU INDIVIDUEL)					
21	(23) Staff du PROVIR en fonction dont une (1) démission et un (1) consultant non reconduit pour manque de compétence	301 340 000	Consultant Individuel	2025 au 2026	Contrats signés dont 1 en cours d'exécution
22	Etudes Sauvegardes - Elaboration des instruments cadres de Sauvegardes et associés - CGES, CPR, PMPP, PEES, MGP ; Evaluation des risques sécuritaires et risques VGB et plan de gestion des déchets	485 652 740	Service de Consultant	03/04/2024	CERF BURKINA
23	Etude de construction des infrastructures priorisée dans l'étude du plan d'aménagement urbain intégré : élaboration d'APS, APD et DAO	530 000	Service de Consultant	06-août-24	En cours d'exécution par le Cabinet Technique plan
24	Maitrise d'Œuvre Urbain et Sociale MOUS.	146 250	Service de Consultant	11/03/2025	En cours de réalisation par le Cabinet MOUS
25	Création du site Web MURFVH et Abonnement pour 01 an.	7 000	Service de Consultant	04/06/2025	Activité réalisé
26	Contrat N° 2 et 3 pour le : Maitre d'ouvrage complet des travaux de réduction des risques d'inondation et d'érosion à Bangui et Berberati par le Groupement SGI Studio Galli Ingénierie Afrique (SUARL). Tranche ferme : 401 806 204, Tranche	967 753 876	Service de Consultant	19/05/2025	En cours de réalisation par le Groupement SGI Studio Galli Ingénierie Afrique (SUARL)

	conditionnelle : 565 947 672.				
27	Lot1 : Quartiers Potopoto, Ngou ciment2 Djambala 1, 2 et 8 pour les travaux de drainage, voirie et chemin piéton à Berberati. Durée 6 Mois entreprise JAZZ JUNIOR.	987 000 000	Service de Consultant	28/03/2026	Travaux en cours de finition
28	Lot2 : Quartiers Samgbanda 1 et 2 pour les travaux de drainage, voirie et chemin piéton à Berberati. Durée 4 Mois l'Entreprise GSM Construction.	113 828 925	Service de Consultant	31/12/2025	Travaux en cours de finition
29	Lot3 : Quartiers Ndao, Baba salao et Kassail pour les travaux de drainage, voirie et chemin piéton à Berberati. Durée 4 Mois entreprise CACS-SARL.	39 1450 500	Service de Consultant	31/12/2025	Travaux en cours de finition
30	Lot4 : Quartiers Centre-ville pour les travaux de drainage, voirie et chemin piéton à Berberati. Durée 4 Mois entreprise SELECT Corporation.	88 877 250	Service de Consultant	31/12/2025	Travaux en cours de finition
31	Recrutement d'une entreprise pour des travaux spécifiques sur le site de décharge à Berberati. Durée 3 Mois par l'Entreprise PROMO construction.	123 132 478	Service de Consultant	01/07/2025	Travaux en cours de finition
32	Travaux de réhabilitation de bâtiment abritant l'UGP local au niveau de la mairie de Berberati. ETS Espoir.	11 035 800	Service de Consultant	30/09/2025	Marché des travaux totalement fini.
33	Elaboration du manuel d'exécution du projet-CF-PIU-MIN-INFRA-429363-CS-CDS	15 000 USD	Service de Consultant	2024	Activité réalisée
34	Elaboration de la Stratégie de Passation des	40 000 USD	Service de Consultant	2024	Activité réalisée

	Marchés pour le Développement (PPSD) et du Plan de Passation des Marchés (PPM)-PROVIR -19/S/CI/24				
35	Acquisition du logiciel TOMPRO- PROVIR-03/F/ED/23	50 000 USD	Service de Consultant	2024	Activité réalisée
36	Etudes d'aménagement d'accès et du site d'enfouissement des boues de curage-PROVIR-22/S/QC/24	50 000 USD	Service de Consultant	2024	Activité réalisée à Berberati dont celle de Bangui en cours
37	Etude sur la prise en compte des aspects THIMO dans les documents d'appels d'offres- PROVIR -17/S/CI/24	25 000 USD	Service de Consultant	2024	RAS
38	Etude et élaboration d'une stratégie sur l'entretien et la maintenance	100 000 USD	Service de Consultant	2024	RAS
FOURNITURES					
39	Matériel Informatique (Acquisition du matériel informatique pour l'Unité de Gestion du Projet et pour l'équipe du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat)	36 363	Demande de cotation	02/05/2024	Équipements livrés et réceptionnés
40	Achats de mobiliers et équipements pour le personnel de l'UGP à recruter et pour l'équipe du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat.	24 081	Demande de cotation	04/06/2024	Mobiliers livrés et réceptionnés
41	Acquisition des consommables de bureau pour la Coordination du Projet PROVIR.	11 000	Demande de cotation	24/06/2024	Fournitures livrées et réceptionnés
42	Acquisition du Logiciel TOMPRO	50 000	Entente Direct	14/06/2024	Fournitures livrées et réceptionnés
43	Acquisition de trois (3) véhicules Toyota Prado Land Cruiser dont (1) du CN Bangui, (1) du CR	229 091	Demande de cotation	20/06/2025	Moyen roulant livré et fonctionnel

	Berberati et (1) du MURFVH				
44	Fourniture de la boîte à images pour les activités de la sensibilisation du projet	10 470	Demande de cotation	14 Juillet 2025	Fournitures livrées et réceptionnés

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 32 : Marchés en cours

N°	Intitule du Marché	Montant Prévisionnel	Méthode de passation des marches	Date de la signature du contrat	Observations
MARCHES DES TRAVAUX (FIRMES OU INDIVIDUEL)					
1	En cours de recrutement de l'Expert social	20 400 000	ANO	RAS	En phase d'avis de la Banque pour l'entretien
2	Etude de construction des infrastructures structurantes à Bangui et Berberati : élaboration d'APS, APD et DAO et Mission de Supervision	401 806 204	ANO	19/05/2025	En cours d'intégration des amendements de la Banque et du PROVIR par le Bureau d'étude
3	Etudes APS/APD/Mission de contrôle Réhabilitation de bâtiment pour l'Unité de Gestion MURFVH	99 164 800	ANO	29/10/2025	En cours d'intégration des amendements de la Banque et du PROVIR par le Bureau d'étude pour l'organisation de l'atelier de validation des APS

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 33 : Activités non engagées

N°	Intitule du Marché	Montant Prévisionnel en USD	Méthode Passation des marches	Date de la signature du contrat	Observations
SERVICES DE CONSULTANTS (Firmes ou Individuel)					
1	Etudes pour l'élaboration du plan d'aménagement urbain intégré (c'est-à-dire gestion des eaux pluviales/fluviales et développement résilient et inclusif) de Bangui	300 000	SFQC	RAS	Non Exécuté

2	Etude sur le genre et les déplacements forcés en milieu urbain pour l'inclusion	150 000	QC	RAS	Non Exécuté
3	Diagnostic institutionnel et opérationnel pour la gestion des risques et désastres et des acteurs HYDROMET et du système d'alerte précoce en RCA et définition du plan d'investissement pour leur modernisation	150 000	QC	RAS	Non Exécuté
4	Etude pour l'analyse de laboratoire de la composition chimique des boues de curage	50 000	QC	RAS	Non Exécuté
5	Gouvernance urbaine pour des villes résilientes/inclusives (Etudes pour la définition et chiffrage des activités du volet	100 000	QC	RAS	Non Exécuté
6	Etude sur la gestion des déchets solides (institutionnel et opérationnel)	100 000	QC	RAS	Non Exécuté
7	Etude et élaboration d'une stratégie pour la maintenance	150 000	QC	RAS	Non Exécuté
8	Evaluation de capacités techniques, organisationnelles de gouvernance et plan de renforcement de capacité pour les communes cibles	75 000	QC	RAS	Non Exécuté
9	Etude sur l'historique des approches de viabilisation des quartiers et parcelles assainies	60 000	QC	RAS	Non Exécuté
10	Etude pour la définition des activités de renforcement sectoriel – capacités, régulation et sensibilisation	50 000	QC	RAS	Non Exécuté
11	Sélection d'un cabinet pour le renforcement des capacités et l'engagement des citoyens	300 000	QC	RAS	Non Exécuté
12	Evaluation des capacités techniques, institutionnelles et plan de renforcement de	50 000	QC	RAS	Non Exécuté

	capacité des ministères cibles				
13	Etude évaluation capacités citoyen/société civile (ciblée autour des investissements du projet)	50 000	QC	RAS	Non Exécuté
14	Etude diagnostique des processus de planification locale menés par les communes (y compris l'engagement citoyen)	100 000	QC	RAS	Non Exécuté
15	Etude des Quartiers pour la sélection des quartiers, définition d'une stratégie d'investissement intégrés des quartiers et d'engagement avec les parties prenantes	450 000	SFQC	RAS	Non Exécuté
16	Formations (planification, SAP, etc.)	150 000	SFQC	RAS	Non Exécuté
17	Etude de Viabilité - Etude sur l'historique des approches de viabilisation des quartiers et parcelles assainie	60 000	SFQC	RAS	Non Exécuté

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 34 : Détails des principaux résultats des personnes inscrites par catégories des THIMO à Berberati

Données générales sur les inscriptions			
Nombre total de personnes inscrites : 3 627			
Hommes	1 989 (54,8%)	Femmes	1 638 (45,2%)
Répartition des inscrits par zone			
Zone 1	825 (22,7%)	Zone 3	902 (24,9%)
Zone 2	807 (22,2%)	Zone 4	1 093 (30,1%)
Analyse par catégorie de vulnérabilité			
Jeunes sans emploi de (18 à 35 ans). Effectif total : 2 770, soit 76,4% de l'ensemble des inscrits			
Répartition par zone			
Zone 1	616 (22,2%)	Zone 3	713 (25,7%)
Zone 2	695 (25,1%)	Zone 4	746 (26,9%)
Femmes cheffes de ménage. Effectif total : 438, soit 12% des inscrits			
Répartition par zone			
Zone 1	105	Zone 3	86
Zone 2	94	Zone 4	153
Personnes handicapées. Effectif total : 160, soit 4,4% des inscrits			
Répartition par zone			
Zone 1	41	Zone 3	32

Zone 2	7	Zone 4	80
Réfugiés/Personnes Déplacées Internes (PDI). Effectif total : 158, soit 4,3%.			
Répartition par zone			
Zone 1	52	Zone 3	35
Zone 2	1	Zone 4	70
Personnes âgées (+60 ans). Effectif total : 101, soit 2,8% des inscrits			
Répartition par zone			
Zone 1	11	Zone 3	36
Zone 2	10	Zone 4	44

Source : UGP-PROVIR, MOUS, 2025.

Tableau n° 35 : Etat de réalisation des travaux de construction/réhabilitation des ouvrages

Entreprises	N° Lot et travaux	Avancement mensuel des Travaux en pourcentage			Observations
		Prévisionnel annuel	Réalisation annuel	Ecart	
MTC	Lot 1-Zone 1 1-Le renforcement des aménagements des Ecoles Publiques de Djambala ; 2-L'aménagement de la maison des jeunes de Djambala ; 3-L'aménagement espace extérieur CS Poto-Poto.	100%	96,74%	-3,26%	Travaux achevés en attente de réception provisoire par le Maître d'Ouvrage
PROMO Construction	1-Restructuration, rénovation Ecole publique SANGBANDA ; 2-Extension du hangar du marché SANGBANDA ; 3-Formalisation d'un arrêt taxis motos (usine SEFCA).	100%	94,75%	-5,25%	Travaux achevés en attente de réception provisoire par le Maître d'Ouvrage
ZAM-ZAM	Lot 3-Zone 3 1-Réhabilitation et extension du marché BABA SALAO ; 2-Aménagement de la gare routière devant le Marché BABA SALAO ; 3-Construction des kiosques solaires ;	100%	99,57%	-0,43%	Travaux achevés en attente de réception provisoire par le Maître d'Ouvrage

	4-Aménagement d'un abri avec places assises du point d'eau NDAO.				
WADEYA SERVICE	Lot 4-Zone 4 1-Extension des bâtiments et aménagement cour des écoles préfectorales ; 2-Rénovation des bâtiments et construction de la clôture du Lycée BOGANDA ; 3-Recalibrage et aménagement des 2 carrefours principaux.	100%	88,23%	-11,77%	Taux inférieur au prévisionnel à cause de la suspension des travaux du lot durant un mois

Source : UGP-PROVIR, Bureau de Contrôle Techniplan, 2025.

Tableau n° 36 : Etat de réalisation des travaux de réhabilitation des chemins piétons et voies des ouvrages de proximités

Entreprises	N° Lot et travaux	Avancement annuel des Travaux en pourcentage			Observations
		Prévisionnel annuel	Réalisation annuel	Ecart	
DJAZZ-Junior	Lot 1-Zone 1 Linéaire voies (ml) : 2115 Linéaire cheminement piéton (ml) : 5530 Linéaire fossé végétalisé (ml) : 950	55,56%	16,01%	-39,55%	Le taux de réalisation annuelle est inférieur au prévisionnel
GSM	Lot 2-Zone 2 Linéaire cheminement piéton (ml) : 2915 Linéaire fossé végétalisé (ml) : 1600	83,33%	14,50%	-68,83%	Le taux de réalisation annuelle est inférieur au prévisionnel
CACS	Lot 3-Zone 3 Linéaire voies (ml) : 1159 Linéaire cheminement piéton (ml) : 3175 Linéaire fossé végétalisé (ml) : 625.	83,33%	7,70%	-75,63%	Le taux de réalisation annuelle est inférieur au prévisionnel
SELECT Corporation	Lot 4-Zone 4 Linéaire cheminement piéton (ml) : 1610 Linéaire fossé végétalisé (ml) : 700	83,33%	7,90%	-75,43%	Le taux de réalisation annuelle est inférieur au prévisionnel

Source : UGP-PROVIR, Bureau de Contrôle Techniplan, 2025.

Tableau n° 37 : Etat Financier des travaux de construction des ouvrages de proximité

Entreprises	Montant Contrat réévalué	Réalisation au 31 Décembre 2025			Observations
		Prévisionnel annuel	Réalisation annuel	Ecart	
MTC	165 050 451	165 050 451	159 665 168	-5 385 283	Travaux achevés en attente de réception provisoire par le Maître d'Ouvrage
PROMO Construction	288 548 460	288 548 460	273 391 810	-15 156 650	Travaux achevés en attente de réception provisoire par le Maître d'Ouvrage
ZAM-ZAM	100 322 292	100 322 292	96142509	-4 179 783	Travaux achevés en attente de réception provisoire par le Maître d'Ouvrage
SELECT Corporation	773 215 955	773 215 955	682 243 454	-90 972 501	Le montant annuel réalisé par l'entreprise reste inférieur au montant annuel prévisionnel à cause de la suspension des travaux que son lot a fait l'objet.
Total Général	1 327 137 158	1 327 137 158	1 211 442 941	-115 694 217	

Source : UGP-PROVIR, Bureau de Contrôle Techniplan, 2025.

Tableau n° 38 : Etat Financier des travaux de réhabilitation des chemins piétons et voies des ouvrages de proximités

Entreprises	Montant Contrat réévalué	Réalisation au 31 Décembre 2025			Observations
		Prévisionnel annuel	Réalisation annuel	Ecart	
DJAZZ-Junior	987 172 623	548 867 978	158 074 774	-34 715 571	Le montant mensuel réalisé par l'entreprise au cours du mois de Décembre est très inférieur au montant mensuel prévisionnel
GSM	113 828 925	94 857 058	16 494 563	-78 362 495	Le montant mensuel réalisé par l'entreprise au cours du mois de Décembre est nul à cause de la suspension des travaux par le Maître d'Ouvrage
CACS	391 450 500	326 207 445	30 220 088	-295 987 357	Le montant mensuel réalisé par l'entreprise au cours du mois de Décembre est nul à cause de la suspension des travaux par le Maître d'Ouvrage
SELECT Corporation	88 877 250	74 064 079	7 348 625	-66 715 454	Le montant mensuel réalisé par l'entreprise au cours du mois de Décembre est nul à cause de la suspension des travaux par le Maître d'Ouvrage
Total Général	1 327 137 158	1 043 996 560	212 138 050	-475 780 877	-

Source : UGP-PROVIR, Bureau de Contrôle Techniplan, 2025.

TABLEAU N° 39 : Plan d'action prioritaire suivi du chronogramme détaillé du projet en 2025

N°	Actions	Activités	Expert concerné	Experts impliqués	J	F	M	A	M	J	J	O	S	O	N	D	Indicateur	Budget 2025
Composante 1 : investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base à l'échelle de la ville																		
1	Infrastructure pour la réduction des Risque d'Inondation et d'Erosion	Etude de Construction des Infrastructure Structurantes à Bangui et Berberati : Elaboration d'APS, APD, et DAO et Mission de Supervision	CN	CA, CR/SPM et SGF														
2		Etudes sur le genre et les déplacements forcés en milieu urbain pour l'inclusion	CN	CA, CR/SPM et SGF														
3		Etude et élaboration d'une stratégie sur l'entretien et la maintenance	CN	CA, CR/SPM et SGF														
4		Etude pour l'analyse laboratoire de la composition chimique des boues de curage	CN	CA, CR/SPM et SGF														
5		Maitrise d'Œuvre Urbain et Sociale MOUS	CN	CA, CR/SPM et SGF														
6		Élaboration des Documents Cadres et spécifiques et Gestion Environnementale et Sociale liés à la Gestion Environnementale et sociale du Projet des Villes Inclusives et Résilientes.	CN	CA, CR/SPM et SGF														
1	1.2 Appui Institutionnel à la Planification Intégrée des risques Climatiques et à la Gestion Urbaine	Etude pour l'élaboration du plan d'aménagement urbain intégré (c.a.d., gestion des eaux pluviales/fluviales et développement résilient et inclusif) de Bangui	CN	CA, CR/SPM et SGF														
2																		
3		Elaboration d'une étude sur la gestion et la maintenance des ouvrages d'assainissements construits	CN	CA, CR/SPM et SGF														

4	1.2 Appui Institutionnel à la Planification Intégrée des risques Climatiques et à la Gestion Urbaine	Etude sur le Genre et les déplacements forcés en milieu urbain pour l’Inclusion	CN	CA, CR/SPM et SGF														
5		Evaluations de capacités techniques, institutionnelles et plan de renforcement de capacité des ministères cibles	CN	CA, CR/SPM et SGF														
6		Etude pour la définition des activités de renforcement sectorielle - capacités, régulation et sensibilisation	CN	CA, CR/SPM et SGF														
7		Création du site Web MURFVH et Abonnement pour 01 an	CN	CA, CR/SPM et SGF														
8		Acquisition de moyen roulant pour l'équipe technique du Ministère MURFVH	CN	CA, CR/SPM et SGF														
9		Renforcement des capacités institutionnelles	CN	CA, CR/SPM et SGF														
Composante 2 : Infrastructure de quartier et services de base																		
1	Infrastructures de quartier	Maitrise d'Œuvre Complètes Des Travaux d'Equipements Socio-Collectif et d'Aménagement de Quartiers dans les Zones Prioritaires de BANGUI et BERBERATI	CN	CA, CR/SPM et SGF														
2		Travaux d'Aménagement du site d'Enfouissement des Boue et Curages et de voies d'accès	CN	CA, CR/SPM et SGF														
3		Etude diagnostique des processus de planification locale menés par les communes (y compris l’engagement citoyen)	CN	CA, CR/SPM et SGF														
4		Etude et élaboration d’une stratégie sur l'entretien et la maintenance	CN	CA, CR/SPM et SGF														

5		Etude sur l'historique des approches de viabilisation des quartiers et parcelles assainies	CN	CA, CR/SPM et SGF															
6		Travaux de bâtiments espaces publics dans la ville de Berberati (en 04 lots)	CN	CA, CR/SPM et SGF															
7		Travaux de bâtiments espaces publics dans la ville de Bangui (en 09 lots)	CN	CA, CR/SPM et SGF															
8		Travaux de voirie drainage dans la ville de Berberati (en 04 lots)	CN	CA, CR/SPM et SGF															
9		Travaux de voirie drainage dans la ville de Bangui (en 09 lots)	CN	CA, CR/SPM et SGF															
Composante 3 : Gestion de Projet																			
1	3.1 Diverses Etudes et travaux	Etudes APS/APD/Mission de contrôle Réhabilitation de bâtiment pour l'Unité de Gestion MURF/VH	SGF	CN, CA, SPM, AI et Comptable															
2		Instruments de sauvegarde Réhabilitation de bâtiment pour l'Unité de Gestion MURF/VH	SGF	CN, CA, SPM, AI et Comptable															
3		Réhabilitation du Local pour l'UGP de BERBERATI	SGF	CN, CA, SPM, AI et Comptable															
4	3.2 Ressources humaines/Personnel	23 Staff UGP-PROVIR	SGF	CN, CA, SPM, AI et Comptable															
5	3.3 Ressources matérielles (Bangui et Berberati)	Acquisition (2) véhicules pour l'UGP-PROVIR	SGF	CN, CA, SPM, AI et Comptable															
6		Acquisition 10 ordinateurs portable, 02 Photocopieur multifonction, 08 imprimantes avec Scanner à carte	SGF	CN, CA, SPM, AI et Comptable															

19	Mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales	Mise en Œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes	ESS	ESE															
20		Evaluation de la Performance et Mise à jour du PMPP	ESS	ESE															
21		Mise en Œuvre du PAR et Suivi du PAR	ESS	ESE															
21	Mise en œuvre des mesures de Prévention et d'atténuation des risques de Violence Basée sur le Genre VBG	Mise en Œuvre du plan d'action VBG	EVBG	SS et ESE															
22		Mise en œuvre et suivi du MGP (NES 10)	EVBG	SS et ESE															
23		Mécanisme de Gestion des Plaintes	EVBG	SS et ESE															
24	Stratégie de la Sécurité	Fonds de sécurité et contingence	ES	-															
25		Achat des extincteurs pour la sécurité du bâtiment abritant l'UGP	ES	-															
26		Kits complets des véhicules y compris extincteurs	ES	-															
27		Formation du personnel du projet dans le domaine de la sécurité	ES	-															
28		Formation des Points focaux départementaux en charge de la sécurité	ES	ESE															
29		Activité sécuritaire de liaison avec les points focaux	ES	-															
30		Acquisition moyenne de communication (Talkie-walkie) avec les PF	ES	-															

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Tableau n° 40 : Evaluation détaillé des activités du PTBA au 31 décembre 2025

Activités	Activités Prévue	Activités réalisées	% de réalisation	Activités en cours	Commentaires
Composante 1 : investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base					
1.1: Infrastructure pour la réduction des Risque d'Inondation et d'Erosion					

Etude de Construction des Infrastructures Structurantes à Bangui et Berberati : Elaboration d'APS, APD, et DAO et Mission de Supervision	8	4	50%	4	L'ordre de service de démarrage a été déjà délivré, APS des études de Bangui et Berberati déjà disponible et sont en attente d'atelier de validation.
Etudes sur le genre et les déplacements forcés en milieu urbain pour l'inclusion	1	0	0%	0	Activité non réalisée.
Etude et élaboration d'une stratégie sur l'entretien et la maintenance	1	0	0%	0	Activité non réalisée.
Etude pour l'analyse laboratoire de la composition chimique des boues de curage	1	0	0%	0	Activité non démarrée.
Maitrise d'Œuvre Urbain et Sociale MOUS	8	4	50%	0	Les activités de la MOUS sont en cours de réalisation à Berberati. Par contre celles de Bangui ne sont pas encore exécutées.
Élaboration des Documents Cadres et spécifiques et Gestion Environnementale et Sociale liés à la Gestion Environnementale et sociale du Projet des Villes Inclusives et Résilientes.	11	5	45,45%	4	Les activités restantes concernent l'élaboration des documents spécifiques des travaux structurants de Bangui et Berberati et les travaux de proximité pour la ville de Bangui.
1.2 Appui Institutionnel à la Planification Intégrée des risques Climatiques et à la Gestion Urbaine					
Etude pour l'élaboration du plan d'aménagement urbain intégré (c.a.d., gestion des eaux pluviales/fluviales et développement résilient et inclusif) de Bangui	1	0	0%	0	Non démarré.
Elaboration d'une étude sur la gestion et la maintenance des ouvrages d'assainissements construits	1	0	0%	0	Non démarré.
Etude sur le Genre et les déplacements forcés en milieu urbain pour l'Inclusion	1	0	0%	0	Non démarré.

Evaluations de capacités techniques, institutionnelles et plan de renforcement de capacité des ministères cibles	1	0	0%	0	Non démarré.
Etude pour la définition des activités de renforcement sectorielle - capacités, régulation et sensibilisation	1	0	0%	0	Non démarré.
Création du site Web MURFVH et Abonnement pour 01 an	4	4	100%	0	Activité réalisée.
Acquisition de moyen roulant pour l'équipe technique du Ministère MURFVH	1	0	0%	0	Non démarré.
Renforcement des capacités institutionnelles	1	0	0%	0	Non réalisé.
Composante 2 : infrastructure de quartier et services de base					
Maitrise d'Œuvre Complètes Des Travaux d'Equipements Socio-Collectif et d'Aménagement de Quartiers dans les Zones Prioritaires de BANGUI et BERBERATI	8	4	0,5	4	Les activités restantes concernent les APD, DAO et Contrôle des travaux de Bangui dont les activités sont en cours de lancement des travaux. Cependant les infrastructures socio-économiques sont déjà finalisées et les 4 autres travaux des voiries et chemins piétons sont en cours.
Travaux d'Aménagement du site d'Enfouissement des Boue, Curages et de voies d'Accès	2	1	50%	0	En cours de réalisation à Berberati donc il reste pour la ville de Bangui.
Etude diagnostique des processus de planification locale menés par les communes (y compris l'engagement citoyen)	2	0	0%	0	Non démarré.
Etude et élaboration d'une stratégie sur l'entretien et la maintenance	2	0	0%	0	Non démarré.
Etude sur l'historique des approches de viabilisation des quartiers et parcelles assainies	2	0	0%	0	Non démarré.

Travaux de bâtiments et espaces publics dans la ville de Berberati (en 04 lots)	4	4	100%	0	Les entreprises MTC, PROMO, WADEYA et ZAM-ZAM sont finalisés.
Travaux de bâtiments et espaces publics dans la ville de Bangui (en 09 lots)	9	0	0%	0	Non démarré.
Travaux de voirie drainage dans la ville de Berberati (en 04 lots)	4	0	11%	4	Les activités sont en cours de réalisation. CACS-SARL, SELECT Corporation, GSM Construction et JAZZ JUNIOR.
Travaux de voirie drainage dans la ville de Bangui (en 09 lots)	9	0	0%	0	Non démarré.
Composante 3 : gestion de projet					
Etudes APS/APD/Mission de contrôle Réhabilitation de bâtiment pour l'Unité de Gestion MURFVH	1	1	100%	0	Activité réalisée.
Instruments de sauvegarde Réhabilitation de bâtiment pour l'Unité de Gestion MURFVH	1	1	100%	0	Activité réalisée.
Réhabilitation du Local pour l'UGP de BERBERATI	1	1	100%	0	Activité réalisée.
Mobiliers et matériels de bureaux	3	3	100%	0	L'activité est réalisée à 100% car ce volet consiste en l'acquisition des équipements pour le bon fonctionnement du projet.
Staff du PROVIR	23	23	100%	0	Cette activité est réalisée à 100%, sauf le cas de démission de l'expert en sauvegarde social déjà en phase d'attente de l'ANO de la Banque pour l'entretien.
Mise en œuvre des instruments de gestion environnementale, sociale et VBG					
Mise en œuvre des PGES Spécifiques	4	4	100%	0	Activité exécutée.
Mise en œuvre du PGMO	1	1	100%		Activité exécutée.

Validation et Divulgateion des Instrument de sauvegardes (CERC, CGES-CERC, PGES, PAR)	4	4	100%	0	Activité partiellement exécutée.
Suivi environnemental deux fois par an par le Ministère en charge de l'Environnement	2	1	50%	0	Activité partiellement exécutée
Campagne d'information et de sensibilisation sur les activités du PROVIR dans les 13 zones	13	4	30,77%	0	Les quatre (04) zones de Berberati ont été balayée par la sensibilisation sur les activités du PROVIR. Les 9 zones restantes concernent la ville de Bangui
Renforcement de capacités des Parties Prenantes au Projet PROVIR	12	11	91. 66%	0	La formation restante sur les Lois environnementales et sociales seront exécutées l'année 2026.
Suivi environnemental et social y Compris VBG des activités mises en œuvre du Projet	4	2	50%	0	Activité partiellement réalisée cependant celui de Bangui n'est pas réalisé car les travaux n'ont pas encore démarré.
Audit avant clôture de la performance environnement et sociale	1	0	0%	0	L'activité sera réalisée à la troisième année (2027) du projet.
Mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales					
Mise en Œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes	1	1	100%	0	Activité exécutée.
Evaluation de la Performance et Mise à jour du PMPP	1	1	100%	0	Activité exécutée.
Mise en Œuvre du PAR	4	1	0%	0	Les PARs restants concernent les travaux de proximités de Bangui et les travaux structurants de Bangui et Berberati.
Suivi du PAR	4	1	50%	0	Suivi et l'audit du PAR a été réalisé. Les trois (3) PAR restant concerne (1) travaux structurant de Berberati et

					Bangui et les (2) concerne les travaux de proximité et structurant qui n'a jusqu'alors réalisé.
Mise en œuvre des mesures de Prévention et d'atténuation des risques de Violence Basée sur le Genre (VBG)					
Mise en Œuvre du plan d'action VBG	1	1	100%	0	La mise en œuvre du PA a été effective.
Mise en œuvre et suivi du MGP (NES 10)	13	4	30,77	0	Les dispositifs de mise en œuvre du MGP à Berberati sont achevés. Ceux de Bangui n'ont pas été réalisés.
Mécanisme de Gestion des Plaintes	1	1	100%	0	Activité exécutée.
Stratégie de la Sécurité					
Fonds de sécurité et contingence	1	1	100%	0	Activité réalisée.
Achat des extincteurs pour la sécurité du bâtiment abritant l'UGP	9	9	100%	0	Activité réalisée.
Kits complets des véhicules y compris extincteurs	5	3	60%	0	En attente de livraison d'un véhicule du MURFVH et d'un véhicule du PROVIR déjà réceptionné mais les kits non installés encore.
Formation du personnel du projet dans le domaine de la sécurité	3	3	100%	0	Activité réalisée.
Formation des Points focaux départementaux en charge de la sécurité	4	4	100%	0	Activité réalisée.
Activité sécuritaire de liaison avec les points focaux	4	4	100%	0	Activité réalisée.
Acquisition des moyens de communication (Talkie-walkie) au PF	5	5	100%	0	Activité réalisée.

Source : UGP-PROVIR, 2025.

TABLEAU N° 41 : Synoptique du suivi des contrats par composante du projet au 31 décembre 2025

N°	Activité	Début Contrat	Fin de Contrat	Montant du contrat	Montant Payé	Solde restant 31/12/2025	Taux d'eng
COMPOSANTE 1							
Contrat des Consultants							
1	PROVIR-01/SC/SFQC/23, Recrutement d'une Firma ou Bureau d'Etude pour la Maitrise d'œuvre complète des Travaux d'Equipement Socio-collectifs et d'aménagement de quartiers dans les zones prioritaires de Bangui et Berberati, TECHNIPLAN.	06-août-24	04-nov.-26	579 454 047	168 115 314	411 338 733	29,01
2	PROVIR - 05/SC/QC/23, Recrutement d'une Firma ou Bureau d'étude pour l'élaboration des documents cadres (CGES, CPR, PMPP, PGMO) et Spécifiques (PGES, PAR) liés à la gestion Environnementale et Sociale à Bangui et Berberati, SERF BURKINA.	03-avr.-24	04-nov.-24	485 652 740	151 910 116	333 742 624	31,28
3	Maitrise d'œuvre Urbaine et Sociale (MOUS), CF-PIU- MIN INFRAS-433434-CS-INDV, Fondation Joseph the Worker	11-mars-25	16-avr.-26	143 694 400	86 216640	57 477 760	60
4	Création du site Web MURFVH et Abonnement pour 01 an -Contrat N°355/25/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR, NAMS SERVICE.	04-juin-25	16-juil.-25	5 500 000	5 500 000	0	100
5	Contrat n°2 et n°3 pour le : Maitre d'ouvrage complet des travaux de réduction des risques	19-mai-25	20-dec-2028	967 753 876	64 459 120	903 294 756	6,66

	d'inondation et d'érosion à Bangui et Berberati Ingénierie Afrique (SGI-SUARL).						
COMPOSANTE 2							
Contrats des travaux							
1	Lot4 : Quartier Centre-ville, Ecole Préfectorale et Lycée Barthélémy Boganda de Berberati (BBB). Réf. : F-PIU-PROVIR 477763-CW-RFB, WADEYA-SERVICE	10-avr.-25	10-oct.-25	773 216 375	631 124 983	142 091 392	81,62
2	Lot3 : Quartiers Ndao, Baba Salao et Kassai. Réf. : 1CF-PIU-PROVIR 477777-CW-RFB, ZAM-ZAM Entreprise	10-avr.-25	10-août-25	100 322 479	92 589 413	7 733 066	92,29
3	Lot2 : Quartiers Sangbanda 1 et 3. Réf. : CF-PIU-PROVIR 477772-CW-RFB, PROMO CONSTRUCTION	10-avr.-25	10-août-25	288 548 635	281 030 042	7 518 593	97,39
4	Lot1 : Quartiers Poto - Poto, Ngou ciment 2, Djambala 1, 2 et 8. Réf. : CF-PIU-PROVIR 477775-CW-RFB, MTC Entreprise	04-avr.-25	10-août-25	165 050 525	153 297 516	11 753 009	92,88
5	Lot1 : Quartiers Potopoto, Ngou ciment2 Djambala 1, 2 et 8 pour les travaux de drainage, voirie et chemin piéton à Berberati. N°08/MURFVH/DIRCAB/T/UG-PROVIR/2025. Duré 6 mois, JAZZ JUNIOR	01-août-25	28-mars-26	987 000 000	296 151 787	690 848 213	30,01
6	Lot2 : Quartiers Samgbanda 1 et 2 pour les travaux de drainage, voirie et chemin piéton-Berberati.N°10/MURFVH/DIRCAB/T/UG/PROVIR/2025. Duré 4 mois, GSM Construction	01-sept.-25	31-déc.-26	113 828 925	16 494 563	97 334 362	14,49
7	Lot3 : Quartiers Ndao, Baba salao et Kassai1 pour les travaux de drainage, voirie et chemin piéton à Berberati.	01-sept.-25	31-déc.-25	391 450 500	30 220 088	361 230 412	7,72

	N°07/MURFVH/DIRCAB/T/UG-PROVIR/2025. Duré 4 mois, CACS-SARL						
8	Lot4 : Quartiers Centre-ville pour les travaux de drainage, voirie et chemin piéton à Berberati. N°07/MURFVH/DIRCAB/T/UGPROVIR/2025. Duré 4 mois, SELECT Corporation	01-sept.-25	31-déc.-25	88 877 250	7 348 625	81 528 625	8,27
9	Contrat ETS Espoir au Réf : CF-06/25/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR	04-août-25	30-sept.-25	11 035 800	10 483 251	552 549	94,99
COMPOSANTE 3							
Service des Consultants							
1	(23) Consultants recrutés comme staff du PROVIR	2025	2026	301 340 000	295 260 220	6 079 780	97,98
3	PROVIR-19/S/CI/24, Elaboration de la Stratégie de Passation des Marchés pour le Développement (PPSD) et du Plan de Passation des Marchés (PPM)	13-mars-24	02-avr.-24	23 123 000	23 123 000	0	100
5	CF-PIU-MININFRAS-429363-CS-CDS, Elaboration du manuel d'exécution du projet	14-juin-24	23-juil.-24	20 677 000	20 677 000	0	100
6	Evaluation de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation (PAR) des sites de travaux des infrastructures de proximité à Berberati pour la composante 2 du PROVIR. N°06/25/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR	12-sept.-25	30-sept.-25	4 000 000	4 000 000	0	100

Contrats des travaux							
7	Recrutement d'une entreprise pour des travaux spécifiques sur le site de décharge à Berberati. N°05/MURFVH/DIRCAB/T/UGP/PROVIR/2025. Duré 3 mois, PROMO CONSTRUCTION	01-mai-25	01-juil.-25	263 250 000	77 023 499	186 226 501	29,26
Fournitures							
8	Agence ICBTP et d'entretien des locaux du N°198-PROVIR	02-juil.-24	10-juil.-25	14 400 000	14 894 000	-494 000	103,43
9	Agence de Sécurité SENEVE SECURITY. Gardinnage des locaux du PROVIR N°197/24/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR	21-juin-24	22-juin-25	4 498 200	5 817 672	-1 319 472	129,33
10	Location d'un bâtiment pour l'unité de gestion du projet N°0101/24/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR	13-mai-24	10-mai-25	16 800 000	16 236 000	564 000	96,64
11	Maitrise d'œuvre complet des travaux de bâtiment à usage de bureau devant abriter le siège de PROVIR. Contrat n°14 et n°15/25/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR, LUSTRE-ARCI	1-nov.-25	1-janv.-27	99 164 800	8 050 312	91 114 488	8,12
12	Acquisition des moyens roulant pour le Projet (Deuxième Phase). CF-PIU-PROVIR-460302-GO-RFQ, CFAO MOTORS RCA	20-janv.-25	19-mars-25	78 518 856	77 201 712	1 317 144	98,32
13	Acquisition de deux groupes électrogènes et les mobiliers de bureau pour l'UGP Bangui et Berberati. CF-PIU-PROVIR-483027-GO-RFQ, Chourba Commerce Général	26-mars-25	25-avr.-25	23 850 000	23 850 000	0	100
14	Fourniture et livraison des équipements informatiques et bureautiques pour la	16-mai-24	3-déc.-24	31 115 000	31 115 000	0	100

	Coordination du projet-N°PROVIR-03//F/DC/24, Global Investissement						
15	Fourniture et livraison des mobiliers de bureau pour la Coordination du projet-N°PROVIR-03//F/DC/24, Groupe Berma Multi-Service (GBMS-SARL)	16-mai-24	4-juin-24	8 175 000	8 175 000	0	100
16	Fourniture et livraison des matériels de Visio-conférence pour la Coordination du projet (Ecran, micro numérique/digitale et Enceinte amplifiée 300W 600W), N°412/25/MURFVH/DIRCAB/UGP-PROVIR, Chourba Commerce Général	10-juil.-25	20-juil.-25	5 150 000	5 150 000	0	100

Source : UGP-PROVIR, 2025.

TABLEAU N° 42 : SYNOPTIQUE DU SUIVI FINANCIER DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2025

ACTIVITES	Budget	Budget Prévue	Décaissement				Décaissement	Taux decais.
Composante 1 : investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base à l'échelle de la ville (45 000 000 USD)	27 533 634	2 402 130 784	52 700 570	33 934 792	141 967 569	43 232 615	271 835 546	11,3%
1.1. Infrastructure pour la réduction des Risque d'Inondation et d'Erosion (40 000 000 USD)	27 533 634	1 936 318 284	52 700 570	30 634 792	141 947 569	41 032 615	266 315 546	14%
1.2. Appui Institutionnel à la Planification Intégrée des risques Climatiques et à la Gestion Urbaine (5 000 000 USD)	-	465 812 500	-	3 300 000	20 000	2 200 000	5 520 000	1%
Composante 2 : infrastructure de quartier et services de base (20 000 000 USD)	57 180 791	3 760 330 122	151 910 116	435 080 833	776 332 867	456 313 722	1 819 637 538	48,4%
Composante 3 : gestion de projet (5 000 000 USD)	485 483 517	1 112 474 873	183 291 383	182 830 548	167 687 705	243 933 584	814 861 242	73,2%
3.1. Diverses Etudes et travaux	-	126 945 000	-	-	5 019 381	13 514 182	18 533 563	15%
3.2. Ressources humaines (Staff UGP-PROVIR)	112 750 000	364 461 645	68 106 500	76 238 500	74 849 120	76 066 100	295 260 220	81%
3.3 Ressources matérielles (Bangui et Berberati)	124 115 000	239 530 215	55 415 450	120 000	5 150 000	79 701 712	137 887 162	58%
3.4 Frais de Fonctionnement (Bangui et Berberati)	217 118 517	267 809 452	42 447 793	42 670 073	44 549 514	45 986 253	175 653 633	71%
3.5. Suivi-Evaluation	787 316 459	-					-	#DIV/0!
3.6. Mise en œuvre des instruments de gestion environnementale	11 500 000	46 666 667	3 659 800	10 002 800	20 629 450	13 699 337	47 991 387	103%
3.7. Mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales	10 500 000	29 958 810	10 184 000	48 032 975	494 240	4 000 000	62 711 215	209%
3.8. Mise en œuvre des mesures de Prévention et d'atténuation des risques de Violence Basée sur le Genre VBG.	9 500 000	18 967 500	2 443 400	4 558 000	15 970 000	4 406 000	27 377 400	144%
3.9. Stratégie de la Sécurité	-	18 135 585	1 034 440	1 208 200	1 026 000	6 560 000	9 828 640	54%
Composante 4 : interventions d'urgence	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Imprévu 10%		376 033 012	6 473 022	3 658 500	23 842 000	5 644 500	39 618 022	11%
TOTAL GENERAL	570 197 942	7 650 968 791	394 375 091	655 504 673	1 109 830 141	749 124 421	2 908 834 326	38,5%

Source : UGP-PROVIR, 2025.

LES TRAVAUX DE PROXIMITE DE LA COMPOSANTE 2 DE BERBERATI

ZONE 1 : entreprise MTC (Bâtiment administratif, clôture et blocs latrines-maison des Jeunes)

Anciens Bâtiments administratif de la maison des jeunes de Djambala



Nouvelle construction au niveau de la maison des jeunes

Construction de la salle d'apprentissage de la maison des jeunes de Djambala



Construction d'une clôture autour de la maison des jeunes



Construction des deux (2) blocs latrines à la maison des jeunes



Anciens bâtiments de l'école Primaire de Djambala (Bâtiment administratif, démolition et construction de trois salles de classe, blocs latrines et mat de drapeau)



Nouvelle construction au niveau de l'école primaire de Djambala

Construction d'un bâtiment administratif à l'école primaire de Djambala



Construction de trois salles de classes et d'un mat de drapeau à l'école primaire de Djambala



Construction de deux blocs latrines à l'école primaire de Djambala



Ancienne salle d'attente et point d'eau au Centre de Santé de Poto-poto



Nouvelle construction au niveau du Centre de santé de Poto-poto

Point d'eau du centre de santé



Suite du Point d'eau



Zone 2 : PROMO Construction (Construction et réhabilitation à l'école primaire et maternelle samgbanda, du marché samgbanda et stationnement des taxi moto)

Les anciens batiments à l'école primaire, maternelle et stationnement de taxi moto à samgbanda



Nouvelle construction au niveau l'école primaire, maternelle et stationnement des taxi motos au quartier samgbanda

Construction de trois nouvelles salles de classe



Réhabilitation de trois salle de classe



Construction d'un bâtiment administratif



Construction d'un nouveau mat de drapeau



Cloture de l'école maternelle de samgbanda



Cloture de l'école primaire de samgbanda



Construction d'un stationnement des taxi motos



Suite de stationnement des taxi motos



Les anciens hangars du marché samgbanda



Nouvelle construction du marché samgbanda

Nouveau marché samgbanda



Suite du Marché



Blocs latrines au marché samgbanda



Zone 3 : ZAM-ZAM (Construction et réhabilitation du marché Baba Salao y compris kes boutiques, blocs latrines, abrit moto, kiosque solaire et le point d'eau au quartier Ndao)

Les anciens hangars du marché Baba Salao



Ancien point d'eau au niveau du quartier Ndao



Nouvelle construction au niveau du marché Baba Salao



Boutiques au niveau du marché baba salao





10 nov. 2025 14:10:58

Blocs latrines



8 oct. 2025 10:21:36

Abris moto et kiosque solaire



Nouveau point d'eau au quartier Ndao



Zone 4 : WADEYA SERVICE (aménagement autour du rond-point ainsi que les Constructions et réhabilitations des bâtiments administratifs, des salles de classe, terrains de Football, Hand-Ball, Basket-Ball, blocs latrines et mats des Drapeaux tant au Lycée Barthélemy Bognada et l'école Prefectorale)

L'ancien Rond-point la flamboyante de Berberati



Anciens batiments administratifs et salles des classes du Lycée Bathelemy Boganda (LBB)



Nouvel aménagement autour du Rond-point de Berberati



Nouvelles réhabilitations au niveau du Lycée Bathelémy Boganda

Réhabilitation de Bâtiment administratif du Lycée Barthelemy Boganda



Réhabilitation des salles de classes au Lycée BB



Suite de Réhabilitation des salles de classes





Terrains de Handball



Terrains de Basketball





Galaxy S21 5G
06 janvier 2026 10:27 AM

Terrain de Football (en cours de l'aménagement)

Construction de clôture autour du lycée BB de Berberati



l'ancienne cours de l'école primaire Prefectorale Filles



Nouvelle construction à l'école primaire Prefectorale Filles

Nouveau Bâtiment administratif



Amenagement du terrain de Basketball



Construction d'un nouveau bâtiment de trois salles de classes



Construction du mat de drapeau



Zone 1 avec l'entreprise Jazz Junior (Nettoyage et décapages des voies)



Zone 2 avec l'entreprise GSM Construction (Nettoyage et décapages des voies)



Zone 3 avec l'entreprise CACS-SARL (Nettoyage et décapages des voies)



Zone 4 avec l'entreprise SELECT Corporation (Nettoyage et décapages des voies)





IMAGES PHOTOGRAPHIQUES POUR LE PAIEMENT DES PAPs DE BERBERATI

Visibilité du PROVIR et mise en place de l'équipe de la téléphonie mobile TELECEL-CENTRAFRIQUE



Lancement officiel des opérations d'indemnisation des Personnes Affectées par le Projet (PAP) par les autorités.




Dispositifs d'indemnisation des PAP (Comptabilité PROVIR et équipe de la téléphonie mobile TELECEL).



Dispositifs d'indentification et de remise des cartes Sim-Telecel aux PAPs (Equipe de TELECEL-CENTRAFRIQUE)



Indemnisation individuelle des PAP après identification, vérification de la solde et remise des cartes Sim

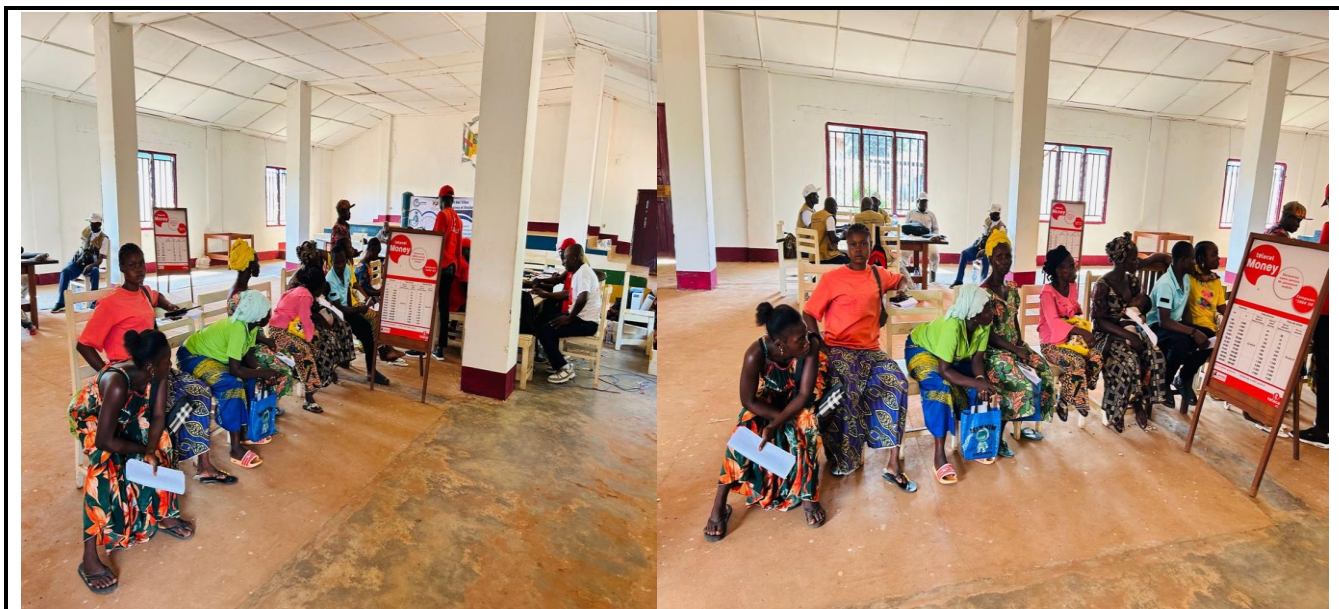

Information des PAP relative aux dispositions mises en place pour le paiement des indemnités aux bénéficiaires.



**IMAGES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISATION AUPRES DE LA
POPULATION SUR LA SALUBRITES DES SITES DU PROJET, DE LA**

POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LES PORTS DES EPIS SUR LES CHANTIERS DU PROJET



IMAGES PHOTOGRAPHIQUES DES SENSIBILISATIONS DE MASSE SUR LES VBG/EAS/HS AUPRES DE LA POPULATION DE BERBERATI



IMAGES PHOTOGRAPHIQUES DE SENSIBILISATION SUR LA SITUATION SECURITAIRE DU PROJET AUPRES DE LA POPULATION DE BERBERATI

