

SYNTHESE D'EVALUATION DES PRINCIPALES REALISATIONS DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2025

Cette analyse permet de faire une brève synthèse d'évaluation des principaux résultat atteints au 31 décembre 2025, ces réalisation synthétiques sont ainsi présentées :

1 USD = 585 franc CFA

Synthèse des principales réalisations financière du projet au 31/12/2025					
Composante 1. Investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base à l'échelle de la ville					
Libellés	Montant initial USD	Montant initial FCFA	Dépenses annuelles	% réalisée	Ecart
Sous-composante 1.1. Infrastructure pour la réduction des Risque d'Inondation et d'Erosion	40 000 000	23 400 000 000	266 315 546	1,14%	23 133 684 454
Sous-composante 1.2. Appui Institutionnel à la Planification Intégrée des risques Climatiques et à la Gestion Urbaine	5 000 000	2 925 000 000	5 520 000	0,19%	2 919 480 000
Sous total	45 000 000	26 325 000 000	271 835 546	1,03%	26 053 164 454
Composante 2. Infrastructures et services de base dans les quartiers					
Infrastructures de quartier	20 000 000	11 700 000 000	1 819 637 538	15,55%	9 880 362 462
Composante 3: Gestion du projet					
Unité de Gestion du Projet	5 000 000	2 925 000 000	814 861 242	27,86%	2 110 138 758
Composante 4 : Interventions d'urgence en cas d'urgence					
Cas d'urgence	0	0	0	0%	0

Source : UGP-PROVIR, 2025.

Principaux résultats d'évaluation des activités du projet atteint au 31/12/2025	
Projet : Projet des Villes Inclusives et Résilientes (PROVIR)	
Ministère Fiduciaire : Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale	
Ministère de Tutelle : Ministère de l'Urbanisme de la Ville et de l'Habitat (MURFVH)	
Autres ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet : 1. Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération Internationale ; 2. Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ; 3. Ministère des Eaux et Forêts Chasse et Pêche ; 4. Ministère de l'Équipement des Travaux Publics ; 5. Mairies de la Ville de Bangui et de Berberati.	
Objectif global du projet : L'objectif de développement du projet est d'améliorer l'accès aux infrastructures résiliente au changement climatique et aux services de base dans les villes sélectionnées.	
Zones d'intervention : Ville de Bangui et la ville de Berberati	
Date approbation: 7 Octobre 2024	Date de clôture: 29 Aout 2029
Montant initial du projet : 70 000 000 USD	Montant décaissé : 5 138 188 040 milliards USD
Fonds additionnel du FEM : 9 175 000 USD	Montant non décaissé : milliards 35 811 811 960
Montant total du financement : 79 175 000 UDS	USD
Taux de décaissement global du projet : 12,6% Taux d'engagement global du projet : 22%	
Situation budgétaire du projet au 31 décembre 2025 Montant du PTBA de 2025 : 7 650 968 791 milliards de francs CFA Taux d'exécution budgétaire annuel du projet : 38,5% Taux d'engagement annuel de la passation des marchés : 74,12% Taux de réalisation des activités annuelle du PTBA 2025 : 57,89%	
Composante 1. Investissements dans la réduction des risques des climatiques et services de base à l'échelle de la ville	
Sous-composante 1.1. Infrastructure pour la réduction des Risque d'Inondation et d'Erosion	► Contrat de SERF BURKINA (documents cadres et documents spécifique) : 45% de réalisation Les documents cadres ci-dessous ont été élaborées : - Cadre de gestion environnemental et social (CGES) ; - Cadre de la politique de réinstallation (CPR) ; - Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) y compris le manuel de gestion des plaintes (MGP). ► Cabinet SGI : 35% de réalisation - Études APS de Bangui et Berberati déjà disponibles pour les travaux structurants.

Sous-composante 1.2.
Appui Institutionnel à la
Planification Intégrée des
risques Climatiques et à la
Gestion Urbaine

► **Création du site Web du Ministère de l'Urbanisme, de la Réforme Foncière, des Villes et de l'Habitat (MURFVH) avec 1 an d'abonnement en lien suivant : 100% de réalisation**
- <https://www.minurbanisme-rca.org/>.

Composante 2. Infrastructures et services de base dans les quartiers

► Cabinet SERF BURKINA :

Dans le cadre de la composante 2, les documents spécifiques suivant ont été élaborés :

- (i) Plan de gestion de la main d'œuvre (PGMO) ; (ii) Plan de gestion Environnementale et sociale (PGES) des sites fixes et linéaires ; (iii) Plan d'action pour la réinstallation (PAR).

► TECHNIQUE PLAN : 46,25%

L'étude des travaux d'équipements socio-collectifs et d'aménagement des quartiers dans les zones prioritaires mené dans les deux (2) villes sont les suivantes :

Bangui :

- Études APS de Bangui disponibles.

Berberati :


- (i) Études APS ; (ii) Études APD ; (iii) DAO ; (iv) les travaux pour les travaux des infrastructures et le ; (iv) Contrôle de surveillance est toujours en cours pour les travaux pour l'entreprise WADEYA SERVICE y compris les travaux de drainage et voie d'accès et chemins piétons à Berberati.

► Fondation Joseph Worher de la structure Lazarienne (FJWSL) pour la MOUS à Berberati : 50% de réalisation pour Berberati


Les principales réalisations concernent :

- Mobilisation communautaire ;
- Sélection et engagement de la main d'œuvre THIMO ;
- Appui à la mise en œuvre des clauses sociales et environnementales ;
- Suivi et gestion des cas de VBG, EAS et HS ;
- 805/500 manœuvres retenus, soit un taux de 161% dans le cadre des travaux THIMO à Berberati pour la première phase de recrutement ;
- Evaluation d'impact THIMO socioéconomique jugé satisfaisant dû au niveau de vie des travailleurs THIMO qui s'est améliorés après l'enquête de satisfaction du taux de participation des travailleurs via l'outil kobo toolbox inclus dans l'activité dédié à l'ONG-FJWSL.

Situation des manœuvres THIMO à Berberati



Répartition de la main d'œuvre THIMO à Berberati selon les entreprises

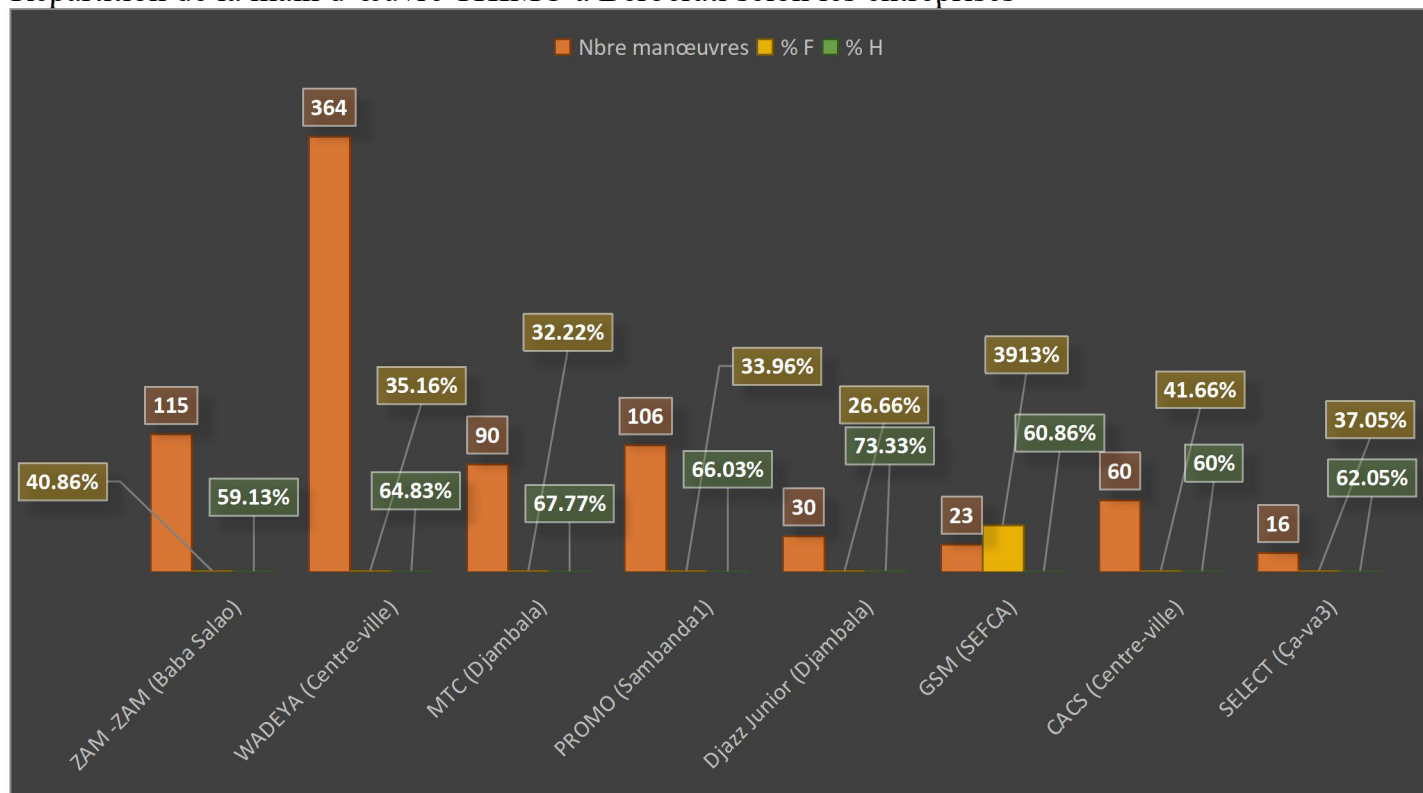

► SGI pour les travaux structurants : 35%

- Bangui et Berberati : APS disponible mais attente d'intégration des observations

► Travaux de proximité de la composante 2 à Berberati :

Travaux des infrastructures de base dans les quartiers : 95,23% de réalisation

- Lot 1 : entreprise MTC ;
- Lot 2 : entreprise PROMO ;

- Lot 3 : entreprise ZAM-ZAM ;
- Lot 4 : entreprise WADEYA-SERVICE.

Travaux de drainage, voirie et chemin piéton : 11,50% de réalisation

- Lot 1 : Entreprise DJAZZ Junior ;
- Lot 2 : Entreprise GSM Construction ;
- Lot 3 : Entreprise CACS SARL ;
- Lot 4 : Entreprise SELECT Corporation.

Figure : Etat de réalisation des travaux de construction des ouvrages


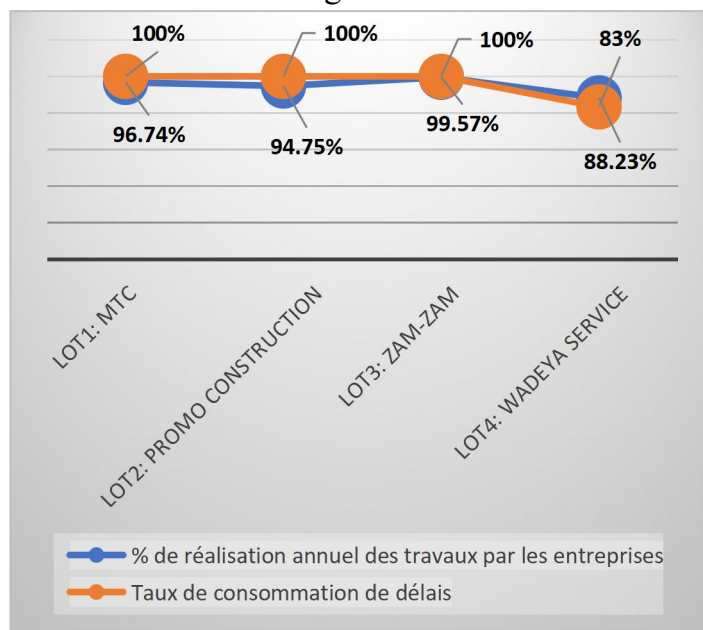


Figure : Etat de réalisation des travaux de drainage, chemins pétons et voies



► Etablissement Espoir : 100% de réalisation

Image photographique du bâtiment administratif de la Mairie de Berberati

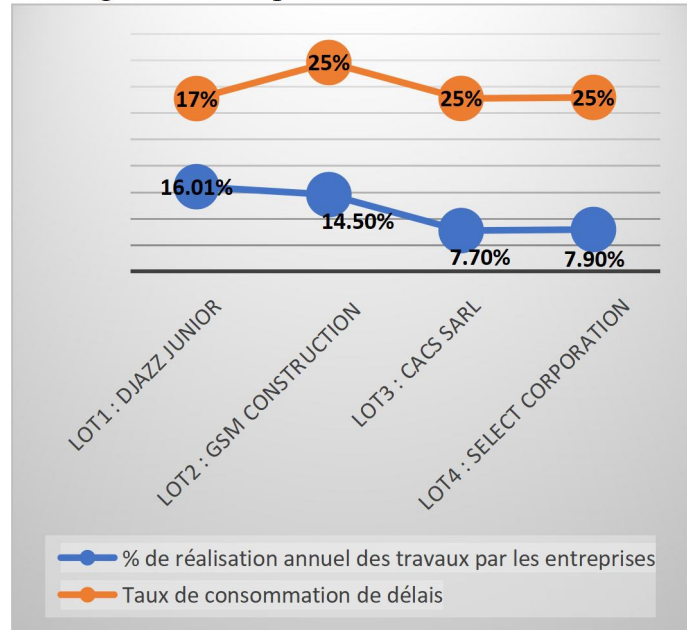

Composante 3: Gestion du projet

► Cabinet LUSTRE-ARCI pour la construction du Siège du PROVIR : 30% de réalisation

- APS : avis favorable ;
- APD : Avis NON favorable (suite aux échanges et observations écrites dans le compte rendu d'analyse de documents).

► PROMO construction pour le site des déchets pour une durée de 15 ans : 85% de réalisation


Site de dechet de Berberati



Abrite pour le gardien du site de déchet




► Situation d'engagements du PTBA

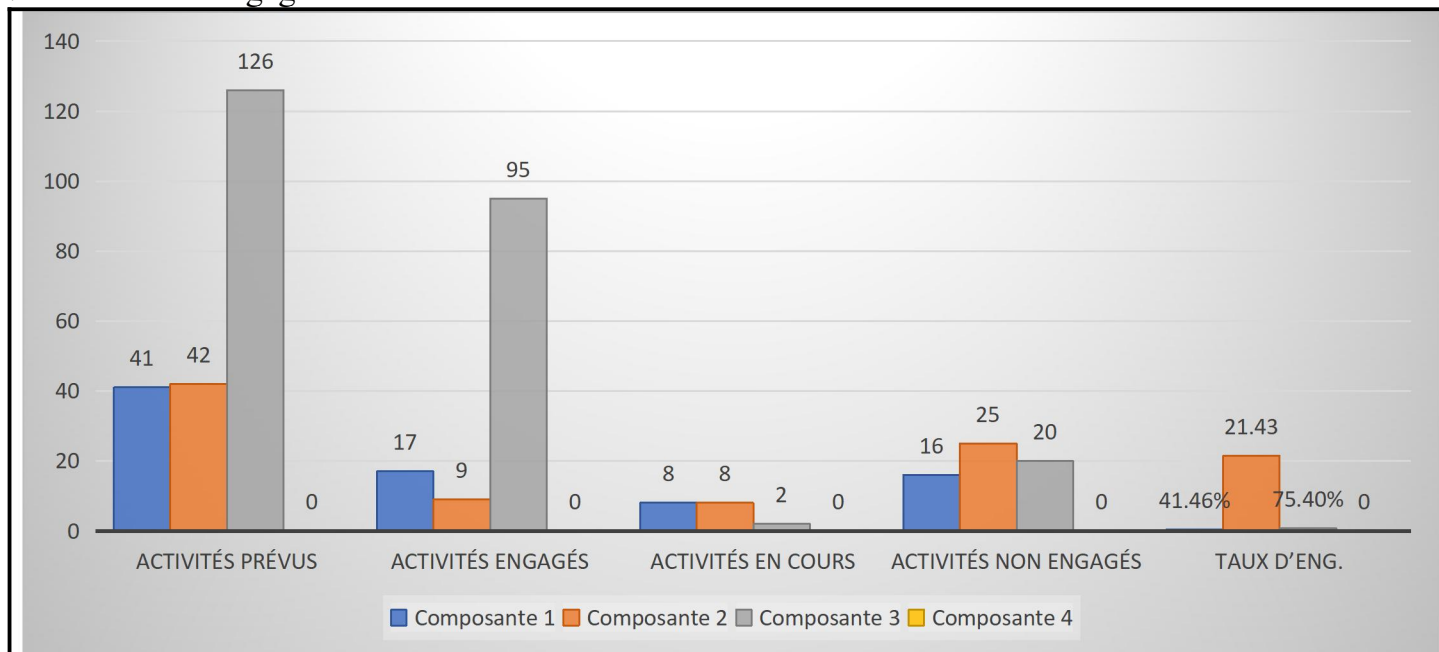

Cette figure présente des taux de réalisation des activités au 31 décembre 2025 par composante ci-après : (i) composante 1 : 41,46% ; (ii) composante 2 : 21,43 ; (iii) composante 3 : 75,40%.

Sur les 209 activités prévues, plus de 121 activités ont été réalisées soit un taux de réalisation global de 57,89% au 31 décembre 2025.

► Situation des différentes réunions de coordination tenues par le projet : 78

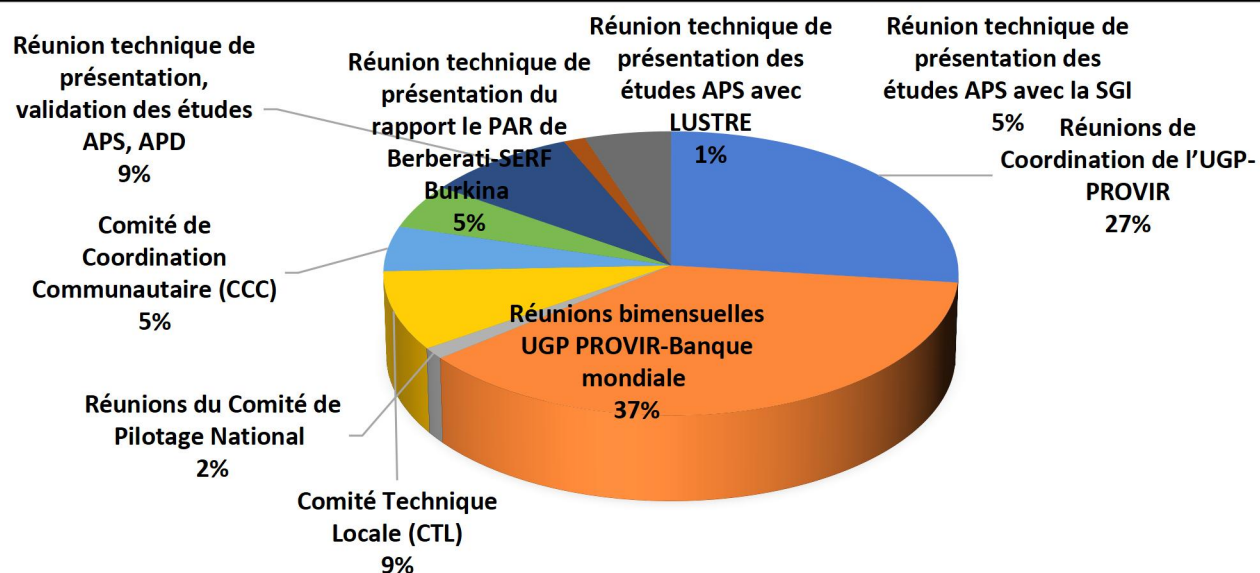


► Situation des Comité d'Orientation Stratégique du projet : 100%

- CPN au niveau stratégique : 2
- CTL de Bangui et Berberati : 2


► Réalisation de Passation des marchés du projet

- Sur les 59 marchés programmés, 44 marchés ont été engagés soit un taux d'engagement annuel de 74,12% en termes réalisation des marchés du projet en 2025.


Réalisation par type des marchés

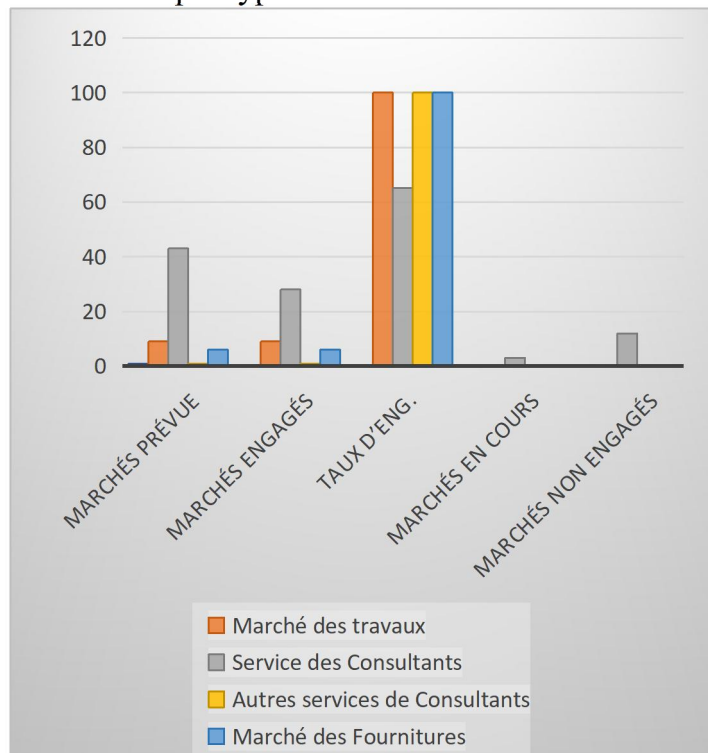


Réalisation des marchés prévus et engagés

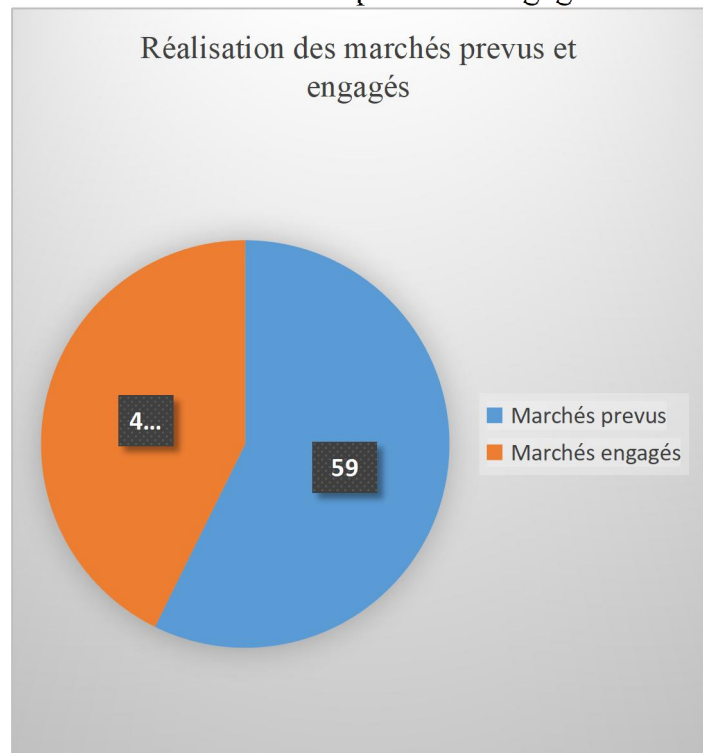

Taux d'engagement des marchés du projet



Réalisation des marchés par composantes

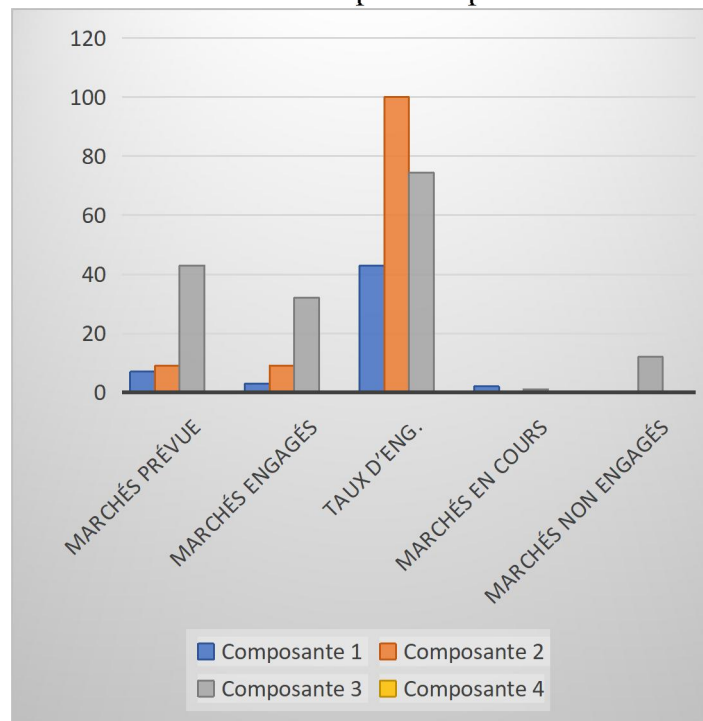


► État de mise en œuvre de la Gestion budgétaire du projet


En ce qui concerne la situation d'exécution budgétaire du projet :

- Le taux d'exécution budgétaire du projet est de 38,5% au 31 décembre 2025 contre un taux de 95,03% au 31 décembre 2024.


Situation d'exécution budgétaire du projet

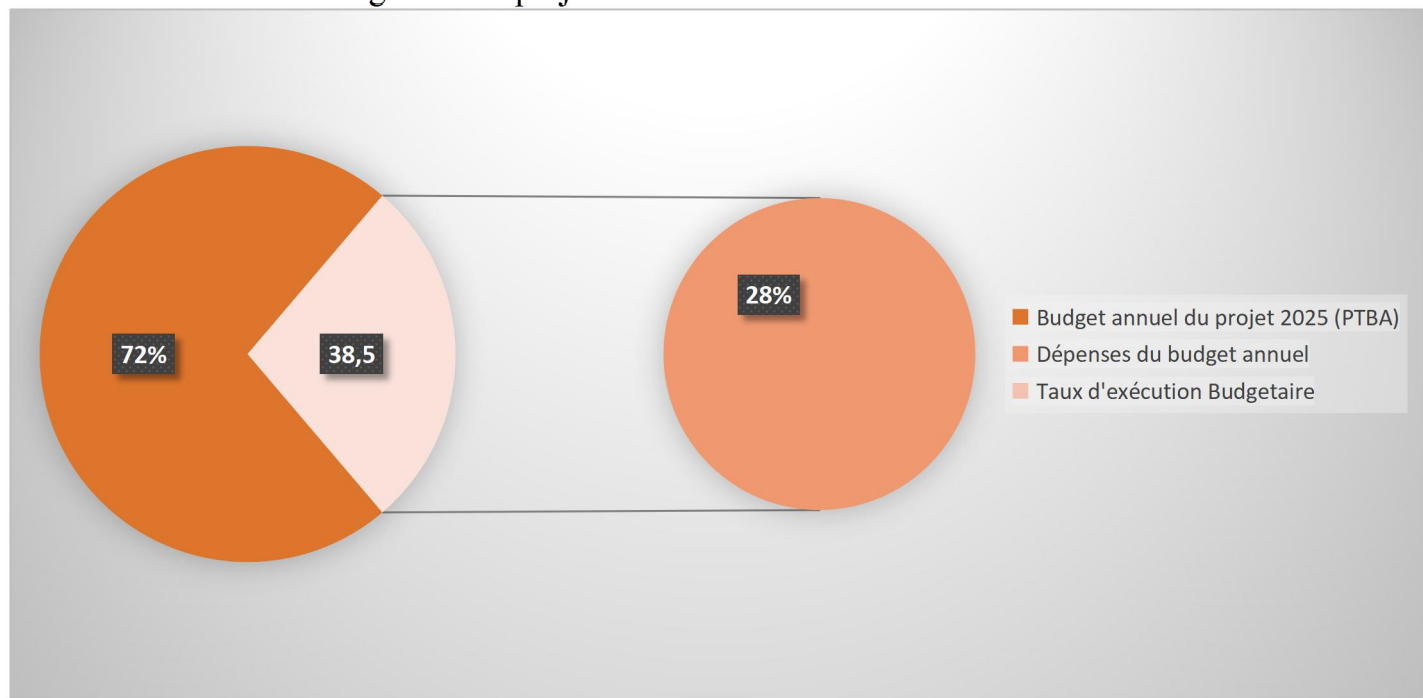

Pourcentage d'exécution financière du projet par trimestre

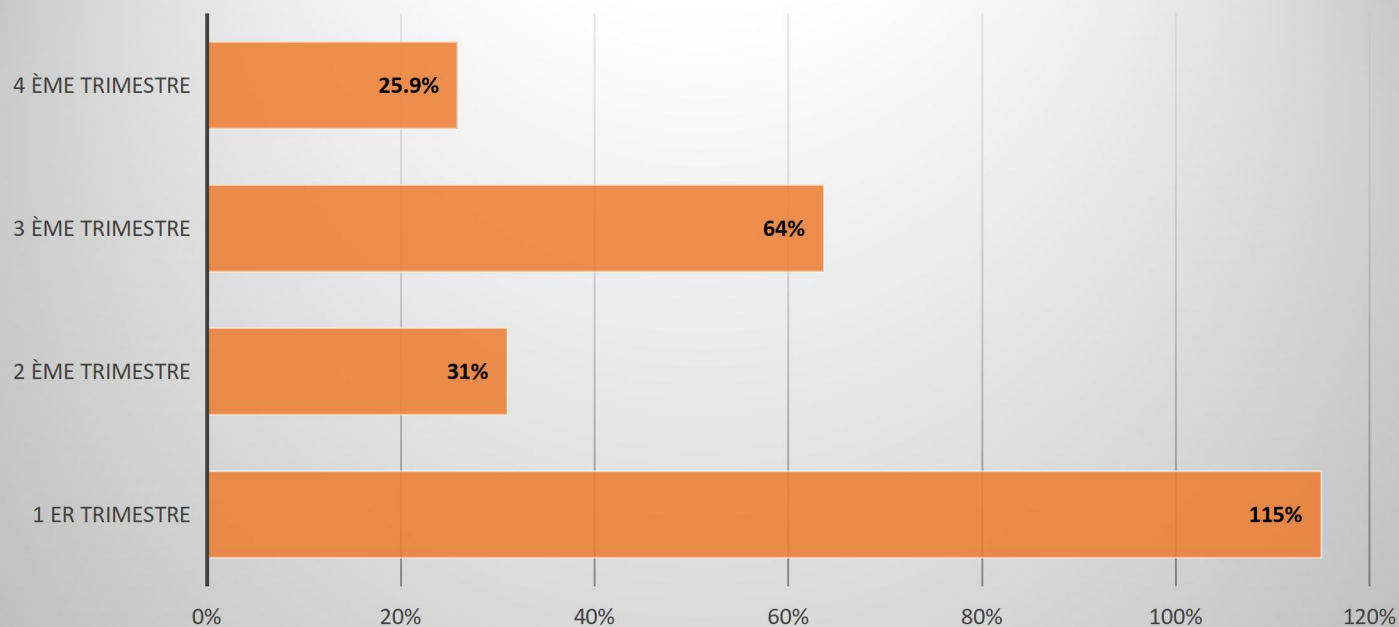

Dépenses en chiffre du projet par trimestre

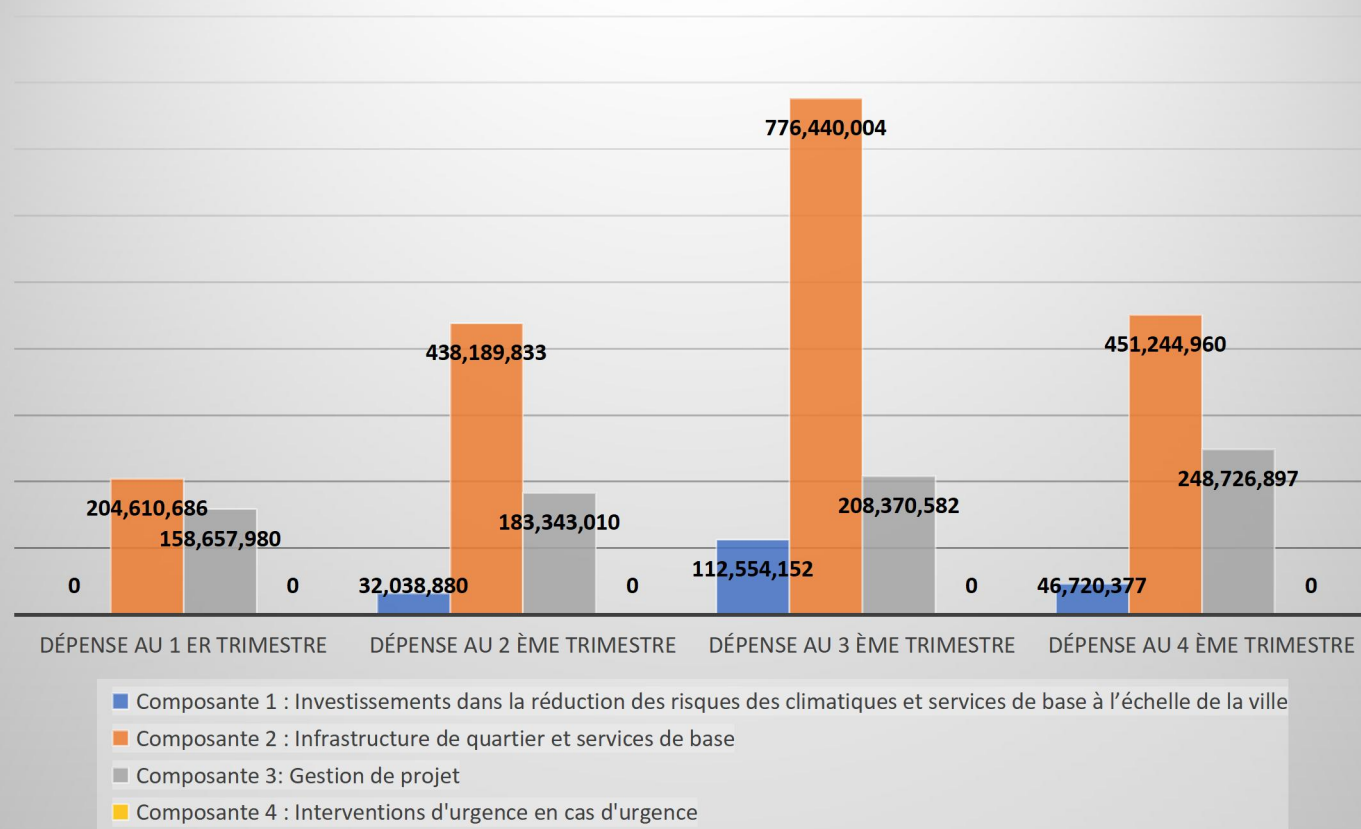


Taux de decasement et d'engagement du projet



TAUX DE DÉCAISSEMENT

TAUX D'ENGAGEMENT

Montant chiffrés du projet

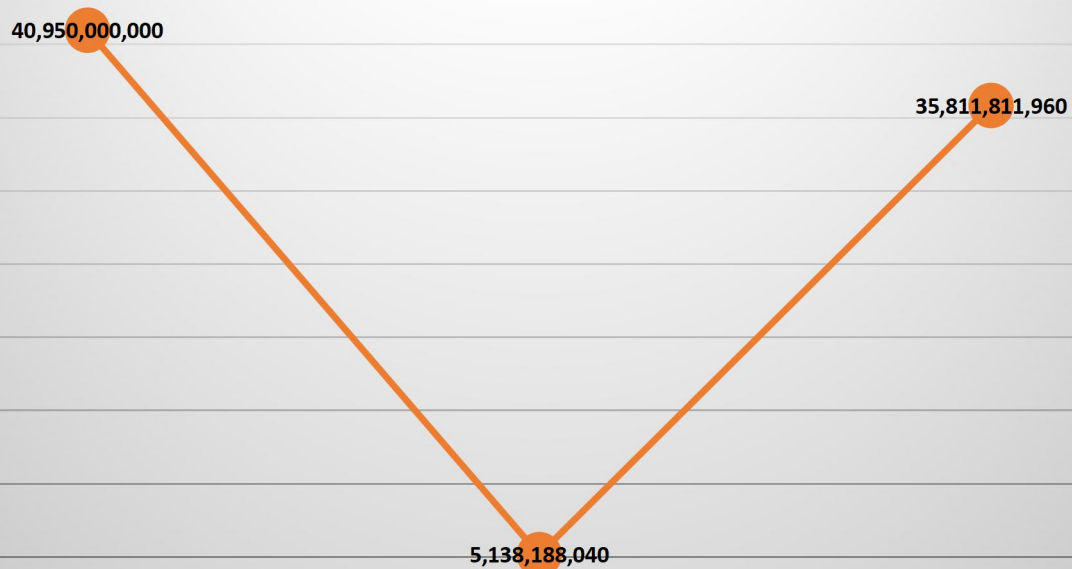


MONTANT APPROUVÉ

MONTANT DÉCAISSÉ

MONTANT NON DÉCAISSÉ

Situation budgétaire du projet par composante

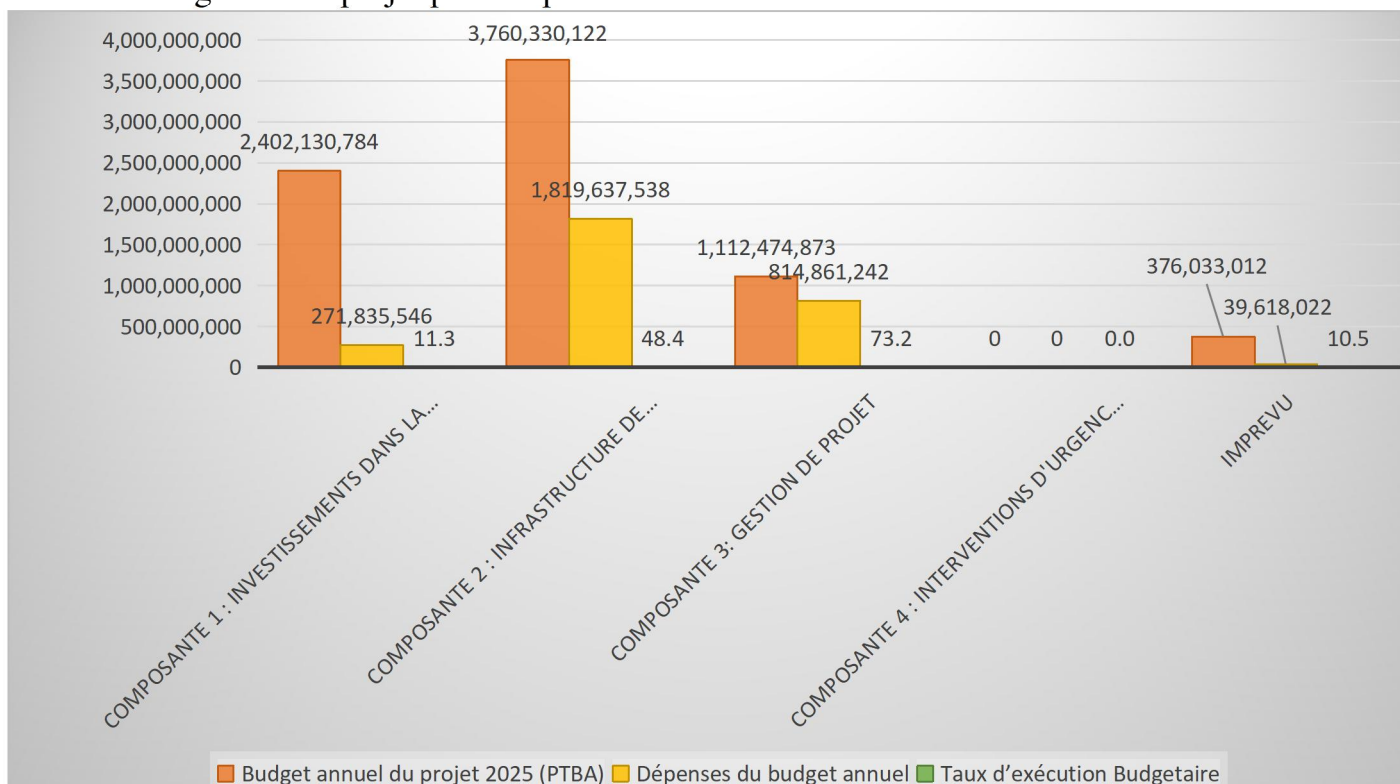

► Réalisation de l'Audit Interne : 90%

- Élaboration de la charte d'audit interne ;
- Élaboration de la cartographie des risques du projet 2025 et 2026 ;
- Élaboration du plan d'action annuel des activités de l'audit interne ;
- Elaboration et vulgarisation des outils de gestion des actifs non monétaire ;
- Révision des manuels du projet suite au financement additionnel FEM ;
- Un rapport d'audit opérationnel sur les activités réalisées à Berberati ;
- Diverses notes d'audit ponctuel à l'attention du Coordonnateur national de PROVIR
- Élaboration et publication rapport d'audit interne pour les trois (3) trimestre 2024).

► Mise en œuvre des instruments de gestion environnementale, sociale et VBG : (65,85%)

- Validation et Divulgence des Instrument de sauvegardes ;
- Mise en œuvre des PGES Spécifiques ;
- Renforcement des capacités des Parties Prenantes au Projet PROVIR ;
- Mise en œuvre du PGMO ;
- Campagne d'information et de sensibilisation sur les activités du PROVIR dans les 13 zones ;
- Suivi environnemental deux fois par an par le Ministère en charge de l'Environnement ;
- Suivi environnemental et social y Compris VBG des activités mises en œuvre du Projet.

► Mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales : (40%)

- Mise en Œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes ;
- Evaluation de la Performance et Mise à jour du PMPP ;

- Mise en Œuvre et Suivi.

► **Mise en œuvre des mesures de Prévention et d'atténuation des risques de Violence Basée sur le Genre (VBG) : (40%)**

- Mise en Œuvre du plan d'action VBG ;
- Mise en œuvre et suivi du MGP (NES 10) ;
- Mise en œuvre du mécanisme de Gestion des Plaintes.

Figure : Cas de gestion des plaintes du projet


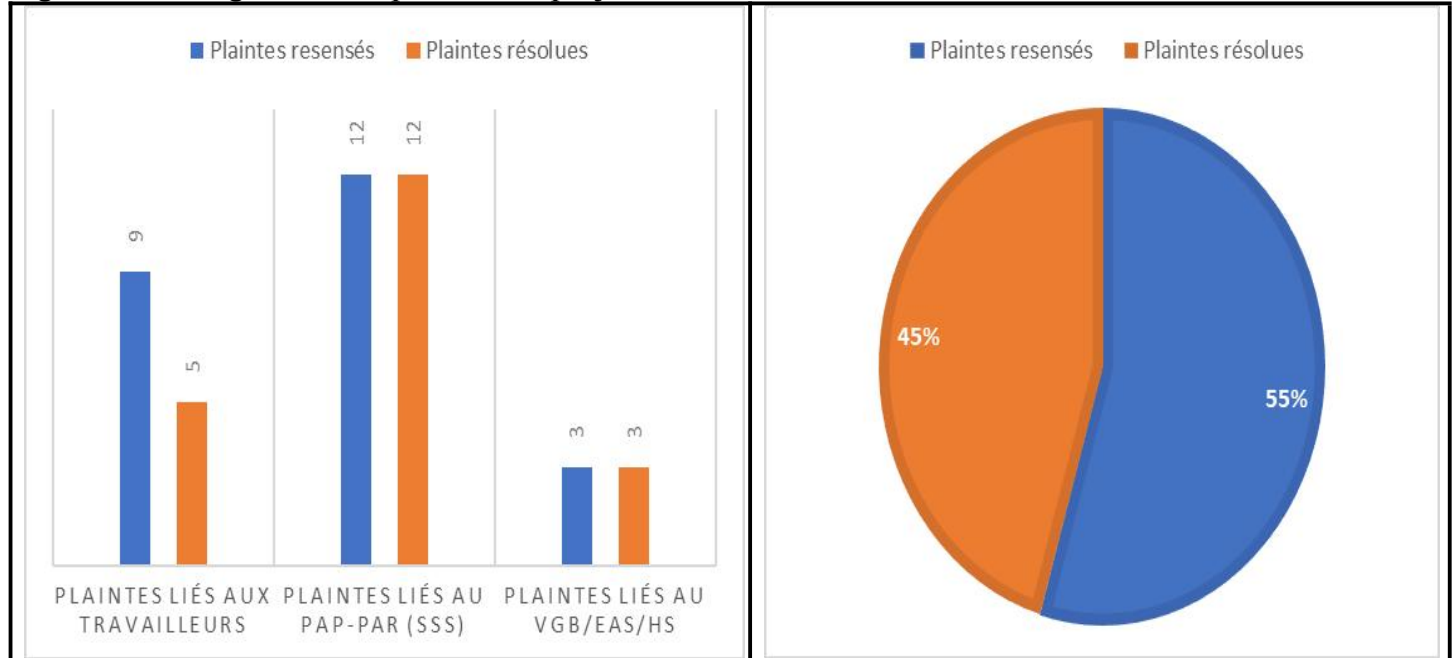


Figure : Documents cadres et spécifiques élaborés et validés du projet



► **Stratégie de la Gestion des Risques de Sécurité du projet : (93,55%)**

- Installation de 09 extincteurs pour la sécurité des bâtiments de l'UGP Centrale (7) et l'UGP locale de Berberati (2) ;
- Renforcement des capacités du personnel de l'UGP centrale ;
- Formation des Cadres des entreprises adjudicataires des marchés des travaux de proximités de Berberati sur la gestion des risques de sécurité sur les chantiers ;
- Identification, mise en place, formation et dotation (moyens de communication) des points focaux de sécurité de Berberati ;
- Acquisition de moyen de communication (téléphone) aux Points Focaux ;
- Identification, mise en place, formation et dotation (moyens de communication) des points focaux de sécurité à Bangui suivi de l'élaboration d'une Procédure Opérationnelle Standard (SOP) pour la sécurité des déplacements.

► **Mise en œuvre du plan communication : 100%**

Cinq (5) activités réalisées sont les suivantes :

- Élaboration de la stratégie de communication ;
- Production de supports de communication ;
- Activités médiatiques et digitales ;
- Organisation d'événements et mobilisation communautaire ;
- Édition et production de deux (2) magazine du « PROVIR Mag ».

► **les réalisation de l'Architecte Urbanisme : (25%)**

- Etudes architectural de Bangui ;
- Travaux (Infrastructures et Aménagements Spécifiques) et études de Berberati ;
- Projet de construction du Siège du PROVIR ;
- Autres Contributions et Gouvernance.

► **les réalisation du Système d'Information Géographique : (25%)**

- Revisitation des sites et formation au formulaire Kobo toolbox ;
- Préparation du tableau de bord de suivi à distance ;
- Revue des linéaires et vérification des traçons ;
- Conception de la carte sur les 7km depuis la Cathédrale Notre-Dame de Bangui
- Analyse et commentaire des cartes étudiées.

► **Identification des besoins dans la ville Bambari : 100%**

- Identification des besoins de la ville BAMBARI menée par le Cabinet URBA CONSULTING.

► **Cadre des résultats du projet par rapport aux objectifs fixé en 2025**

Indicateurs d'Objectif de Développement du Projet (IODP)

- Améliorer l'accès aux infrastructures de résilience climatique, 0% ;
- Amélioration de l'accès aux services de base, 0%.

NB : Source des données : RGPH4 en cours de traitement, kobo toolbox via l'enquête de satisfaction à mi-parcours, rapport d'avancement annuel du projet. Ces données seront rendues disponibles après la réalisation des travaux structurants et celle des travaux de proximité.

Indicateurs Intermédiaires du Projet (IIP)

***Investissements dans la réduction des risques d'inondation et d'érosion**

- Personnes formées (Nombre), 245/50 soit 490% ;
- Nombre des femmes formées : 120/25 soit 480% ;
- Personnes formées au niveau communautaire (nombre), 38/50 soit 76%.

***Infrastructures et services de base dans les quartiers**

- Bâtiment/cour réhabilité (Nombre), 2/2 soit 100% ;
- Bâtiment scolaire/cour réhabilité (Nombre), 4/2 soit 200% ;
- Réhabilitation des petits marchés (clôtures, entrepôts, etc.) (Nombre), 2/3 soit 66,67% ;
- Bâtiment de santé/cour réhabilité (Nombre), 1/0 soit 100% ;
- Petits espaces publics réhabilités (Nombre), 2/5 soit 40% ;
- Création d'emplois temporaires dans le secteur des travaux publics à forte intensité de main-d'œuvre (Nombre), 805/500 soit 161%.

Indicateur lié à la Gestion de projet :

- Rapport financiers (RSF) sont présentés à temps (Oui), 4/ 4 soit 100% ;
- Le plan de travail et le budget annuels sont soumis dans les délais (Oui), 1/1 soit 100% ;
- Grieffs relayés par le système GRM-Gestion de Plainte et traités dans les délais impartis (Pourcentage), 20/60 soit 33,33% ;
- Manuel du CERC préparé (Oui), 1/1 soit 100%.

Source : UGP-PROVIR, 2025.
